





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 10/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				PERÍODO: 20/07/2023 A 25/07/2023				DATA: 25/07/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	9.926,20	1.077,98	11.004,18	44,52	2.282.232,50	451.851,37	48.462,62	500.313,99	1.781.918,51	1.736.093,90	21,92	22,01
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00			9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	10,55	0,50	11,05	941,89	47.094,50	9.936,94	470,95	10.407,89			36.686,61	22,10
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	23.607,34	2.523,57	26.130,91			93.089,09	21,92
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	99,08	9,50	108,58	123,60	61.800,00	12.246,30	1.174,20	13.420,50			48.379,50	21,72
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	237,43	28,20	265,63	47,85	57.420,00	11.361,04	1.349,37	12.710,41			44.709,59	22,14
Total geral								2.401.452,50	475.458,71	50.986,19	526.444,90			1.875.007,60	21,92
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.07.26 11:15:15 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___								


Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Fátima Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO N° 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.N°. 10/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 20/07/2023 A 25/07/2023	DATA: 25/07/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	20/07/2023	RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	26,50	6,80	180,20
2	20/07/2023	RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,30	3,70	27,01
3	20/07/2023	RUA M	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	11,00	6,80	74,80
4	21/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	15,40	2,20	33,88
5	21/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	8,20	1,00	8,20
6	21/07/2023	RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,90	2,40	9,36
7	21/07/2023	TRAVESSA SÃO JOSÉ	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,90	2,50	7,25
8	21/07/2023	TRAVESSA SÃO JOSÉ	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,50	2,50	8,75
9	21/07/2023	TRAVESSA SÃO JOSÉ	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,90	2,10	12,39
10	21/07/2023	TRAVESSA SÃO JOSÉ	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	13,30	2,70	35,91
11	21/07/2023	TRAVESSA SÃO JOSÉ	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	13,40	2,60	34,84
12	21/07/2023	RUA SÃO JOSÉ	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	9,60	8,50	81,60
13	24/07/2023	RUA SÃO JOSÉ	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	13,90	3,20	44,48
14	24/07/2023	RUA A	CONJ. FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	25,00	3,20	80,00
15	24/07/2023	RUA A	CONJ. FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	44,80	3,30	147,84
16	25/07/2023	RUA A	CONJ. FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	35,00	3,30	115,50
17	25/07/2023	TRAVESSA SÃO DOMINGOS	MAMEDES PAES MENDONÇA	36,20	2,50	90,50
18	25/07/2023	TRAVESSA SÃO DOMINGOS	MAMEDES PAES MENDONÇA	40,70	2,10	85,47
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.077,98

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.07.26
11:15:45 -03'00'

José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

<p>OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023</p> <p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10/2023</p>
--



RUA A



RUA A



RUA M



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
1525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.07.26 11:16:12 -03'00'

José F. J. Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.07.26
11:16:30 -03'00'

José Wilson Santos da Paixão
Eng. Civil / CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA SÃO JOSÉ



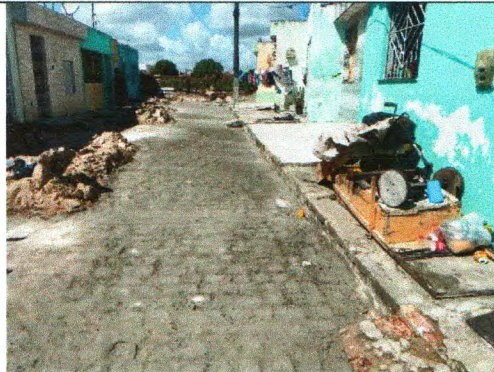
RUA A



RUA A



RUA A



TRAVESSA SÃO DOMINGOS




TRAVESSA SÃO DOMINGOS

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:066412
 11525

Assinado de forma digital
 por MAYKON DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2023.07.26
 11:16:46 -03'00'

José Edson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2770293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabotana


Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabotana
