




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 13/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 09/08/2023 A 15/08/2023				DATA: 15/08/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.282.232,50</b>	<b>588.020,95</b>	<b>47.562,34</b>	<b>635.583,29</b>		<b>1.646.649,21</b>	<b>27,85</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	12.934,04	1.047,18	13.981,22	44,52	2.226.000,00	575.823,47	46.620,45	622.443,92		1.603.556,08	27,96
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	12,95	1,00	13,95	941,89	47.094,50	12.197,48	941,89	13.139,37		33.955,13	27,90
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>30.721,66</b>	<b>2.480,10</b>	<b>33.201,76</b>		<b>86.018,24</b>	<b>27,85</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	128,88	10,00	138,88	123,60	61.800,00	15.929,58	1.236,00	17.165,58		44.634,42	27,78
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	309,13	26,00	335,13	47,85	57.420,00	14.792,08	1.244,10	16.036,18		41.383,82	27,93
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>618.742,61</b>	<b>50.042,44</b>	<b>668.785,05</b>		<b>1.732.667,45</b>	<b>27,85</b>

MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.08.17 10:48:44 -03'00'  Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603	<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> Data: ___/___/___	<b>Aprovado para pagamento</b> Data: ___/___/___
---	---	---


  
**José Robson Santos da Silva**  
Eng. Civil CREA 27202939/4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Engº Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 13/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 09/08/2023 A 15/08/2023	DATA: 15/08/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
1	09/08/2023	TRAVESSA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	18,00	2,40	43,20
2	09/08/2023	TRAVESSA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	11,30	2,30	25,99
3	09/08/2023	TRAVESSA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	16,00	6,50	104,00
4	09/08/2023	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,20	2,80	20,16
5	10/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	11,00	4,90	53,90
6	10/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	6,10	4,60	28,06
7	10/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	16,60	4,60	76,36
8	10/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	11,30	2,50	28,25
9	10/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	14,40	2,80	40,32
10	11/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	8,00	4,00	32,00
11	11/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	19,20	2,90	55,68
12	11/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	8,00	2,60	20,80
13	11/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	13,80	2,30	31,74
14	11/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	13,50	2,40	32,40
15	14/08/2023	RUA B	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	39,80	2,00	79,60
16	14/08/2023	RUA PROJETADA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	17,40	8,00	139,20
17	14/08/2023	RUA PROJETADA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,20	3,10	25,42
18	15/08/2023	RUA PROJETADA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,30	3,10	19,53
19	15/08/2023	RUA PROJETADA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	4,70	3,60	16,92
20	15/08/2023	RUA PROJETADA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	9,80	2,40	23,52
21	15/08/2023	RUA M	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,00	2,90	20,30
22	15/08/2023	RUA M	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,50	4,10	26,65
23	15/08/2023	RUA M	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	10,50	7,00	73,50
24	15/08/2023	RUA ARGENTINA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,30	1,60	11,68
25	15/08/2023	RUA ARGENTINA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	12,00	1,50	18,00
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==&gt;</b>						<b>1.047,18</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.08.17 10:49:03 -03'00'

  
José Robson Santos da Silva  
Eng. Civil CREA 27202939-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 13/2023**

<p>TRAVESSA SÃO PEDRO</p>	<p>TRAVESSA SÃO PEDRO</p>
<p>TRAVESSA SÃO PEDRO</p>	<p>RUA HELENO LUIZ DA SILVA</p>
<p>POVOADO TERRA DURA</p>	<p>POVOADO TERRA DURA</p>

*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Paiva*  
Eng. Civil CREA 272029394  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.08.17 10:49:25 -03'00"



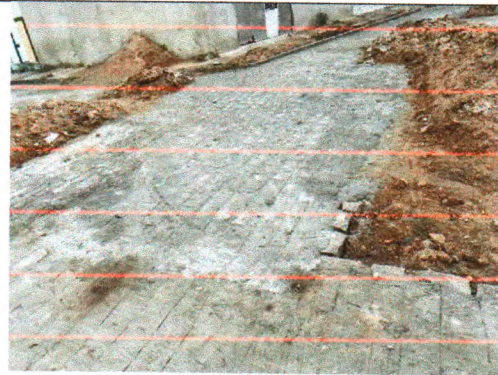
POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



RUA H



RUA H



RUA H






RUA H


*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Silva*  
Eng.º Civil CREA 272029394  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.08.17 10:49:44 -03'00'

 <p>RUA H</p>	 <p>RUA H</p>
 <p>RUA B</p>	 <p>RUA PROJETADA A</p>
 <p>RUA PROJETADA A</p>	 <p>RUA PROJETADA A</p>

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Eng.º Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**José Robson Santos da Silva**  
 Eng. Civil CREA 272029394  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

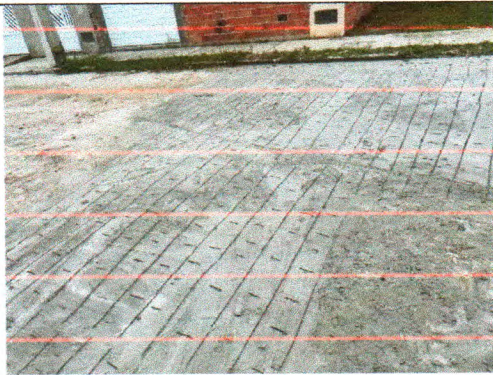
**MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525**  
 Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
 Dados: 2023.08.17 10:50:01 -03'00'



RUA PROJETADA A



RUA PROJETADA A



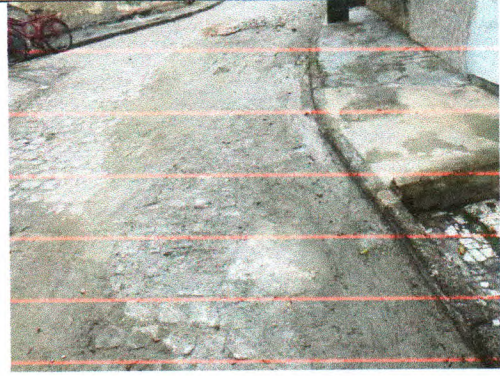
RUA M



RUA M



RUA M



RUA ARGENTINA

*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng° Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


*José Robson Santos da Silva*  
Eng. Civil CREA 272029394  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por  
MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525  
Dados: 2023.08.17  
10:50:16 -03'00'




RUA ARGENTINA

  
José Robson Santos da Silva  
Eng. Civil CREA 27202939-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066  
41211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2023.08.17  
10:50:34 -03'00'

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana
