




OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 017/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025				ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023						
							DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>69.679,25</b>	<b>69.679,25</b>	-	<b>69.679,25</b>	-	<b>100,00</b>
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	12,00		12,00	457,72	5.492,64	5.492,64	-	5.492,64	-	100,00
01.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	1,00		1,00	666,28	666,28	666,28	-	666,28	-	100,00
01.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	2.950,56	2.950,56	2.950,56	-	2.950,56	-	100,00
01.004	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.085,20	1.085,20		1.085,20	7,08	7.683,22	7.683,22	-	7.683,22	-	100,00
01.005	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	10,00	10,00		10,00	802,86	8.028,60	8.028,60	-	8.028,60	-	100,00
01.006	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento	m2	24,00	24,00		24,00	297,10	7.130,40	7.130,40	-	7.130,40	-	100,00
01.007	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	145,00	145,00		145,00	260,19	37.727,55	37.727,55	-	37.727,55	-	100,00
<b>02</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>502.937,17</b>	<b>502.937,17</b>	-	<b>502.937,17</b>	-	<b>100,00</b>
02.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1001 a 1200m	m3	1.549,52	1.549,52		1.549,52	10,56	16.362,93	16.362,93	-	16.362,93	-	100,00
02.002	Colchão de areia	m3	1.709,40	1.709,40		1.709,40	174,50	298.290,30	298.290,30	-	298.290,30	-	100,00
02.003	Reforço do sub-leito	m3	2.889,60	2.889,60		2.889,60	31,02	89.635,39	89.635,39	-	89.635,39	-	100,00
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	68.985,00	68.985,00		68.985,00	1,43	98.648,55	98.648,55	-	98.648,55	-	100,00
<b>03</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>							<b>107.319,36</b>	<b>107.319,36</b>	-	<b>107.319,36</b>	-	<b>100,00</b>
03.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	572,31	572,31		572,31	11,63	6.655,97	6.655,97	-	6.655,97	-	100,00
03.002	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	108,32	108,32		108,32	92,74	10.045,60	10.045,60	-	10.045,60	-	100,00
03.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021	m3	19,08	19,08		19,08	446,37	8.516,74	8.516,74	-	8.516,74	-	100,00
03.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.339,90	2.339,90		2.339,90	17,27	40.410,07	40.410,07	-	40.410,07	-	100,00
03.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	60,30	60,30		60,30	505,81	30.500,34	30.500,34	-	30.500,34	-	100,00
03.006	Reatero manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	469,80	469,80		469,80	23,82	11.190,64	11.190,64	-	11.190,64	-	100,00
<b>04</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>2.441.710,32</b>	<b>2.419.604,22</b>	-	<b>2.419.604,22</b>	<b>22.106,10</b>	<b>99,09</b>
<b>04.001</b>	<b>VIGAS (NÍVEL 0,00 A 11,57)</b>							<b>639.785,18</b>	<b>639.785,19</b>	-	<b>639.785,19</b>	-	<b>100,00</b>
04.001.001	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	2.449,45	2.449,45		2.449,45	103,06	252.440,32	252.440,32	-	252.440,32	-	100,00


**JOSE ALMEIDA ANDRADE**  
 0892714590  
Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590  
 ND: CN=BR, O=CPF-brasil, OU=AC SOLLITI Multiple v5, OU=19842184000185, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590  
 Resol: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.11.28 11:18:46-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

  
 Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
								DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.001.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11.692,00	11.692,00		11.692,00	17,27	201.920,84	201.920,84	-	201.920,84	-	100,00
04.001.003	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	2.912,00	2.912,00		2.912,00	16,64	48.455,68	48.455,68	-	48.455,68	-	100,00
04.001.004	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	109,60	109,60		109,60	18,44	2.021,02	2.021,02	-	2.021,02	-	100,00
04.001.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.435,90	2.435,90		2.435,90	16,18	39.412,86	39.412,86	-	39.412,86	-	100,00
04.001.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	181,96	181,96		181,96	525,03	95.534,46	95.534,47	-	95.534,46	-	100,00
<b>04.002</b>	<b>PILARES (NIVEL 0,00 A 11,57)</b>							<b>420.170,00</b>	<b>398.063,89</b>	<b>-</b>	<b>398.063,89</b>	<b>22.106,11</b>	<b>94,74</b>
04.002.001	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	1.310,82	1.178,82		1.178,82	105,70	138.553,67	124.601,27	-	124.601,27	13.952,40	89,93
04.002.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	5.001,55	5.001,55		5.001,55	17,27	86.376,77	86.376,77	-	86.376,77	-	100,00
04.002.003	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	5.096,20	5.096,20		5.096,20	16,64	84.800,77	84.800,77	-	84.800,77	-	100,00
04.002.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.254,50	2.254,50		2.254,50	16,18	36.477,81	36.477,81	-	36.477,81	-	100,00
04.002.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	140,87	125,34		125,34	525,03	73.960,98	65.807,27	-	65.807,27	8.153,71	88,98
<b>04.003</b>	<b>LAJES (NIVEL 0,00 A 11,57)</b>							<b>901.359,96</b>	<b>901.359,96</b>	<b>-</b>	<b>901.359,96</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
04.003.001	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	3.000,40	3.000,40		3.000,40	105,44	316.362,18	316.362,18	-	316.362,18	-	100,00
04.003.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	20.294,00	20.294,00		20.294,00	17,27	350.477,38	350.477,38	-	350.477,38	-	100,00
04.003.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	446,68	446,68		446,68	525,03	234.520,40	234.520,40	-	234.520,40	-	100,00
<b>04.004</b>	<b>ESCADAS E RAMPAS</b>							<b>72.850,78</b>	<b>72.850,78</b>	<b>-</b>	<b>72.850,78</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
04.004.001	Fabricação de forma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm. af. 11/2020	m2	47,54	47,54		47,54	289,58	13.766,63	13.766,63	-	13.766,63	-	100,00
04.004.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	375,80	375,80		375,80	17,27	6.490,07	6.490,07	-	6.490,07	-	100,00
04.004.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	6,84	6,84		6,84	525,03	3.591,21	3.591,21	-	3.591,21	-	100,00


**JOSE ALMEIDA ANDRADE**  
 0892714590  
Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE:0892714590  
 ND: CN=JOSE ANDRADE, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=19942184000185, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:0892714590  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização:  
 Data: 2025.11.28 11:18:46-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

  
**Sheissca Bezerra de Macedo**  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
								DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.004.004	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	16,96	16,96		16,96	2.889,32	49.002,87	49.002,87	-	49.002,87	-	100,00
<b>04.005</b>	<b>ARQUIBANCADAS ( NÍVEL 6,89 A 9,07)</b>							<b>407.544,40</b>	<b>407.544,40</b>	<b>-</b>	<b>407.544,40</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
04.005.001	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	132,50	132,50		132,50	101,87	13.497,78	13.497,78	-	13.497,78	-	100,00
04.005.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.101,64	1.101,64		1.101,64	17,27	19.025,32	19.025,32	-	19.025,32	-	100,00
04.005.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6,02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1.514,10	1.514,10		1.514,10	89,49	135.496,81	135.496,81	-	135.496,81	-	100,00
04.005.004	Concreto leve fabricado na obra, 700 kg/m3, lançado e adensado	m3	175,40	175,40		175,40	1.365,59	239.524,49	239.524,49	-	239.524,49	-	100,00
<b>05</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>							<b>283.723,00</b>	<b>283.723,00</b>	<b>-</b>	<b>283.723,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	2.475,93	2.475,93		2.475,93	51,22	126.817,13	126.817,13	-	126.817,13	-	100,00
05.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	457,00	457,00		457,00	53,93	24.646,01	24.646,01	-	24.646,01	-	100,00
05.003	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos, af_06/2017 p	m2	73,23	73,23		73,23	296,37	21.703,18	21.703,18	-	21.703,18	-	100,00
05.004	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)	m2	73,23	73,23		73,23	34,86	2.552,80	2.552,80	-	2.552,80	-	100,00
05.005	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	137,88	137,88		137,88	715,40	98.639,35	98.639,35	-	98.639,35	-	100,00
05.006	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	15,36	15,36		15,36	609,67	9.364,53	9.364,53	-	9.364,53	-	100,00
<b>05.007</b>	<b>EXTERNO</b>							<b>285.649,93</b>	<b>285.649,93</b>	<b>-</b>	<b>285.649,93</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
05.007.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	1.133,23	1.133,23		1.133,23	227,59	257.911,82	257.911,82	-	257.911,82	-	100,00
05.007.002	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	33,75	33,75		33,75	821,87	27.738,11	27.738,11	-	27.738,11	-	100,00
<b>06</b>	<b>REVESTIMENTO</b>							<b>257.439,10</b>	<b>257.439,10</b>	<b>-</b>	<b>257.439,10</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4.951,86	4.951,86		4.951,86	7,05	34.910,61	34.910,61	-	34.910,61	-	100,00
06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3.784,81	3.784,81		3.784,81	32,43	122.741,39	122.741,39	-	122.741,39	-	100,00


**JOSE ALMEIDA ANDRADE**  
 0892714590  
Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE-00892714590  
 ND: C=BR, CN=CPF-brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vs, OU=19942184000185, OU=Videocertificadora, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE-00892714590  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização:  
 Data: 2025.11.28 11:18:46-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


  
 Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
								DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia).	m2	1.167,05	1.167,05		1.167,05	36,49	42.585,65	42.585,65	-	42.585,65	-	100,00
06.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	717,87	717,87		717,87	52,20	37.472,81	37.472,81	-	37.472,81	-	100,00
06.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	137,30	137,30		137,30	143,69	19.728,64	19.728,64	-	19.728,64	-	100,00
<b>07</b>	<b>FORRO</b>							<b>42.725,21</b>	<b>42.725,21</b>	<b>-</b>	<b>42.725,21</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
07.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	884,58	884,58		884,58	48,30	42.725,21	42.725,21	-	42.725,21	-	100,00
<b>08</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>170.829,33</b>	<b>170.829,33</b>	<b>-</b>	<b>170.829,33</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
08.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	1.929,70	1.929,70		1.929,70	28,11	54.243,87	54.243,87	-	54.243,87	-	100,00
08.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	1.603,86	1.603,86		1.603,86	51,15	82.037,44	82.037,44	-	82.037,44	-	100,00
08.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	325,84	325,84		325,84	62,36	20.319,38	20.319,38	-	20.319,38	-	100,00
08.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	27,98	27,98		27,98	81,56	2.282,05	2.282,05	-	2.282,05	-	100,00
08.005	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	630,76	630,76		630,76	18,94	11.946,59	11.946,59	-	11.946,59	-	100,00
<b>09</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>295.662,07</b>	<b>295.662,07</b>	<b>-</b>	<b>295.662,07</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
09.001	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens	m2	22,00	22,00		22,00	884,19	19.452,18	19.452,18	-	19.452,18	-	100,00
09.002	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m	19,00	19,00		19,00	80,51	1.529,69	1.529,69	-	1.529,69	-	100,00
09.003	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento aço inox, padrão superior - Rev 02	cj	2,00	2,00		2,00	686,64	1.373,28	1.373,28	-	1.373,28	-	100,00
09.004	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	44,16	44,16		44,16	388,18	17.142,03	17.142,03	-	17.142,03	-	100,00
09.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	46,00	46,00		46,00	869,70	40.006,20	40.006,20	-	40.006,20	-	100,00
09.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00		4,00	847,03	3.388,12	3.388,12	-	3.388,12	-	100,00
09.007	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00		1,00	1.024,39	1.024,39	1.024,39	-	1.024,39	-	100,00
09.008	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,50 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00		4,00	1.147,01	4.588,04	4.588,04	-	4.588,04	-	100,00

JOSE  
ALMEIDA  
ANDRADE:0  
0892714590


Assinado digitalmente por JOSE  
ALMEIDA ANDRADE:0892714590  
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Múltipla v6, OU=  
18942184000185, OU=  
Videconferência, OU=Certificado  
PE A1, CN=JOSE ALMEIDA  
ANDRADE:0892714590  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2025.11.28 11:18:46-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


  
Sheissa Bezerra de Macedo  
Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 017/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID							
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025				ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %	Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
09.009	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm	Un	4,00	4,00		4,00	578,17	2.312,68	2.312,68	-	2.312,68	-	100,00	
09.010	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af. 12/2019	m2	108,97	108,97		108,97	314,69	34.291,77	34.291,77	-	34.291,77	-	100,00	
09.011	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 1 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	79,64	79,64		79,64	477,24	38.007,39	38.007,39	-	38.007,39	-	100,00	
09.012	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	22,44	22,44		22,44	821,87	18.442,76	18.442,76	-	18.442,76	-	100,00	
09.013	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	325,55	325,55		325,55	342,14	111.383,68	111.383,68	-	111.383,68	-	100,00	
09.014	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	15,85	15,85		15,85	171,60	2.719,86	2.719,86	-	2.719,86	-	100,00	
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>							<b>76.173,66</b>	<b>75.284,18</b>	<b>-</b>	<b>75.284,18</b>	<b>889,48</b>	<b>98,83</b>	
10.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	273,85	273,85		273,85	46,82	12.821,66	12.821,66	-	12.821,66	-	100,00	
10.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	13,86	13,86		13,86	85,17	1.180,46	1.180,46	-	1.180,46	-	100,00	
10.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	104,49	104,49		104,49	17,91	1.871,42	1.871,42	-	1.871,42	-	100,00	
10.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	34,57	34,57		34,57	26,31	909,54	909,54	-	909,54	-	100,00	
10.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	278,97	278,97		278,97	41,09	11.462,88	11.462,88	-	11.462,88	-	100,00	
10.006	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	93,00	93,00		93,00	13,29	1.235,97	1.235,97	-	1.235,97	-	100,00	
10.007	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	1,00	1,00		1,00	22,18	22,18	22,18	-	22,18	-	100,00	
10.008	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm	un	5,00	5,00		5,00	39,87	199,35	199,35	-	199,35	-	100,00	
10.009	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	43,00	43,00		43,00	30,81	1.324,83	1.324,83	-	1.324,83	-	100,00	
10.010	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14,00	14,00		14,00	12,79	179,06	179,06	-	179,06	-	100,00	
10.011	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	35,00	35,00		35,00	9,19	321,65	321,65	-	321,65	-	100,00	
10.012	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	44,00	44,00		44,00	27,62	1.215,28	1.215,28	-	1.215,28	-	100,00	

**JOSE**  
**ALMEIDA**  
**ANDRADE**  
**0892714590**

Imposto de Renda por JOSE  
 ALMEIDA ANDRADE 00892714590  
 ND: C=BR; O=CPF; S=Brasil; OU=AC  
 SOLUTI Multisite v5, OU=19942184000165, OU=Videconferência, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE 00892714590  
 Razão: Emissor o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025-11-28 11:18:46-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


  
 Sheissa Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023						
			DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025											
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %	Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
10.013	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	65,00	65,00		65,00	30,84	2.004,60	2.004,60	-	2.004,60	-	100,00	
10.014	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	89,00	89,00		89,00	23,00	2.047,00	2.047,00	-	2.047,00	-	100,00	
10.015	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	3,00	3,00		3,00	12,00	36,00	36,00	-	36,00	-	100,00	
10.016	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	63,00	63,00		63,00	16,63	1.047,69	1.047,69	-	1.047,69	-	100,00	
10.017	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	14,00	14,00		14,00	52,17	730,38	730,38	-	730,38	-	100,00	
10.018	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	18,00	18,00		18,00	64,67	1.164,06	1.164,06	-	1.164,06	-	100,00	
10.019	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	57,00	57,00		57,00	63,73	3.632,61	3.632,61	-	3.632,61	-	100,00	
10.020	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm	un	2,00	2,00		2,00	304,24	608,48	608,48	-	608,48	-	100,00	
10.021	Junção simples pvc rígido soldável para esgoto secundário ø 150x100mm	un	8,00	8,00		8,00	116,24	929,92	929,92	-	929,92	-	100,00	
10.022	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	36,00	36,00		36,00	30,38	1.093,68	1.093,68	-	1.093,68	-	100,00	
10.023	Reposição de luminária interna	un	22,00	-		-	40,43	889,46	-	-	-	889,46	0,00	
10.024	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	15,00	15,00		15,00	47,25	708,75	708,75	-	708,75	-	100,00	
10.025	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5,00	5,00		5,00	42,82	214,10	214,10	-	214,10	-	100,00	
10.026	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	2,00	2,00		2,00	21,35	42,70	42,70	-	42,70	-	100,00	
10.027	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	2,00		2,00	25,13	50,26	50,26	-	50,26	-	100,00	
10.028	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	11,00	11,00		11,00	25,00	275,00	275,00	-	275,00	-	100,00	
10.029	Fornecimento de Redução Excêntrica em PVC para Esgotos Sanitários, DN 150 x 100mm	un	3,00	3,00		3,00	156,90	470,70	470,70	-	470,70	-	100,00	
10.030	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	39,00	39,00		39,00	21,64	843,96	843,96	-	843,96	-	100,00	
10.031	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm	un	2,00	2,00		2,00	20,56	41,12	41,12	-	41,12	-	100,00	
10.032	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5,00	5,00		5,00	55,90	279,50	279,50	-	279,50	-	100,00	
10.033	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	7,00	7,00		7,00	43,39	303,73	303,73	-	303,73	-	100,00	
10.034	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	6,00	6,00		6,00	55,95	335,70	335,70	-	335,70	-	100,00	
10.035	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	2,00	2,00		2,00	25,29	50,58	50,58	-	50,58	-	100,00	

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE-0892714590  
 ND: C=BR, CN=CP-trial, OU=AC SOLLUTI Múltipla vs, OU=19842184000185, OU=Videocofrencia, OU=Certificado PE A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE-0892714590  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização:  
 Data: 2025.11.28 11:18:46-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


JOSE ALMEIDA ANDRADE-0892714590

Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEM DE SERVIÇOS: 17/04/2023						
								DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
10.036	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	6,00	6,00		6,00	43,39	260,34	260,34	-	260,34	-	100,00	
10.037	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	4,00	4,00		4,00	88,54	354,16	354,16	-	354,16	-	100,00	
10.038	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	20,00	20,00		20,00	63,83	1.276,60	1.276,60	-	1.276,60	-	100,00	
10.039	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	30,00	30,00		30,00	37,89	1.136,70	1.136,70	-	1.136,70	-	100,00	
10.040	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	14,00	14,00		14,00	1.464,83	20.507,62	20.507,62	-	20.507,62	-	100,00	
10.041	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,20m	un	1,00	1,00		1,00	2.093,98	2.093,98	2.093,98	-	2.093,98	-	100,00	
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRUALICAS</b>							<b>34.554,69</b>	<b>34.298,20</b>	-	<b>34.298,20</b>	<b>256,49</b>	<b>99,26</b>	
11.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	81,14	81,14		81,14	12,81	1.039,40	1.039,40	-	1.039,40	-	100,00	
11.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	369,10	369,10		369,10	15,57	5.746,89	5.746,89	-	5.746,89	-	100,00	
11.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	11,81	11,81		11,81	22,84	269,74	269,74	-	269,74	-	100,00	
11.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	203,64	203,64		203,64	47,60	9.693,26	9.693,26	-	9.693,26	-	100,00	
11.005	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm =	un	5,00	5,00		5,00	8,51	42,55	42,55	-	42,55	-	100,00	
11.006	Joelho 90º pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"	un	4,00	4,00		4,00	11,37	45,48	45,48	-	45,48	-	100,00	
11.007	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	59,00	59,00		59,00	11,46	676,14	676,14	-	676,14	-	100,00	
11.008	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2,00	2,00		2,00	14,58	29,16	29,16	-	29,16	-	100,00	
11.009	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	5,00		5,00	21,45	107,25	107,25	-	107,25	-	100,00	
11.010	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2,00	2,00		2,00	8,51	17,02	17,02	-	17,02	-	100,00	
11.011	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	112,00	112,00		112,00	8,99	1.006,88	1.006,88	-	1.006,88	-	100,00	
11.012	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	4,00		4,00	10,87	43,48	43,48	-	43,48	-	100,00	
11.013	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	9,00	9,00		9,00	20,21	181,89	181,89	-	181,89	-	100,00	
11.014	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	3,00	3,00		3,00	14,42	43,26	43,26	-	43,26	-	100,00	
11.015	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	45,00	45,00		45,00	16,60	747,00	747,00	-	747,00	-	100,00	
11.016	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	69,00	69,00		69,00	10,46	721,74	721,74	-	721,74	-	100,00	


**JOSE ALMEIDA ANDRADE**  
 ANDRADE:0892714590  
 0892714590  
Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE em 25/11/2025 às 11:18:46-03'00"  
 ID: C=BR, O=Prefeitura Municipal de Itabaiana, CN=SOLTI, OU=Itabaiana-SE, OU=19842164000165, OU=Vide conferência: DU=Certificado de AF: CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:0892714590  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.11.29 11:18:46-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Shessica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
			DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
11.017	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	3,00		3,00	15,20	45,60	45,60	-	45,60	-	100,00
11.018	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	13,00	13,00		13,00	27,64	359,32	359,32	-	359,32	-	100,00
11.019	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	6,00	6,00		6,00	18,69	112,14	112,14	-	112,14	-	100,00
11.020	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	73,00	73,00		73,00	18,53	1.352,69	1.352,69	-	1.352,69	-	100,00
11.021	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água	un	1,00	1,00		1,00	18,38	18,38	18,38	-	18,38	-	100,00
11.022	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm, p/ água	un	1,00	1,00		1,00	27,50	27,50	27,50	-	27,50	-	100,00
11.023	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm, p/ água	un	2,00	2,00		2,00	14,45	28,90	28,90	-	28,90	-	100,00
11.024	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	13,00	13,00		13,00	10,56	137,28	137,28	-	137,28	-	100,00
11.025	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	1,00	1,00		1,00	13,91	13,91	13,91	-	13,91	-	100,00
11.026	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	3,00	3,00		3,00	5,70	17,10	17,10	-	17,10	-	100,00
11.027	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	1,00		1,00	7,77	7,77	7,77	-	7,77	-	100,00
11.028	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	1,00		1,00	13,44	13,44	13,44	-	13,44	-	100,00
11.029	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	1,00	1,00		1,00	18,93	18,93	18,93	-	18,93	-	100,00
11.030	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	4,00	4,00		4,00	51,43	205,72	205,72	-	205,72	-	100,00
11.031	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	2,00		2,00	8,85	17,70	17,70	-	17,70	-	100,00
11.032	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	103,00	103,00		103,00	9,18	945,54	945,54	-	945,54	-	100,00
11.033	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	10,00	10,00		10,00	10,87	108,70	108,70	-	108,70	-	100,00
11.034	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	10,00	10,00		10,00	17,54	175,40	175,40	-	175,40	-	100,00
11.035	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	4,00	4,00		4,00	6,18	24,72	24,72	-	24,72	-	100,00
11.036	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	2,00	2,00		2,00	10,20	20,40	20,40	-	20,40	-	100,00
11.037	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	4,00	4,00		4,00	12,98	51,92	51,92	-	51,92	-	100,00
11.038	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	10,00	10,00		10,00	17,20	172,00	172,00	-	172,00	-	100,00
11.039	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	1,00		1,00	19,77	19,77	19,77	-	19,77	-	100,00
11.040	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm	un	1,00	1,00		1,00	35,09	35,09	35,09	-	35,09	-	100,00
11.041	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1,00	1,00		1,00	44,55	44,55	44,55	-	44,55	-	100,00
11.042	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	1,00		1,00	4,23	4,23	4,23	-	4,23	-	100,00


**JOSE ALMEIDA**  
**ANDRADE**  
**0892714590**  
ALMEIDA ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ND: CNPJ: 02.228.001/0001-53  
 SOLUTTI Multida vs. OU=18942184000165, OU=Videconferência: OU=Certificado PE A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:0892714590  
 Result: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Date: 2025.11.28 11:18:46-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
			DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
11.043	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	3,00	3,00		3,00	76,14	228,42	228,42	-	228,42	-	100,00
11.044	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	1,00		1,00	54,46	54,46	54,46	-	54,46	-	100,00
11.045	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	5,00	5,00		5,00	124,22	621,10	621,10	-	621,10	-	100,00
11.046	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	2,00		2,00	177,80	355,60	355,60	-	355,60	-	100,00
11.047	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	45,00	45,00		45,00	106,24	4.780,80	4.780,80	-	4.780,80	-	100,00
11.048	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	13,00	-		-	19,73	256,49	-	-	-	256,49	0,00
11.049	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	1,00	1,00		1,00	27,88	27,88	27,88	-	27,88	-	100,00
11.050	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	2,00	2,00		2,00	1.920,05	3.840,10	3.840,10	-	3.840,10	-	100,00
<b>12</b>	<b>DRENAGEM EXTERNA</b>							<b>143.362,66</b>	<b>143.362,66</b>	-	<b>143.362,66</b>	-	<b>100,00</b>
12.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	114,00	114,00		114,00	56,52	6.443,28	6.443,28	-	6.443,28	-	100,00
12.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	97,00	97,00		97,00	281,94	27.348,18	27.348,18	-	27.348,18	-	100,00
12.003	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	283,00	283,00		283,00	361,60	102.332,80	102.332,80	-	102.332,80	-	100,00
12.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 0,50 x 0,80m	un	5,00	5,00		5,00	1.447,68	7.238,40	7.238,40	-	7.238,40	-	100,00
<b>13</b>	<b>PINTURA</b>							<b>221.281,79</b>	<b>221.281,77</b>	-	<b>221.281,79</b>	-	<b>100,00</b>
<b>13.001</b>	<b>INTERIORES</b>							<b>119.862,86</b>	<b>119.862,84</b>	-	<b>119.862,86</b>	-	<b>100,00</b>
13.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	3.082,10	3.082,10		3.082,10	34,60	106.640,66	106.640,65	-	106.640,66	-	100,00
13.001.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	136,56	136,56		136,56	33,68	4.599,34	4.599,33	-	4.599,34	-	100,00
13.001.003	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	276,02	276,02		276,02	31,24	8.622,86	8.622,86	-	8.622,86	-	100,00
<b>13.002</b>	<b>EXTERIORES</b>							<b>50.393,22</b>	<b>50.393,22</b>	-	<b>50.393,22</b>	-	<b>100,00</b>
13.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.167,05	1.167,05		1.167,05	43,18	50.393,22	50.393,22	-	50.393,22	-	100,00
<b>13.003</b>	<b>TETO</b>							<b>37.652,82</b>	<b>37.652,82</b>	-	<b>37.652,82</b>	-	<b>100,00</b>
13.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	1.590,74	1.590,74		1.590,74	23,67	37.652,82	37.652,82	-	37.652,82	-	100,00
<b>13.004</b>	<b>ARQUIBANCADAS</b>							<b>13.372,89</b>	<b>13.372,89</b>	-	<b>13.372,89</b>	-	<b>100,00</b>

**JOSE ALMEIDA ANDRADE**  
 0892714590  

 Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE 00892714590  
 NE: CN=SE, OU=CPF-brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vs, OU=19842184009185, OU=Vídeokonferência, OU=Certificado PE A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE 00892714590  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Data: 2025.11.28 11:18:46-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


  
 Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 017/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M. Nº. 19/2025				CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025				ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025				DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
13.004.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1.492,51	1.492,51		1.492,51	8,96	13.372,89	13.372,89	-	13.372,89	-	100,00
<b>14</b>	<b>METAIS E LOUÇAS</b>							<b>114.058,36</b>	<b>114.058,36</b>	-	<b>114.058,36</b>	-	<b>100,00</b>
14.001	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	2,00		2,00	1.450,57	2.901,14	2.901,14	-	2.901,14	-	100,00
14.002	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,08	1,08		1,08	420,64	454,29	454,29	-	454,29	-	100,00
14.003	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	19,00	19,00		19,00	476,31	9.049,89	9.049,89	-	9.049,89	-	100,00
14.004	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	48,00	48,00		48,00	146,28	7.021,44	7.021,44	-	7.021,44	-	100,00
14.005	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	30,00	30,00		30,00	668,23	20.046,90	20.046,90	-	20.046,90	-	100,00
14.006	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	46,00	46,00		46,00	498,45	22.928,70	22.928,70	-	22.928,70	-	100,00
14.007	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	12,00	12,00		12,00	770,10	9.241,20	9.241,20	-	9.241,20	-	100,00
14.008	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	58,00	58,00		58,00	26,55	1.539,90	1.539,90	-	1.539,90	-	100,00
14.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	24,00	24,00		24,00	271,97	6.527,28	6.527,28	-	6.527,28	-	100,00
14.010	Lavatório louça de canto (Deca-lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	12,00	12,00		12,00	584,37	7.012,44	7.012,44	-	7.012,44	-	100,00
14.011	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	60,00	60,00		60,00	127,36	7.641,60	7.641,60	-	7.641,60	-	100,00
14.012	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	12,00		12,00	200,63	2.407,56	2.407,56	-	2.407,56	-	100,00
14.013	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	26,00	26,00		26,00	127,42	3.312,92	3.312,92	-	3.312,92	-	100,00
14.014	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	47,00	47,00		47,00	89,44	4.203,68	4.203,68	-	4.203,68	-	100,00
14.015	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	26,00	26,00		26,00	44,33	1.152,58	1.152,58	-	1.152,58	-	100,00
14.016	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	37,00	37,00		37,00	104,30	3.859,10	3.859,10	-	3.859,10	-	100,00
14.017	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	58,00	58,00		58,00	82,03	4.757,74	4.757,74	-	4.757,74	-	100,00
<b>15</b>	<b>IRRIGAÇÃO</b>							<b>92.329,80</b>	<b>92.329,80</b>	-	<b>92.329,80</b>	-	<b>100,00</b>
15.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª	m3	67,59	67,59		67,59	56,52	3.820,19	3.820,19	-	3.820,19	-	100,00

JOSE ALMEIDA ANDRADE  
 Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE em 25/11/2025 11:28:11.  
 Nº: 2025.11.28.11.18.48-03/09  
 SOLITI Multipla vs. OU=19842184000185, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE, O=0682714590  
 Razão: Este é o autor deste documento.  
 Localização:  
 Data: 2025.11.28 11:18:48-03/09  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Sherrissa Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana




OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.004	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	26,00	26,00		26,00	269,87	7.016,62	7.016,62	-	7.016,62	-	100,00
16.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	10,00	10,00		10,00	29,06	290,60	290,60	-	290,60	-	100,00
16.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	10,00	-	8,00	8,00	146,07	1.460,70	-	1.168,56	1.168,56	292,14	80,00
16.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	15,00	15,00		15,00	158,22	2.373,30	2.373,30	-	2.373,30	-	100,00
16.008	Poste de concreto duplo T (DT) 24/1000 - fornecimento e assentamento, Cilel ou similar	un	4,00	4,00		4,00	8.906,79	35.627,16	35.627,16	-	35.627,16	-	100,00
<b>16.009</b>	<b>PADRÃO DE ENTRADA</b>							<b>41.770,90</b>	<b>5.514,89</b>	<b>-</b>	<b>5.514,89</b>	<b>36.256,01</b>	<b>13,20</b>
16.009.001	Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	-		-	36.256,01	36.256,01	-	-	-	36.256,01	0,00
16.009.002	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1,00		1,00	2.462,14	2.462,14	2.462,14	-	2.462,14	-	100,00
16.009.003	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	1,00	1,00		1,00	227,31	227,31	227,31	-	227,31	-	100,00
16.009.004	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	18,00	18,00		18,00	16,06	289,08	289,08	-	289,08	-	100,00
16.009.005	Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m	un	1,00	1,00		1,00	14,82	14,82	14,82	-	14,82	-	100,00
16.009.006	Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - Fornecimento	Un	20,00	20,00		20,00	28,41	568,20	568,20	-	568,20	-	100,00
16.009.007	Fornecimento de estribo normal alça 2 awg	un	12,00	12,00		12,00	49,42	593,04	593,04	-	593,04	-	100,00
16.009.008	Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al	un	1,00	1,00		1,00	24,71	24,71	24,71	-	24,71	-	100,00
16.009.009	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	2,00	2,00		2,00	48,01	96,02	96,02	-	96,02	-	100,00
16.009.010	Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a	un	1,00	1,00		1,00	486,50	486,50	486,50	-	486,50	-	100,00
16.009.011	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	3,00		3,00	146,07	438,21	438,21	-	438,21	-	100,00
16.009.012	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	3,00		3,00	29,06	87,18	87,18	-	87,18	-	100,00
16.009.013	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1,00		1,00	227,68	227,68	227,68	-	227,68	-	100,00
<b>16.010</b>	<b>QUADROS</b>							<b>34.077,53</b>	<b>24.652,52</b>	<b>733,18</b>	<b>25.385,70</b>	<b>8.691,83</b>	<b>74,49</b>
16.010.001	Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva	un	1,00	1,00		1,00	2.670,96	2.670,96	2.670,96	-	2.670,96	-	100,00
16.010.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	3,00		3,00	637,32	1.911,96	1.911,96	-	1.911,96	-	100,00
16.010.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00	4,00		4,00	1.014,30	4.057,20	4.057,20	-	4.057,20	-	100,00
16.010.004	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	2,00		2,00	584,25	1.168,50	1.168,50	-	1.168,50	-	100,00

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE:0892714590  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=1894218400165, OU=Videoconferencia, OU=Certificado  
 FF: A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:0892714590  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localidade:  
 Data: 2025.11.28 11:18:46-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEN DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
			DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.011.007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	m	1.197,00	1.197,00		1.197,00	53,30	63.800,10	63.800,10	-	63.800,10	-	100,00
16.011.008	Eletrodo ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	62,00	62,00		62,00	263,98	16.366,76	16.366,76	-	16.366,76	-	100,00
16.011.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	604,00	604,00		604,00	24,15	14.586,60	14.586,60	-	14.586,60	-	100,00
16.011.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	889,00	889,00		889,00	27,17	24.154,13	24.154,13	-	24.154,13	-	100,00
16.011.011	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	151,00	151,00		151,00	38,30	5.783,30	5.783,30	-	5.783,30	-	100,00
16.011.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	59,00	59,00		59,00	46,50	2.743,50	2.743,50	-	2.743,50	-	100,00
16.011.013	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	447,00	447,00		447,00	63,10	28.205,70	28.205,70	-	28.205,70	-	100,00
16.011.014	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"	un	20,00	4,00		4,00	187,36	3.747,20	749,44	-	749,44	2.997,76	20,00
16.011.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	202,00	202,00		202,00	5,70	1.151,40	1.151,40	-	1.151,40	-	100,00
16.011.016	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	51,00	51,00		51,00	9,76	497,76	497,76	-	497,76	-	100,00
16.011.017	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	20,00	20,00		20,00	20,79	415,80	415,80	-	415,80	-	100,00
16.011.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	297,00	297,00		297,00	7,55	2.242,35	2.242,35	-	2.242,35	-	100,00
16.011.019	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	150,00	150,00		150,00	32,45	4.867,50	4.867,50	-	4.867,50	-	100,00
16.011.020	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	8,00	8,00		8,00	66,79	534,32	534,32	-	534,32	-	100,00
16.011.021	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	8,00	8,00		8,00	14,40	115,20	115,20	-	115,20	-	100,00
<b>16.012</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>							<b>28.843,10</b>	<b>28.843,10</b>	<b>-</b>	<b>28.843,10</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
16.012.001	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	286,00	286,00		286,00	100,85	28.843,10	28.843,10	-	28.843,10	-	100,00
<b>17</b>	<b>DRENAGEM DO CAMPO</b>							<b>116.392,59</b>	<b>116.392,59</b>	<b>-</b>	<b>116.392,59</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
17.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	230,40	230,40		230,40	11,63	2.679,55	2.679,55	-	2.679,55	-	100,00
17.002	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanamet ou similar)	m	720,00	720,00		720,00	32,80	23.616,00	23.616,00	-	23.616,00	-	100,00
17.003	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanamet ou similar)	m	99,50	99,50		99,50	46,19	4.595,91	4.595,91	-	4.595,91	-	100,00
17.004	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 8" (Kanamet ou similar)	m	97,10	97,10		97,10	63,13	6.129,92	6.129,92	-	6.129,92	-	100,00
17.005	Lastro de brita 1	m3	184,30	184,30		184,30	177,63	32.737,21	32.737,21	-	32.737,21	-	100,00
17.006	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	2.109,00	2.109,00		2.109,00	17,56	37.034,04	37.034,04	-	37.034,04	-	100,00
17.007	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores	un	16,00	16,00		16,00	252,57	4.041,12	4.041,12	-	4.041,12	-	100,00

**JOSE ALMEIDA ANDRADE: 0892714590**  
Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE em 25/11/2025 às 14:05:10. ID: C=BR, O=Prefeitura Municipal de Itabaiana, CN=SOLUTI Multipla v5, OU=18942184000165, OU=Videconferência, OU=Certificado PF-A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:0892714590. Título: Eu sou o autor deste documento. Localização: Data: 2025.11.28 11:18:46-03'00". Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil - CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 017/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.º. 19/2025					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025					ORDEM DE SERVIÇOS: 17/04/2023					
			DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
17.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	un	4,00	4,00		4,00	1.172,58	4.690,32	4.690,32	-	4.690,32	-	100,00
17.009	Reatero manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	46,10	46,10		46,10	18,84	868,52	868,52	-	868,52	-	100,00
<b>18</b>	<b>GRAMADO</b>							<b>333.921,39</b>	<b>333.921,39</b>	<b>-</b>	<b>333.921,39</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
18.001	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m3	1.282,05	1.282,05		1.282,05	103,72	132.974,23	132.974,23	-	132.974,23	-	100,00
18.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	8.132,22	8.132,22		8.132,22	24,71	200.947,16	200.947,16	-	200.947,16	-	100,00
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>12.248,22</b>	<b>6.718,62</b>	<b>3.379,30</b>	<b>10.097,92</b>	<b>2.150,30</b>	<b>82,44</b>
19.001	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	-	1,00	1,00	861,04	861,04	-	861,04	861,04	-	100,00
19.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	-	-	-	2.150,30	2.150,30	-	-	-	2.150,30	0,00
19.003	Trave para futebol de campo	par	1,00	1,00		1,00	4.200,36	4.200,36	4.200,36	-	4.200,36	-	100,00
19.004	Limpeza geral	m2	1.929,70	964,85	964,85	1.929,70	2,61	5.036,52	2.518,26	2.518,26	5.036,52	-	100,00
<b>20</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>234.700,00</b>	<b>231.742,77</b>	<b>187,76</b>	<b>231.930,53</b>	<b>2.769,47</b>	<b>98,82</b>
20.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	1.000,00	987,40	0,80	988,20	129,72	129.720,00	128.085,56	103,78	128.189,34	1.530,66	98,82
20.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	2.000,00	1.974,80	1,60	1.976,40	45,60	91.200,00	90.050,87	72,96	90.123,83	1.076,17	98,82
20.003	Topógrafo com encargos complementares	h	500,00	493,70	0,40	494,10	18,78	9.390,00	9.271,67	7,51	9.279,18	110,82	98,82
20.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	500,00	493,70	0,40	494,10	8,78	4.390,00	4.334,67	3,51	4.338,18	51,82	98,82
<b>Total geral</b>								<b>6.478.484,59</b>	<b>6.396.606,21</b>	<b>5.468,80</b>	<b>6.402.075,01</b>	<b>76.409,58</b>	<b>98,82</b>

**JOSE ALMEIDA ANDRADE:008**  
**92714590**  
 Eng.º Civil Jose Almeida Andrade  
 CREA RN 2714133398

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ  
 Data: 01/12/2025 08:43:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JHON LENNON GOMES SANTOS  
 Data: 01/12/2025 09:08:22-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

  
 Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590**  
 Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=19842184000165, OU=Videconferência, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização:  
 Data: 2025.11.28 11:18:46-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO Nº 017/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 19/2025		CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 – 886732/2019/MCID	
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025		ORDEM DE SERVIÇOS: 17/04/2023	
				DATA MEDIÇÃO: 25/11/2025	
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>				
16.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00	> 8,00 un	
<b>16.010</b>	<b>QUADROS</b>				
16.010.008	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	> 1,00 un	
16.010.015	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	> 1,00 un	
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
19.001	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	> 1,00 un	
19.004	Limpeza geral	m2	1.929,70	> 1.929,70 m² x 50,00 % = 964,85 m²	
<b>20</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
20.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	0,80	> (6.401.887,25 - 231.742,77) / (6.478.484,59 - 234.700,00) = 0,9882 x 1.000,00 h = 988,20 h - 987,40 h (Medição Anterior) = 0,80 h	
20.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1,60	> (6.401.887,25 - 231.742,77) / (6.478.484,59 - 234.700,00) = 0,9882 x 2.000,00 h = 1.976,40 h - 1.974,80h (Medição Anterior) = 1,60 h	
20.003	Topografo com encargos complementares	h	0,40	> (6.401.887,25 - 231.742,77) / (6.478.484,59 - 234.700,00) = 0,9882 x 500,00 h = 494,10 h - 493,70 h (Medição Anterior) = 0,40 h	
20.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,40	> (6.401.887,25 - 231.742,77) / (6.478.484,59 - 234.700,00) = 0,9882 x 500,00 h = 494,10 h - 493,70 h (Medição Anterior) = 0,40 h	
<b>JOSE ALMEIDA ANDRADE:008</b> 92714690 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___	



Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ  
 Data: 01/12/2025 08:43:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JHON LENNON GOMES SANTOS  
 Data: 01/12/2025 09:08:22-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

  
 Sheissica Bezerra de Macedo  
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 19


CONTRATO 017/2023

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 –  
886732/2019/MCID


ORDEM DE SERVIÇO  
INICIO - 17/04/2023




PLACA DA OBRA

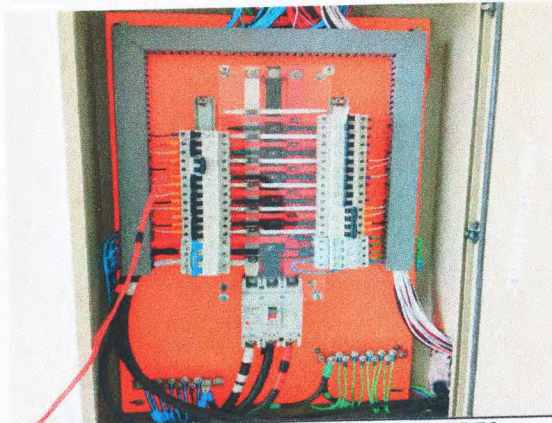

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTORES

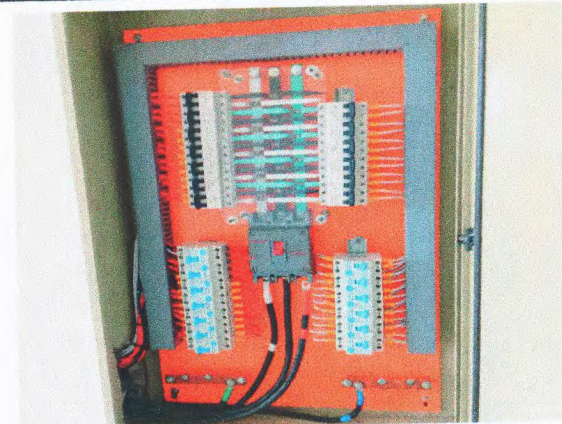

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTORES

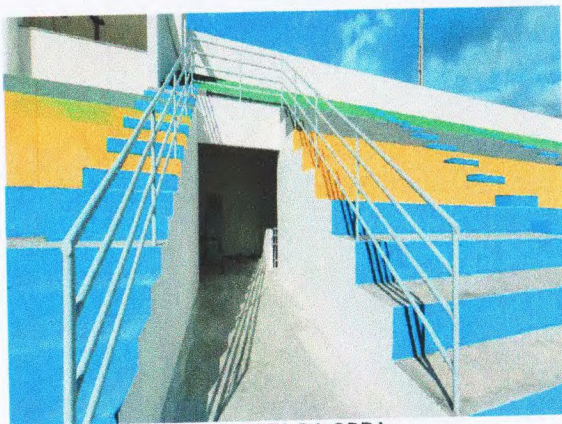


LIMPEZA DA OBRA





LIMPEZA DA OBRA




LIMPEZA DA OBRA

  
Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana:

  
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador  
RT Eng.º CIVIL CREA/SE  
RN 2714133398

  
Sheissica Bezerra de Macedo  
Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FOLHA 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - 1ª ETAPA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 19

CONTRATO 017/2023

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88 –  
886732/2019/MCID

ORDEM DE SERVIÇO  
INICIO - 17/04/2023




PINTURA INTERNA TETO E PAREDES




MARCO INAUGURAL



MARCO INAUGURAL

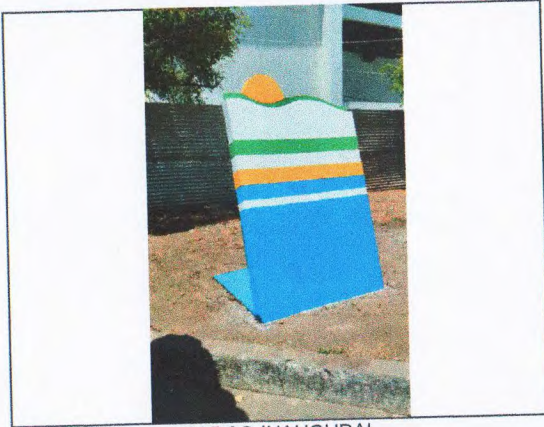

MARCO INAUGURAL

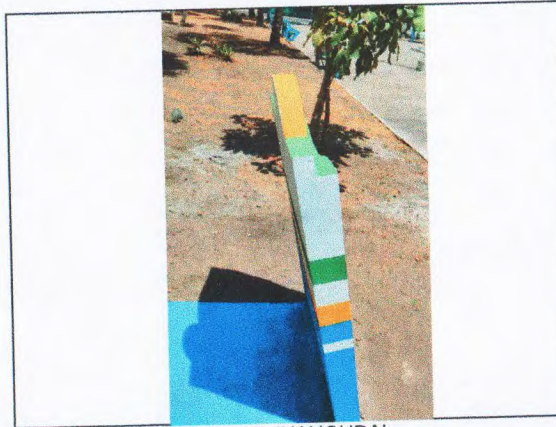



MARCO INAUGURAL





MARCO INAUGURAL

ELABORADO POR:

  
Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Sheissica Bezerra de Macedo  
Eng.(a) Civil CREA 2722159830  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Jose Abreide Andrade  
Sócio Administrador  
RT Eng.ª Civil CREA/SE  
RN 2714133398

  
Jhon Lennon Gomes Sani  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2
