

		OBRA: 000817 - INFRAESTRUTURA - Construção da Creche Pré-Escola - Pró infância - Tipo 2 no Bairro São Cristóvão					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: N° 245/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026		Período: 01/03/2026 a 31/03/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição: 04/05/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Unit.	Valores (R\$)					% Medição	
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
	INFRAESTRUTURA								173.447,81	-	30.347,00	30.347,00	143.100,81	17,49	
01	SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAÇÃO								5.982,93	-	1.970,43	1.970,43	3.992,50	33,60	
01.001	Sondagem a percussão	m	26,00		10,38	10,38	15,62	189,83	4.935,98		1.970,43	1.970,43	2.965,15	39,92	
01.002	Projeto estrutural de fundação	m2	891,68			-	891,68	1,04	927,35		-	-	927,35	-	
02	IMPLANTAÇÃO								67.169,81	-	26.905,52	26.905,52	40.264,29	40,05	
02.001	MURO								67.169,81	-	26.905,52	26.905,52	40.264,29	40,05	
02.001.001	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	90,00		90,00	90,00	-	1,38	124,20		124,20	124,20	-	100,00	
02.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,90		18,90	18,90	-	64,42	1.217,54		1.217,54	1.217,54	-	100,00	
02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia, pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	t/m	425,25		425,25	425,25	-	1,32	561,33		561,33	561,33	-	100,00	
02.001.004	Muro em alvenaria bloco cerâmico, esp=0,09m, c/ alv de pedra 11,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	198,00		99,00	99,00	99,00	252,55	50.004,90		25.002,45	25.002,45	25.002,45	50,00	
02.001.005	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão a 04/2023	m2	396,00			-	396,00	4,00	1.584,00		-	-	1.584,00	-	
02.001.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	396,00			-	396,00	18,53	7.337,98		-	-	7.337,98	-	
02.001.007	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos a 04/2023	m2	396,00			-	396,00	16,01	6.339,96		-	-	6.339,96	-	
03	TERRAPLANAGEM								67.887,00	-	-	-	67.887,00	-	
03.001	Material para sub-base, obr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na açamiba), exclusive transporte	m3	630,00			-	630,00	19,60	12.348,00		-	-	12.348,00	-	
03.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia, pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	t/m	14.175,00			-	14.175,00	1,32	18.711,00		-	-	18.711,00	-	
03.003	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	630,00			-	630,00	5,16	3.250,80		-	-	3.250,80	-	

		OBRA: 000817 - INFRAESTRUTURA - Construção da Creche Pré-Escola - Pró Infância - Tipo 2 no Bairro São Cristóvão				DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 245/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA						VIGÊNCIA		24/07/2026		Período: 01/03/2026 a 31/03/2025		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição: 04/05/2026					
Item		Discriminação dos Serviços		Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medico
				Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	
03.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		m3	45,00			-	45,00	64,42	2.898,90		-	-	2.898,90	-
03.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³		tkm	1.012,50			-	1.012,50	1,32	1.336,50		-	-	1.336,50	-
03.006	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeição mecânica e transporte		m3	45,00			-	45,00	622,34	28.005,30		-	-	28.005,30	-
03.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³		tkm	1.012,50			-	1.012,50	1,32	1.336,50		-	-	1.336,50	-
04	PAVIMENTAÇÃO									23.874,02	-	-	-	23.874,02	-
04.001	Colchão de areia		m3	21,63			-	21,63	159,79	3.456,26		-	-	3.456,26	-
04.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos		m2	144,19			-	144,19	68,24	9.839,53		-	-	9.839,53	-
04.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar		m2	144,19			-	144,19	28,77	4.148,35		-	-	4.148,35	-
04.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m) rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m	90,12			-	90,12	51,79	4.667,31		-	-	4.667,31	-
04.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desarmado, pintado em nove cores, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional		un	3,00			-	3,00	587,79	1.763,37		-	-	1.763,37	-
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									8.663,25	-	1.471,05	1.471,05	7.192,20	16,99
05.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares		h	25,00		4,25	4,25	20,75	153,17	3.829,25		650,97	650,97	3.178,28	16,99
05.002	Mestre de obras com encargos complementares		h	60,00		10,20	10,20	49,80	80,40	4.824,00		820,08	820,08	4.003,92	17,00
TOTAL:										173.447,01	-	0,00%	17,49%	17,49%	82,51%
PERCENTUAL															
 ASSINATURA DA EMPRESA										FISCAL DO CONTRATO		ENGª. KELLY PINTO FREIRE - CREA/SE 2709362449			

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:7904588
0563

Assinado de forma digital por
KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
 Dados: 2026.05.12 15:13:00
 +03'00'



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 12/05/2026 11:42:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
KELLY PINTO FREIRE
 Data: 12/05/2026 10:44:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 (INFRAESTRUTURA) NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				Período de medição: 01/03/2026 a 31/03/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 04/05/2026
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	
01	SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAÇÃO			
01.001	Sondagem a percussão	m	10,38	2,62+2,75+1,66+1,52+1,83 = 10,38 metros
02	IMPLANTAÇÃO			
02.001	MURO			
02.001.001	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	90,00	100,00% do serviço executado
02.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,90	100,00% do serviço executado
02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	425,25	100,00% do serviço executado
02.001.004	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	99,00	50,00% do serviço executado
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
05.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4,25	25 horas x 17% = 4,25 h
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	10,20	60 horas x 17% = 10,20 h
				Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				Data: ____/____/____

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:7904588
0563

Assinado de forma digital
por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.05.12 15:14:59
-03'00'



Documento assinado digitalmente

KELLY PINTO FREIRE
Data: 12/05/2026 10:44:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente

SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 12/05/2026 11:42:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 (INFRAESTRUTURA) NO
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº
960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO Nº 215/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

ORDEM DE SERVIÇO

Início - 25/08/2025

Período - 01/03/2026 a 31/03/2026

Medição - 04/05/2026



SONDAGEM A PERCUSSÃO



SONDAGEM A PERCUSSÃO



IMPLANTAÇÃO DO MURO



IMPLANTAÇÃO DO MURO




MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

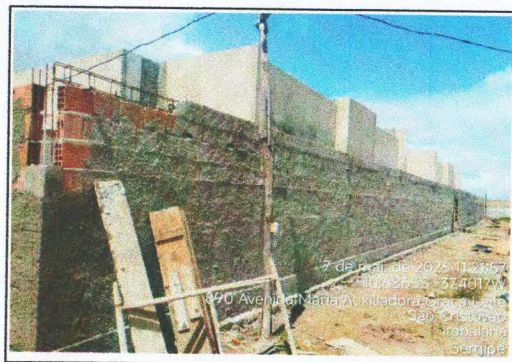

MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

ELABORADO POR:

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:7904588
0563

Assinado de forma digital
por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.06.08 10:47:45
-03'00'

S.B.M.
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449
