



MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO				DATA DE INICIO: 21/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO						CONTRATO 015/2026	
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 02/08/2026			PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026						DATA DE MEDIÇÃO: 26/03/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA				QUANTIDADES			VALORES (R\$)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS													
1.01	Recapeamento asfáltico													
01.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	472,34		472,34	472,34	0,00	R\$ 2,30	R\$ 1.086,38	R\$ -	R\$ 1.086,38	R\$ 1.086,38	R\$ -	100%
01.01.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm), af_07/2020	m³xkm	573,60		573,60	573,60	0,00	R\$ 2,89	R\$ 1.657,70	R\$ -	R\$ 1.657,70	R\$ 1.657,70	R\$ -	100%
01.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	22,26		22,26	22,26	0,00	R\$ 21,12	R\$ 470,13	R\$ -	R\$ 470,13	R\$ 470,13	R\$ -	100%
01.01.004	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material, af_12/2020	m²	19,12		19,12	19,12	0,00	R\$ 325,34	R\$ 6.220,50	R\$ -	R\$ 6.220,50	R\$ 6.220,50	R\$ -	100%
2	RUA MARIA ANGELINA SANTANA													
2.01	Recapeamento asfáltico													
02.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	472,34		472,34	472,34	0,00	R\$ 2,30	R\$ 1.086,39	R\$ -	R\$ 1.086,39	R\$ 1.086,39	R\$ -	100%
3	RUA ABILIO DE OLIVEIRA													
3.01	Recapeamento asfáltico													
03.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	472,34		472,34	472,34	0,00	R\$ 2,30	R\$ 1.086,37	R\$ -	R\$ 1.086,37	R\$ 1.086,37	R\$ -	100%
4	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES													
4.01	Recapeamento asfáltico													
04.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	472,34		472,34	472,34	0,00	R\$ 2,30	R\$ 1.086,37	R\$ -	R\$ 1.086,37	R\$ 1.086,37	R\$ -	100%
5	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE													
5.01	Recapeamento asfáltico													
05.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	472,34		472,34	472,34	0,00	R\$ 2,30	R\$ 1.086,37	R\$ -	R\$ 1.086,37	R\$ 1.086,37	R\$ -	100%
6	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA													
6.01	Recapeamento asfáltico													
06.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	944,68		944,68	944,68	0,00	R\$ 2,30	R\$ 2.172,76	R\$ -	R\$ 2.172,76	R\$ 2.172,76	R\$ -	100%
7	SINALIZAÇÃO													
7.01.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo i por extrusão - relevo duplo com base	m²	101,80		0,00	101,80	124,91	R\$ 12,715,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.715,83	R\$ -	0%
7.01.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrilicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	50,90		0,00	50,90	78,99	R\$ 4.020,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.020,59	R\$ -	0%
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO													
8.01	Recapeamento asfáltico													
8.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	4131,00		4131,00	4131,00	0,00	R\$ 1,40	R\$ 5.783,40	R\$ -	R\$ 5.783,40	R\$ 5.783,40	R\$ -	100%

Rosângela
 Rosângela S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 27210318/99
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO			DATA DE INICIO: 21/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO											
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 02/08/2026					PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026					CONTRATO 015/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA			DATA DE MEDIÇÃO: 26/03/2026																
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)											
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido					
8.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	4131,00		4131,00	4131,00	0,00	R\$ 2,42	R\$ 9.997,02	R\$ -	R\$ 9.997,02	R\$ 9.997,02	R\$ -	100%					
8.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	4131,00		4131,00	4131,00	0,00	R\$ 1,93	R\$ 7.972,83	R\$ -	R\$ 7.972,83	R\$ 7.972,83	R\$ -	100%					
8.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1487,16		1487,16	1487,16	0,00	R\$ 2,30	R\$ 3.420,46	R\$ -	R\$ 3.420,46	R\$ 3.420,46	R\$ -	100%					
8.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM). Af_07/2020	txkm	1006,31		1006,31	1006,31	0,00	R\$ 0,91	R\$ 915,74	R\$ -	R\$ 915,74	R\$ 915,74	R\$ -	100%					
8.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	206,55		206,55	206,55	0,00	R\$ 1.750,10	R\$ 361.483,15	R\$ -	R\$ 361.483,15	R\$ 361.483,15	R\$ -	100%					
8.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	6196,53		6196,53	6196,53	0,00	R\$ 2,89	R\$ 17.907,97	R\$ -	R\$ 17.907,97	R\$ 17.907,97	R\$ -	100%					
8.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	4131,02		4131,02	4131,02	0,00	R\$ 1,13	R\$ 4.668,05	R\$ -	R\$ 4.668,05	R\$ 4.668,05	R\$ -	100%					
8.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	495,72		495,72	495,72	0,00	R\$ 5,38	R\$ 2.666,97	R\$ -	R\$ 2.666,97	R\$ 2.666,97	R\$ -	100%					
8.2	Limpeza																		
8.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4131,00			0,00	4131,00	R\$ 0,35	R\$ 1.445,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.445,85	0%					
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$	448.950,84	R\$	-	R\$	430.768,56	R\$	430.768,56	R\$	18.182,28	R\$	0,96
								0,08%		95,95%				95,95%					
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.03.31 11:49:04 -03'00'								ASSINATURA FISCALIZAÇÃO		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 430.768,56 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). DATA LIBERAÇÃO: ____/____/____									


 Eng.ª Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS				
01.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.312,06	0,012	30,00	472,34
EXECUTADO NO PERÍODO:					472,34
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					472,34
SALDO DO CONTRATO					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					472,34

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

Rizzi Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboiara

Jose Arnaldo dos S. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS		
01.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Área (m²)	espessura (m)
RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS			
BORRACHUDOS		9,90	0,70
BORRACHUDOS		9,90	0,70
BORRACHUDOS		28,00	0,30
EXECUTADO NO PERÍODO:			22,26
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			22,26
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			22,26

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizina Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CIVIL CREA - 2715818424
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizida Maione S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 015/26

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2	RUA MARIA ANGELINA SANTANA				
02.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA MARIA ANGELINA SANTANA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.312,07	0,012	30,0	472,34
EXECUTADO NO PERÍODO:					472,34
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					472,34
SALDO DO CONTRATO:					0,00
À MEDIR NO PERÍODO:					472,34

João Arnaldo da N. D. Silva Junior
Eng. Civil CREA 0721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 015/26

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
3	RUA ABILIO DE OLIVEIRA				
03.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA ABILIO DE OLIVEIRA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.312,04	0,012	30,0	472,34
EXECUTADO NO PERÍODO:					472,34
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					472,34
SALDO DO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					472,34

Assessor: Al. Pereira Junior
 Org. CIVIL CREA: 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CIVIL CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
4	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES				
04.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.312,05	0,012	30,0	472,34
EXECUTADO NO PERÍODO:					472,34
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					472,34
SALDO DO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					472,34

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 272403/1899
Gerente Geral de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
5	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE				
05.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE					
		1.312,05	0,012	30,0	472,34
EXECUTADO NO PERÍODO:					472,34
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					472,34
SALDO DO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					472,34

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CIVIL CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Mahaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 015/26

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
6	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA				
06.01.001	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		2.624,11	0,012	30,0	944,68
EXECUTADO NO PERÍODO:					944,68
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					944,68
SALDO DO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					944,68

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA-2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

~~Rizid Milene S. Rodrigues Araújo~~
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itahana

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		ÁREA
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO			
8.01.001	Locação de serviços de pavimentação	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
RUA JAILTON ANDRADE MACHADO		m	m	m²
TRECHO 01:		426,00	8,50	3.621,00
TRECHO 02:		68,00	7,50	510,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		EXTENSÃO		4.131,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				4.131,00
SALDO DO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				4.131,00

Eng. Civil CREA-224031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CIVIL CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO		
8.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JAILTON ANDRADE MACHADO			
		4.131,00	4131,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	4.131,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			4.131,00
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			4.131,00

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

~~Proposta~~
Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO		
8.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA JAILTON ANDRADE MACHADO			
		4.131,00	4131,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	4.131,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			4.131,00
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			4.131,00

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabiana

Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CIVIL CREA - 27158184/2
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboraí

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATO: 015/26

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO				
8.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA JAILTON ANDRADE MACHADO					
PINTURA DE LIGAÇÃO		4.131,00	0,012	30,0	1.487,16
EXECUTADO NO PERÍODO:					1.487,16
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					1.487,16
SALDO DO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					1.487,16

José Arnaldo de N. Batista 444190
Eng. Civil CREA-2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabirato

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO				
8.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA JAILTON ANDRADE MACHADO					
PINTURA DE LIGAÇÃO		4.131,00	0,012	20,3	1.006,31
EXECUTADO NO PERÍODO:					1.006,31
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					1.006,31
SALDO DO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					1.006,31

João Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO		
8.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 4.131,00	0,05	206,55
	EXECUTADO NO PERÍODO:	0,00	206,55
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		206,55
	SALDO DO CONTRATO		0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		206,55

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818-424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

[illegible]

Rizvia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO			
8.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	206,55	20	4131,02
	EXECUTADO NO PERÍODO:			
	ACUMULADO ANTERIOR:			4.131,02
	ACUMULADO ATUAL:			0,00
	SALDO DO CONTRATO			4.131,02
	A MEDIR NO PERÍODO:			0,00
				4.131,02

José Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CRF 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

~~Rizio~~
Rizio Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATO: 015/26

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
8	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO			
8.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami não basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JAILTON ANDRADE MACHADO			
	Camada	m³		T
		206,55	2,4	495,72
	EXECUTADO NO PERÍODO:			
	ACUMULADO ANTERIOR:			495,72
	ACUMULADO ATUAL:			0,00
	SALDO DO CONTRATO			495,72
	A MEDIR NO PERÍODO:			0,00
				495,72

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizvia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CNII CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO




CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 015/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 19/03/2026 a 23/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
	DMT

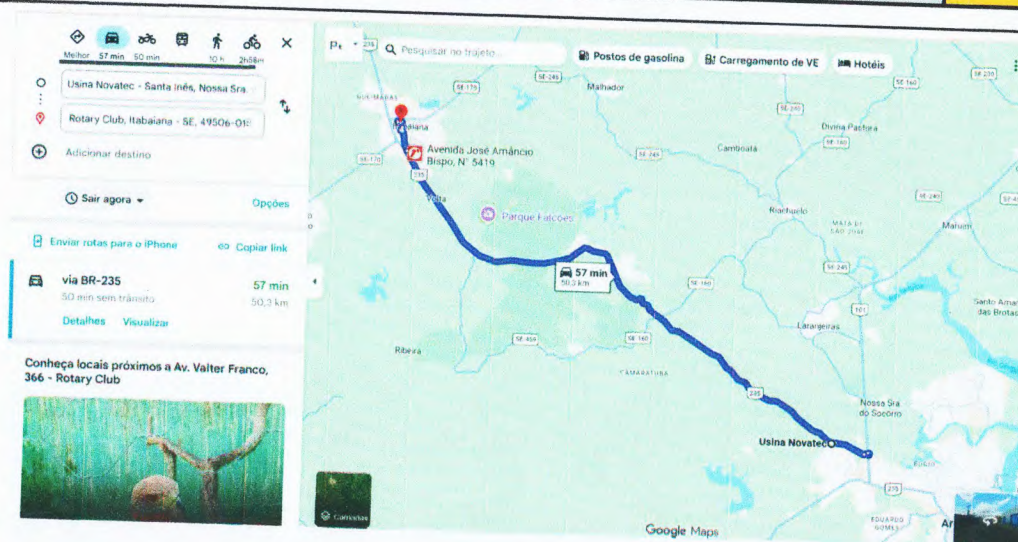

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.03.26 14:25:26 -03'00'

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

LOCAL DA OBRA: ITABAIANA-SE

CONTRATO: 015/2026



MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 19/03/2026 A 23/03/2026

ITEM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01- JAILTON ANDRADE MACHADO



FOTO 02-RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS



FOTO 03-JAILTON ANDRADE MACHADO



FOTO 04-JAILTON ANDRADE MACHADO



FOTO 05-JAILTON ANDRADE MACHADO



FOTO 06-RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS



FOTO 07-RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS



FOTO 08-RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS



Jose Arnaldo de S. Pereira Junior
Eng. CIVIL CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª CIVIL CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
