


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.								BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO								
CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								Período: 11/10/2025 A 25/11/2025					CONTRATO 227/2025			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana								Data de medição: 17/12/2025								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CODIGO	UNID	QUANTIDADES					SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	ADITIVO	ACUMULADO	VALORES (R\$)			
				CONTRATADA	ACUMULADA	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O	PERÍODO					ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1	Pavimentação de estradas vicinais, no município de															
1.01	PAVIMENTAÇÃO										R\$ 267.917,24		R\$ 142.920,88	R\$ 142.920,88	R\$ 124.996,36	53,35%
01.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	87.066,86	-		0,00	87.066,86	0,97	R\$ 84.454,85			R\$ -	R\$ 84.454,85		0,00%
01.01.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024	94273/ SINAPI	m	2.407,00		2.407,00	2.407,00	-	47,36	R\$ 113.988,16		R\$ 113.988,16	R\$ 113.988,16	R\$ -		100,00%
01.01.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	00071/ORSE	m³	180,53		180,53	180,53	-	77,45	R\$ 13.981,09		R\$ 13.981,09	R\$ 13.981,09	R\$ -		100,00%
01.01.004	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	11722/ORSE	m³	862,12		862,12	862,12	-	17,34	R\$ 14.951,64		R\$ 14.951,63	R\$ 14.951,63	R\$ -		100,00%
01.01.005	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de liante, exclusive transporte	02593/ORSE	m²	23.708,48			0,00	23.708,48	1,71	R\$ 40.541,50		R\$ -	R\$ -	R\$ 40.541,50		0,00%
1.02	REDE COLETORA - DRENAGEM										R\$ 150.820,45		R\$ 150.820,38	R\$ 150.820,38	R\$ -	100,00%
01.02.001	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (SICRO - 4805757)	0030 / PMI	m³	675,00		675,00	675,00	-	7,77	R\$ 5.244,75		R\$ 5.244,75	R\$ 5.244,75	R\$ -		100,00%
01.02.002	Apiloamento manual de fundo de vala	02660/ORSE	m2	365,00		365,00	365,00	-	31,93	R\$ 11.654,45		R\$ 11.654,45	R\$ 11.654,45	R\$ -		100,00%
01.02.003	Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4 815671)	0031 / PMI	m³	603,37		603,37	603,37	-	19,97	R\$ 12.049,37		R\$ 12.049,30	R\$ 12.049,37			100,00%
01.02.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado c a2 d=0,40 m	02675/ORSE	m	365,00		365,00	365,00	-	106,76	R\$ 38.967,40		R\$ 38.967,40	R\$ 38.967,40	R\$ -		100,00%
01.02.005	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003104)	0033 / PMI	un	2,00		2,00	2,00	-	126,81	R\$ 253,62		R\$ 253,62	R\$ 253,62	R\$ -		100,00%
01.02.006	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003388)	0034 / PMI	m	6,00		6,00	6,00	-	192,00	R\$ 1.152,00		R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	R\$ -		100,00%
01.02.007	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003641)	0035 / PMI	un	3,00		3,00	3,00	-	1044,52	R\$ 3.133,56		R\$ 3.133,56	R\$ 3.133,56	R\$ -		100,00%
01.02.008	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003619)	0036 / PMI	un	3,00		3,00	3,00	-	952,89	R\$ 2.858,67		R\$ 2.858,67	R\$ 2.858,67	R\$ -		100,00%
01.02.009	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	2003578/ SICRO	m	400,00		400,00			188,77	R\$ 75.506,63		R\$ 75.506,63	R\$ 75.506,63	R\$ -		100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO											R\$ 418.737,69		R\$ 293.741,26	R\$ 293.741,26	R\$ 124.996,43	70,15%
													70,14%		29,85%	
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO								ASSINATURA FISCALIZAÇÃO					VALOR DA MEDIÇÃO: 293.741,26 (duzentos e noventa e três mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos).			
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415													DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____			
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2025.12.29 13:54:10 -03'00'																


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes
Eng. Civil CREA - 272189465
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabana

AGC

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaipava

Diego Oliveira Barros
Eng.º CIVIL CREA - 27224824/7
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. CIVIL CREA - 2721094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482/MT
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE.**





ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
1.02	REDE COLETORA - DRENAGEM		
01.02.005	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003104)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	UN	UN
ESTACA			
			2,00
2+00 m		1,00	
1+5 m		1,00	
EXECUTADO NO PERÍODO:			2,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			2,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2,00
 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		 Jhon Lennon Gomes Santos Eng. Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO			
1.02	REDE COLETORA - DRENAGEM			
01.02.006	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003388)	QUANTIDADE	EXTENSÃO	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	UN	m	m
ESTACA				
2+00 m		1,00	3,00	3,00
1+5 m		1,00	3,00	3,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				6,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				6,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				6,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				6,00


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE.**



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
1.02	REDE COLETORA - DRENAGEM		
01.02.008	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita p rodizada (SICRO - 2003619)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	UN	UN
ESTACA			
			3,00
35+3 m		1,00	
6+6,00 m LD		1,00	
6+6,00 m LE		1,00	
EXECUTADO NO PERÍODO:			3,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			3,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			
A MEDIR NO PERÍODO:			3,00


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482457
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.12.19 08:01:39 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



LOCAL DA OBRA: POVOADO PÉ DO VEADO- ITABAIANA-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 227/2025

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 11/10/2025 a 25/11/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM	

FOTO 01- Execução da denagem



11 de out. de 2025 11:47:17
24L 673771 8824530

FOTO 02-Execução da denagem



FOTO 03-Execução da denagem



17 de out. de 2025 14:25:03
24L 673836 8824596

FOTO 04-Execução da denagem



15 de out. de 2025 10:19:08
24L 673759 8824518

FOTO 05-Execução da denagem



13 de nov. de 2025 15:13:18
Estrada para Várzea do Gama
Itabaiana
Sergipe
Número de índice: 1419

FOTO 06-Execução da denagem



13 de nov. de 2025 15:13:34
Estrada para Várzea do Gama
Itabaiana
Sergipe
Número de índice: 1421


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894092
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



LOCAL DA OBRA: POVOADO PÉ DO VEADO- ITABAIANA-SE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 227/2025

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 11/10/2025 a 25/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 07-Execução da denagem



FOTO 08-Execução da denagem



FOTO 09-Execução da escavação para assentamento do meio-fio




FOTO 10-Execução do aterro para escoramento do meio-fio



FOTO 11-Execução de assentamento do meio-fio



FOTO 12-Execução do aterro e compactação para escoramento do meio-fio

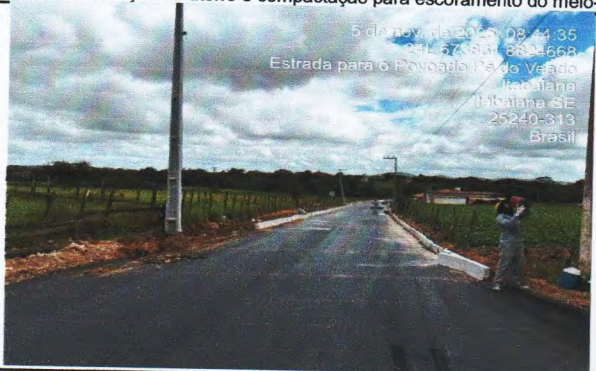

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
LOCAL DA OBRA: POVOADO PÉ DO VEADO- ITABAIANA-SE	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 227/2025	

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 11/10/2025 a 25/11/2025

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 13-Execução de assentamento do meio-fio



FOTO 14-Execução do aterro e compactação para o escoramento do meio-fio



FOTO 15-Execução do aterro e compactação para o escoramento do meio-fio



ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.12.19 07:58:55 -03'00'

Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego B.
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
