




PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 157/2024				 CONSTRUIR		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01 ADITIVO				ORDEN DE SERVIÇOS = 02/07/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA			PERÍODO: 16/04/2026 a 29/05/2026				DATA: 29/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06	COMPLEMENTO TRECHO 1							155.356,52	0,00	154.670,12	154.670,12	686,40	99,56
06.001	PAVIMENTAÇÃO							139.700,44	0,00	139.700,44	139.700,44	0,00	100,00
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.320,00		1.320,00	1.320,00	1,35	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	100,00
06.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	264,00		264,00	264,00	13,04	3.442,56	0,00	3.442,56	3.442,56	0,00	100,00
06.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.188,00		1.188,00	1.188,00	96,81	115.010,28	0,00	115.010,28	115.010,28	0,00	100,00
06.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	440,00		440,00	440,00	44,24	19.465,60	0,00	19.465,60	19.465,60	0,00	100,00
06.002	DRENAGEM SUPERFICIAL							13.429,68	-	13.429,68	13.429,68	-	100,00
06.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	132,00		132,00	132,00	101,74	13.429,68	0,00	13.429,68	13.429,68	0,00	100,00
06.003	SERVIÇOS FINAIS							2.226,40	-	1.540,00	1.540,00	686,40	69,17
06.003.001	Pintura de meio fio (calçada)	m	440,00		440,00	440,00	3,50	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	100,00
06.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.320,00			0,00	0,52	686,40	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00
Total geral								155.356,52	0,00	154.670,12	154.670,12	686,40	99,56
 Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)				MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO Nº 157/2024		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01 ADITIVO		ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA				PERÍODO: 16/04/2026 a 29/05/2026		DATA: 29/05/2026		
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO				
06	COMPLEMENTO TRECHO 1							
06.001	PAVIMENTAÇÃO							
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.320,00	> 220,00 x 6,00 = 1320,00m²				
06.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	264,00	> 1320,00 x 0,20 = 264,00m³				
06.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.188,00	> 220,00 x 5,40 = 1188,00m²				
06.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	440,00	> 220,00 x 2 = 440,00m				
06.002	DRENAGEM SUPERFICIAL							
03.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	132,00	> 220,00 x 0,60 = 132,00m²				
06.003	SERVIÇOS FINAIS							
06.003.001	Pintura de meio fio (calçada)	m	440,00	> 220,00 x 2 = 440,00m				
 Eng.º Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 271994232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____			Aprovado para pagamento Data: __/__/____			

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PERÍODO: 16/04/2026 A 29/05/2026

CONTRATO Nº 157/2024


ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024




PLACA DA OBRA



TERRAPLANAGEM

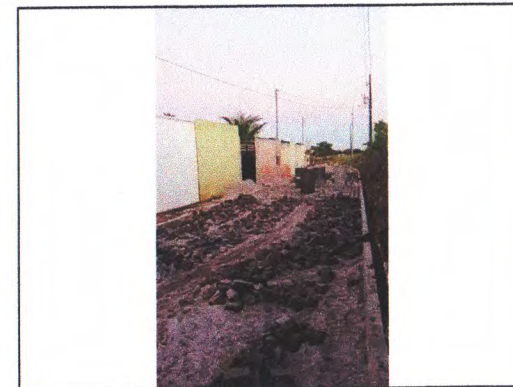


COLCHÃO DE AREIA E MEIO FIO

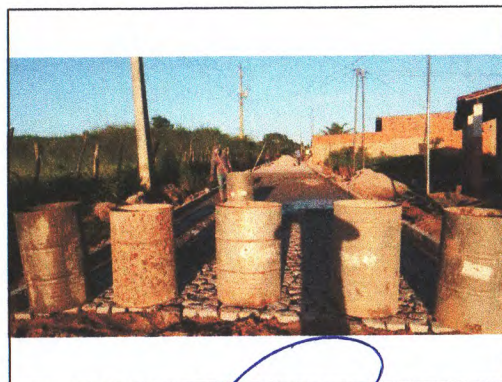

PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO



PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO E CAIAÇÃO

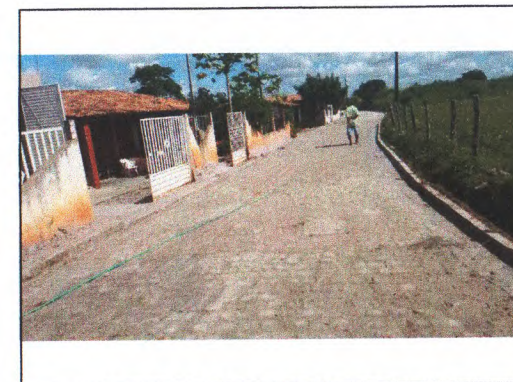

PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO
REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PERÍODO: 16/04/2026 A 29/05/2026

CONTRATO Nº 157/2024

ORDEN DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024



PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO E CAIAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO E CAIAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO E CAIAÇÃO




PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO E CAIAÇÃO




PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO E CAIAÇÃO




PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA, MEIO FIO E CAIAÇÃO


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719984232

ELABORADO POR:


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
