


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (LOTEAMENTO OSCAR NIEMEYER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2026				ORDEM DE SERVIÇO = 31/03/2026						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 01/04/2026 a 29/04/2026				DATA: 29/04/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							308.829,70	-	103.863,71	103.863,71	204.965,99	33,63
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	6000,00	0,00	2.007,50	2.007,50	50,11	R\$ 300.660,00	0,00	100.595,83	100.595,83	200.064,17	33,46
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	0,00	2,00	2,00	1633,94	R\$ 8.169,70	0,00	3.267,88	3.267,88	4.901,82	40,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 16.717,38	-	5.476,89	5.476,89	11.240,49	32,76
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,59	0,00	19,91	19,91	155,26	R\$ 9.407,20	0,00	3.091,23	3.091,23	6.315,97	32,86
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	121,19	0,00	39,55	39,55	60,32	R\$ 7.310,18	0,00	2.385,66	2.385,66	4.924,52	32,63
Total geral								325.547,08	0,00	109.340,60	109.340,60	216.206,48	33,59
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Eng.º Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2026.04.29 15:24:05 -03'00' Eng.º Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__		Aprovado para pagamento Data: __/__/__				


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (LOTEAMENTO OSCAR NIEMEYER)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 31/03/2026		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 01/04/2026 a 29/04/2026	DATA: 29/04/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	01/04/2026	AVENIDA CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	11,00	4,70	51,70
2	02/04/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	13,10	8,00	104,80
3	03/04/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,30	8,00	66,40
4	06/04/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,50	6,00	33,00
5	07/04/2026	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	45,00	4,80	216,00
6	08/04/2026	RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	19,30	3,00	57,90
7	09/04/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	12,00	3,00	36,00
8	10/04/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	15,00	4,50	67,50
9	13/04/2026	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	22,00	8,00	176,00
10	14/04/2026	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,00	1,50	4,50
11	15/04/2026	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	6,00	3,00	18,00
12	16/04/2026	ESTRADA DO AÇUDE	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,50	4,00	30,00
13	17/04/2026	ESTRADA DO AÇUDE	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	17,50	8,00	140,00
14	20/04/2026	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	19,00	8,00	152,00
15	21/04/2026	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	26,00	8,00	208,00
16	22/04/2026	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,00	4,50	31,50
17	23/04/2026	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	9,00	3,00	27,00
18	24/04/2026	RUA FRANCISCO PAES DA COSTA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	11,10	5,00	55,50
19	27/04/2026	RUA FRANCISCO PAES DA COSTA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	27,00	8,00	216,00
20	28/04/2026	RUA FRANCISCO PAES DA COSTA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	23,00	8,00	184,00
21	29/04/2026	RUA FELICIA DA GRAÇA COSTA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	15,60	7,00	109,20
22	29/04/2026	RUA FELICIA DA GRAÇA COSTA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,00	4,50	22,50
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						2.007,50

MAYKON DOUGLAS SANTOS
 Assinado de forma digital por
 MAYKON DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 SANTANA:06641211525
 525


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO OSCAR NIEMEYER)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026


AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE



RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA

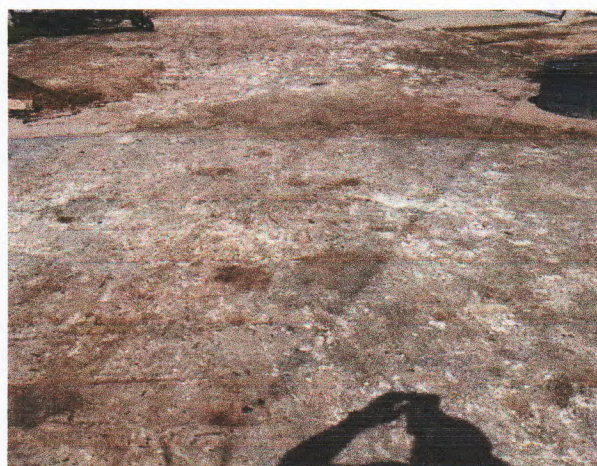

RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



Sheissica Bezeira de Macedo
Eng.(a) Civil - CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026

RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



ESTRADA DO AÇUDE



Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Rizla Márcia S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026

ESTRADA DO AÇUDE



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA FRANCISCO PAES DA COSTA



Sheissica Bezerra de Macedo
Eng. (a) Civil - CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026

RUA FRANCISCO PAES DA COSTA



RUA FRANCISCO PAES DA COSTA



RUA FELÍCIA DA GRAÇA COSTA





RUA FELÍCIA DA GRAÇA COSTA



MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2026.04.30
08:20:49 -03'00'


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Shelsyssa Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA - 272159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
