

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			CONTRATO		PERÍODO		ROLETIM DE		DATA		VALORES		SALDO			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				ACTMULADO ANTERIOR			PREÇO UNITARIO EM R\$		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$		DO PERÍODO EM R\$		ACUMULADO ATUAL EM R\$		VALOR CONTRATO (R\$)		QUANTIDADE RESTANTE		VALOR RESTANTE EM R\$	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACTMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITARIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 2.173,32							
01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES													2.173,32							
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 362,22	0,00	2.173,32	2.173,32	R\$ 2.173,32	0,00	0,00							
2 CASA DOS VIGIAS													R\$ 40.269,12							
02.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													6.178,21							
02.01.001	Demolição de reboco	m2	74,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 545,65	74,44	545,65							
02.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	34,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 583,26	34,35	583,26							
02.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	34,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 399,15	34,83	399,15							
02.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	15,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 327,78	15,21	327,78							
02.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 118,32	9,06	118,32							
02.01.006	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59							
02.01.007	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,49	3,00	50,49							
02.01.008	Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.321,60	60,00	3.321,60							
02.01.009	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 341,12	32,00	341,12							
02.01.010	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 380,70	30,00	380,70							
02.01.011	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41							
02.01.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,14	6,00	88,14							
02.02 COBERTURA													5.737,66							
02.02.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	388,80	60,00	388,80							
02.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2632,50	30,00	2.632,50							
02.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	1791,68	32,00	1.791,68							
02.02.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	9,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	177,08	9,50	177,08							
02.02.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	747,60	60,00	747,60							
02.03 REVESTIMENTO													3.569,90							
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	74,44	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	441,43	74,44	441,43							
02.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	46,32	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	1.197,37	46,32	1.197,37							
02.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	28,12	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	803,39	28,12	803,39							
02.03.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-, rejuntado, exclusive emboço	m2	34,35	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	1.127,71	34,35	1.127,71							
02.04 FORRO													782,53							
02.04.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	31,49	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	782,53	31,49	782,53							
02.05 PILARES													1.457,04							
02.05.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38							

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Gestor

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	001	19.06.2023	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
02.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14	
02.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56	
02.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	35,20	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	1.180,96	35,20	1.180,96	
02.06	PAVIMENTAÇÃO										2.109,31			
02.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	34,83	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	807,71	34,83	807,71	
02.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	34,83	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	1.301,60	34,83	1.301,60	
02.07	PASSEIO										563,38			
02.07.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	15,21	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	563,38	15,21	563,38	
02.08	ESQUADRIAS													
02.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										8.220,32			
02.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	2.811,16	2,00	2.811,16	
02.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	2.597,90	2,00	2.597,90	
02.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	1.217,35	1,00	1.217,35	
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusiva ferragens e vidros	m2	1,50	0,00	0,00	0,00	666,88	0,00	0,00	0,00	1.000,32	1,50	1.000,32	
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	2,00	0,00	0,00	0,00	160,82	0,00	0,00	0,00	321,64	2,00	321,64	
02.08.001.006	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	1,50	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	271,95	1,50	271,95	
02.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										658,07			
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	305,10	3,00	305,10	
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	1,00	134,41	
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	154,72	2,00	154,72	
02.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	63,84	4,00	63,84	
02.10	METAIS E LOUÇAS										1.431,46			
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	824,10	2,00	824,10	
02.10.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28	
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11	
02.10.004	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72	
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25	1,00	42,25	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Gestor


Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Eng. Bruno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obr: Reforma de Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
				967/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023	901		Valor do Contrato: R\$: 998.269,28				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				DO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	281,82	6,00	281,82	
03.03	COBERTURA										9.820,36			
03.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	79,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	513,22	79,20	513,22	
03.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	29,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2588,63	29,50	2.588,63	
03.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	44,47	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2489,88	44,47	2.489,88	
03.03.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	29,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	552,68	29,65	552,68	
03.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	295,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3675,95	295,02	3.675,95	
03.04	REVESTIMENTO										9.671,33			
03.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	198,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	1.174,14	198,00	1.174,14	
03.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	128,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	3.308,80	128,00	3.308,80	
03.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.999,90	70,00	1.999,90	
03.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	46,50	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	127,88	46,50	127,88	
03.04.005	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	90,18	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	2.960,61	90,18	2.960,61	
03.05	FORRO										3.955,62			
03.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 ps	m2	159,18	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	3.955,62	159,18	3.955,62	
03.06	PILARES										1.457,04			
03.06.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38	
03.06.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14	
03.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56	
03.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	35,20	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	1.180,96	35,20	1.180,96	
03.07	PAVIMENTAÇÃO										4.608,22			
03.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	199,28	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	3.716,57	199,28	3.716,57	
03.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,80	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	553,08	14,80	553,08	
03.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	14,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	338,57	14,60	338,57	
03.08	PASSEIO										2.335,74			
03.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	63,06	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	2.335,74	63,06	2.335,74	
03.09	ESQUADRIAS													
03.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										17.143,77			
03.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	7.027,90	5,00	7.027,90	
03.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	5.195,80	4,00	5.195,80	



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Gestor

Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									001		Valor de Contrato: R\$: 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	1.217,35	1,00	1.217,35	
03.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 28,5mm, cromada (ou similar)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	609,64	4,00	609,64	
03.09.001.005	Porta em madeira de lei mairacatiara com almofadas	M2	4,32	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	1.621,08	4,32	1.621,08	
03.09.001.006	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	1.083,32	4,00	1.083,32	
03.09.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	12,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	388,68	12,00	388,68	
03.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										10.403,72			
03.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	27,49	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	7.690,88	27,49	7.690,88	
03.09.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	5,20	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	1.876,84	5,20	1.876,84	
03.09.002.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,74	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	836,00	3,74	836,00	
03.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.862,48			
03.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	9,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	915,30	9,00	915,30	
03.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	464,16	6,00	464,16	
03.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	403,23	3,00	403,23	
03.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	5,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	79,80	5,00	79,80	
03.11	METAIS E LOUÇAS										3.563,84			
03.11.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	762,84	3,00	762,84	
03.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	1.236,15	3,00	1.236,15	
03.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	3,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	875,16	3,00	875,16	
03.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	57,33	3,00	57,33	
03.11.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	126,75	3,00	126,75	
03.11.006	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	265,47	3,00	265,47	
03.11.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	3,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	317,49	3,00	317,49	
03.11.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	3,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	322,65	3,00	322,65	
03.12	PINTURAS													
03.12.001	PINTURA INTERNA										16.039,11			
03.12.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	342,29	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	2.645,90	342,29	2.645,90	
03.12.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	342,29	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	6.051,69	342,29	6.051,69	



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Gestor

Tháisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Eng. Bruno de Assis Pinto
 Engª Civil - CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Eng. Bruno de Assis Pinto
 Engª Civil - CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDIDAÇÃO Nº	19.06.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
											001	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			VALORES					SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	501,47	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	7.341,52	501,47	7.341,52	
03.12.002	PINTURA EXTERNA										8.793,46			
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	262,10	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	8.793,46	262,10	8.793,46	
03.12.003	ESQUADRIAS										3.839,38			
03.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,83	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	510,12	27,83	510,12	
03.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	49,65	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	825,18	49,65	825,18	
03.12.003.002.001	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zorca), duas demãos	m2	77,96	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	1.291,80	77,96	1.291,80	
03.12.003.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	77,96	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	1.212,28	77,96	1.212,28	
03.13	DIVERSOS										687,37			
03.13.001	Limpeza geral	m2	295,01	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	687,37	295,01	687,37	
4	LABORATÓRIO										R\$ 115.231,01			
04.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										22.254,02			
04.01.001	Demolição de reboco	m2	173,63	0,00	173,63	173,63	R\$ 7,33	0,00	1.272,71	1.272,71	R\$ 1.272,71	0,00	0,00	
04.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	23,70	0,00	23,70	23,70	R\$ 16,98	0,00	402,43	402,43	R\$ 402,43	0,00	0,00	
04.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	6,38	0,00	6,38	6,38	R\$ 11,46	0,00	73,11	73,11	R\$ 73,11	0,00	0,00	
04.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	61,89	0,00	61,89	61,89	R\$ 21,55	0,00	1.333,73	1.333,73	R\$ 1.333,73	0,00	0,00	
04.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	82,50	0,00	82,50	82,50	R\$ 4,87	0,00	401,78	401,78	R\$ 401,78	0,00	0,00	
04.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	63,91	0,00	63,91	63,91	R\$ 13,06	0,00	834,66	834,66	R\$ 834,66	0,00	0,00	
04.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,24	0,00	3,24	3,24	R\$ 15,14	0,00	49,05	49,05	R\$ 49,05	0,00	0,00	
04.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 11,59	0,00	23,18	23,18	R\$ 23,18	0,00	0,00	
04.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 10,41	0,00	31,23	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00	
04.01.010	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 16,83	0,00	16,83	16,83	R\$ 16,83	0,00	0,00	
04.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	301,83	0,00	301,83	301,83	R\$ 55,36	0,00	16.709,31	16.709,31	R\$ 16.709,31	0,00	0,00	
04.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,24	0,00	40,24	40,24	R\$ 10,66	0,00	428,96	428,96	R\$ 428,96	0,00	0,00	
04.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,20	0,00	30,20	30,20	R\$ 12,69	0,00	383,24	383,24	R\$ 383,24	0,00	0,00	
04.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	0,00	20,00	20,00	R\$ 14,69	0,00	293,80	293,80	R\$ 293,80	0,00	0,00	
04.02	ELEVAÇÃO										316,95			
04.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,28	0,00	1,28	1,28	R\$ 36,98	0,00	47,33	47,33	47,33	0,00	0,00	
04.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,28	0,00	1,28	1,28	R\$ 5,93	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	0,00	
04.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,28	0,00	1,28	1,28	R\$ 28,57	0,00	36,57	36,57	36,57	0,00	0,00	
04.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,80	0,00	4,80	4,80	R\$ 46,97	0,00	225,46	225,46	225,46	0,00	0,00	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Gestor


Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CREA/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ: 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDIÇÃO Nº	19.06.2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									001		Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
04.03	COBERTURA											9.657,52		
04.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	76,16	0,00	76,16	76,16	R\$ 6,48	0,00	493,52	493,52	493,52	493,52	0,00	0,00
04.03.002	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	26,83	0,00	26,83	26,83	R\$ 18,64	0,00	500,11	500,11	500,11	500,11	0,00	0,00
04.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,20	0,00	30,20	30,20	R\$ 87,75	0,00	2.650,05	2.650,05	2.650,05	2.650,05	0,00	0,00
04.03.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,24	0,00	40,24	40,24	R\$ 55,99	0,00	2.253,04	2.253,04	2.253,04	2.253,04	0,00	0,00
04.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	301,83	0,00	301,83	301,83	R\$ 12,46	0,00	3.760,80	3.760,80	3.760,80	3.760,80	0,00	0,00
04.04	REVESTIMENTO											7.326,32		
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	173,63	0,00	173,63	173,63	5,93	0,00	1.029,63	1.029,63	1.029,63	1.029,63	0,00	0,00
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	108,97	0,00	108,97	108,97	25,85	0,00	2.816,87	2.816,87	2.816,87	2.816,87	0,00	0,00
04.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	64,66	0,00	64,66	64,66	28,57	0,00	1.847,34	1.847,34	1.847,34	1.847,34	0,00	0,00
04.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	23,70	0,00	23,70	23,70	2,75	0,00	65,18	65,18	65,18	65,18	0,00	0,00
04.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	47,74	0,00	47,74	47,74	32,83	0,00	1.567,30	1.567,30	1.567,30	1.567,30	0,00	0,00
04.05	FORRO											4.355,46		
04.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017 ps	m2	175,27	0,00	175,27	175,27	24,85	0,00	4.355,46	4.355,46	4.355,46	4.355,46	0,00	0,00
04.06	PILARES											1.005,09		
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,50	0,00	5,50	5,50	5,93	0,00	32,62	32,62	32,62	32,62	0,00	0,00
04.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,50	0,00	5,50	5,50	28,57	0,00	157,14	157,14	157,14	157,14	0,00	0,00
04.06.003	Demolição de reboco	m2	5,50	0,00	5,50	5,50	7,33	0,00	40,32	40,32	40,32	40,32	0,00	0,00
04.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,10	0,00	23,10	23,10	33,55	0,00	775,01	775,01	775,01	775,01	0,00	0,00
04.07	PAVIMENTAÇÃO											4.167,66		
04.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	202,75	0,00	202,75	202,75	18,65	0,00	3.781,29	3.781,29	3.781,29	3.781,29	0,00	0,00
04.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm. Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,38	0,00	6,38	6,38	37,37	0,00	238,42	238,42	238,42	238,42	0,00	0,00
04.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	6,38	0,00	6,38	6,38	23,19	0,00	147,95	147,95	147,95	147,95	0,00	0,00
04.08	PASSEIO											2.292,41		
04.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	61,89	0,00	61,89	61,89	37,04	0,00	2.292,41	2.292,41	2.292,41	2.292,41	0,00	0,00
04.09	ESQUADRIAS											28.116,27		
04.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA											28.116,27		
04.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	4,00	4,00	1.405,58	0,00	5.622,32	5.622,32	5.622,32	5.622,32	0,00	0,00
04.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.298,95	0,00	1.298,95	1.298,95	1.298,95	1.298,95	0,00	0,00
04.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00	0,00	4,00	4,00	1.217,35	0,00	4.869,40	4.869,40	4.869,40	4.869,40	0,00	0,00


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Gestor

Thaísa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Outra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Abreu dos Santos			
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Valor do Contrato: R\$: 998.269,28			
									001					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
04.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	2,00	0,00	2,00	2,00	152,41	0,00	304,82	304,82	304,82	0,00	0,00	
04.09.001.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	49,00	0,00	49,00	49,00	279,77	0,00	13.708,73	13.708,73	13.708,73	0,00	0,00	
04.09.001.006	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	M2	4,20	0,00	4,20	4,20	375,25	0,00	1.576,05	1.576,05	1.576,05	0,00	0,00	
04.09.001.007	Batente em madeira de lei l = 0.14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	270,83	0,00	541,66	541,66	541,66	0,00	0,00	
04.09.001.008	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	6,00	0,00	6,00	6,00	32,39	0,00	194,34	194,34	194,34	0,00	0,00	
04.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										9.176,46			
04.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	32,80	0,00	32,80	32,80	279,77	0,00	9.176,46	9.176,46	9.176,46	0,00	0,00	
04.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										894,18			
04.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	0,00	4,00	4,00	101,70	0,00	406,80	406,80	406,80	0,00	0,00	
04.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	0,00	2,00	2,00	77,36	0,00	154,72	154,72	154,72	0,00	0,00	
04.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	0,00	2,00	2,00	134,41	0,00	268,82	268,82	268,82	0,00	0,00	
04.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	0,00	4,00	4,00	15,96	0,00	63,84	63,84	63,84	0,00	0,00	
04.11	METAIS E LOUÇAS										1.655,41			
04.11.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	0,00	2,00	2,00	254,28	0,00	508,56	508,56	508,56	0,00	0,00	
04.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	824,10	2,00	824,10	
04.11.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	38,22	2,00	38,22	
04.11.004	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	176,98	2,00	176,98	
04.11.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	107,55	0,00	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00	
04.12	PINTURAS													
04.12.001	PINTURA INTERNA										10.764,91			
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	323,43	0,00	323,43	323,43	10,71	0,00	3.463,94	3.463,94	3.463,94	0,00	0,00	
04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	498,70	0,00	450,00	450,00	14,64	0,00	6.588,00	6.588,00	7.300,97	48,70	712,97	
04.12.002	PINTURA EXTERNA										8.516,67			
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	253,85	0,00	150,00	150,00	33,55	0,00	5.032,50	5.032,50	8.516,67	103,85	3.484,17	
04.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS										4.028,42			
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	99,95	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.661,17	99,95	1.661,17	


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Abreu dos Santos			
							901		Valor do Contrato: R\$: 998.260,28					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			VALORES						SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE REstante	VALOR REstante EM R\$	
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demãos	m2	73,70	0,00	73,70	0,00	16,57	0,00	1.221,21	1.221,21	1.221,21	73,70	0,00	
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	73,70	0,00	73,70	0,00	15,55	0,00	1.146,04	1.146,04	1.146,04	73,70	0,00	
04.13	DIVERSOS										703,26			
04.13.001	Limpeza geral	m2	301,83	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	703,26	301,83	703,26	
5	SALAS DE AULAS										R\$ 134.836,86			
05.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										36.109,59			
05.01.001	Demolição de reboco	m2	238,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.750,92	238,87	1.750,92	
05.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	196,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.336,57	196,50	3.336,57	
05.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	101,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.177,41	101,04	2.177,41	
05.01.004	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	225,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 387,00	225,00	387,00	
05.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 125,38	9,60	125,38	
05.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	484,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 26.821,92	484,50	26.821,92	
05.01.007	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 454,86	42,67	454,86	
05.01.008	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	48,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 614,83	48,45	614,83	
05.01.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 440,70	30,00	440,70	
05.02	ELEVAÇÃO										396,19			
05.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	9,49	1,60	9,49	
05.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	59,17	1,60	59,17	
05.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	45,71	1,60	45,71	
05.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	281,82	6,00	281,82	
05.03	COBERTURA										13.699,33			
05.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	4251,49	48,45	4.251,49	
05.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2389,09	42,67	2.389,09	
05.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31	
05.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	491,57	75,86	491,57	
05.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	484,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	6036,87	484,50	6.036,87	
05.04	REVESTIMENTO										19.799,15			
05.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	238,87	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	1.416,50	238,87	1.416,50	
05.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	238,87	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	6.824,52	238,87	6.824,52	
05.04.003	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	196,50	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	540,38	196,50	540,38	
05.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	335,60	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	11.017,75	335,60	11.017,75	
05.05	FORRO										5.591,25			

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Breno Beiriz Pinto
CREA/SE 271823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Abreu dos Santos			
									001	Valor do Contrato: R\$: 998.269,28				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
05.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017_ps	m2	225,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	5.591,25	225,00	5.591,25	
05.06	PILARES										975,70			
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	21,35	3,60	21,35	
05.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	102,85	3,60	102,85	
05.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,38	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	851,50	25,38	851,50	
05.07	PASSEIO										3.742,52			
05.07.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	101,04	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	3.742,52	101,04	3.742,52	
05.08	ESQUADRIAS													
05.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										7.027,90			
05.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	7.027,90	5,00	7.027,90	
05.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										3.985,48			
05.08.002.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	34,00	0,00	0,00	0,00	117,22	0,00	0,00	0,00	3.985,48	34,00	3.985,48	
05.09	PINTURAS													
05.09.001	PINTURA EXTERNA										36.994,09			
05.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	8,40	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	119,62	8,40	119,62	
05.09.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1099,09	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	36.874,47	1.099,09	36.874,47	
05.09.002	ESQUADRIAS										349,02			
05.09.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	21,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	349,02	21,00	349,02	
05.09.003	PINTURA DE FORRO										5.037,75			
05.09.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	225,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	5.037,75	225,00	5.037,75	
05.10	DIVERSOS										1.128,89			
05.10.001	Limpeza geral	m2	484,50	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	1.128,89	484,50	1.128,89	
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO										R\$ 133.734,74			
06.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										24.518,67			
06.01.001	Demolição de reboco	m2	87,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 642,84	87,70	642,84	
06.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	286,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.861,71	286,32	4.861,71	
06.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.705,02	148,78	1.705,02	
06.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	70,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.523,59	70,70	1.523,59	
06.01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,39	0,40	12,39	
06.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	28,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 376,91	28,86	376,91	
06.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	132,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 227,81	132,45	227,81	
06.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 115,90	10,00	115,90	
06.01.009	Remoção de lavatório	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,05	5,00	52,05	


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Gestor

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
				067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDIDAÇÃO Nº	19.06.2023	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
06.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.551,02	244,78	13.551,02	
06.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 434,93	40,80	434,93	
06.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	24,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 310,65	24,48	310,65	
06.01.013	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 336,60	20,00	336,60	
06.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 367,25	25,00	367,25	
06.02	ELEVAÇÃO										396,19			
06.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	59,17	1,60	59,17	
06.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	9,49	1,60	9,49	
06.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	45,71	1,60	45,71	
06.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	281,82	6,00	281,82	
06.03	COBERTURA										9.638,76			
06.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2148,12	24,48	2.148,12	
06.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2284,39	40,80	2.284,39	
06.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	27,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	507,01	27,20	507,01	
06.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	73,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	474,34	73,20	474,34	
06.03.005	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,26	0,00	0,00	0,00	4224,90	244,78	4.224,90	
06.04	REVESTIMENTO										19.245,81			
06.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	87,70	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	520,06	87,70	520,06	
06.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	20,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	300,12	20,50	300,12	
06.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,20	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.919,90	67,20	1.919,90	
06.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	286,32	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	787,38	286,32	787,38	
06.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	478,78	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	15.718,35	478,78	15.718,35	
06.05	FORRO										3.697,18			
06.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	3.697,18	148,78	3.697,18	
06.06	PILARES										1.220,85			
06.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14	
06.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56	
06.06.003	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38	



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Gestor

Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDIDAÇÃO Nº	19.06.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor de Contrato: R\$: 998.269,28	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
06.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	28,16	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	944,77	28,16	944,77	
06.07	PAVIMENTAÇÃO										9.785,96			
06.07.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.450,21	148,78	3.450,21	
06.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm. Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	5.559,91	34,83	5.559,91	
06.07.003	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	41,60	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	775,84	41,60	775,84	
06.08	PASSEIO										2.618,73			
06.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	70,70	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	2.618,73	70,70	2.618,73	
06.09	ESQUADRIAS													
06.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										28.624,55			
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	5.622,32	4,00	5.622,32	
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	3.896,85	3,00	3.896,85	
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 1,60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	21,00	0,00	0,00	0,00	852,26	0,00	0,00	0,00	17.897,46	21,00	17.897,46	
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (máquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, máquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	21,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	1.207,92	21,00	1.207,92	
06.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										4.784,07			
06.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	17,10	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	4.784,07	17,10	4.784,07	
06.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ESGOTO										5.250,98			
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	24,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	2.440,80	24,00	2.440,80	
06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	1.083,04	14,00	1.083,04	
06.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	1.344,10	10,00	1.344,10	
06.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af. 08/2022	un	24,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	383,04	24,00	383,04	
06.11	METAIS E LOUÇAS										9.409,90			
06.11.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	5,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	2.060,25	5,00	2.060,25	
06.11.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	10,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	2.542,80	10,00	2.542,80	
06.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	2.625,48	9,00	2.625,48	
06.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	10,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	191,10	10,00	191,10	
06.11.005	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	442,45	5,00	442,45	



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Gestor

Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			VALORES				SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							Contrato: Prefeitura de Itabaiana/SE CONTRATO: 067/2023 PERÍODO: 02.05.2023 a 16.06.2023 BOLETIM DE: 19.06.2023 DATA: MEDICÇÃO Nº: 001 Valor do Contrato: R\$. 999.240,28				Obra: Reforma de Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
06.11.006	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	9,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	380,25	9,00	380,25
06.11.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10
06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	952,47	9,00	952,47
06.12 PINTURAS													
06.12.001 PINTURA DE FORRO													
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	3.331,18	148,78	3.331,18
06.12.002 PINTURA EXTERNA													
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	274,88	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.222,22	274,88	9.222,22
06.12.003 PINTURAS ESQUADRIAS													
06.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	119,33	6,51	119,33
06.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	78,22	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.300,02	78,22	1.300,02
06.13 DIVERSOS													
06.13.001	Limpeza geral	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	570,34	244,78	570,34
7 REFEITÓRIO/COZINHA													
07.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
07.01.001	Demolição de reboco	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 491,11	67,00	491,11
07.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.636,15	155,25	2.636,15
07.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	23,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 266,56	23,26	266,56
07.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	178,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.679,15	178,34	3.679,15
07.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.099,70	51,03	1.099,70
07.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 172,78	13,23	172,78
07.01.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,56	14,90	72,56
07.01.008	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	12,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 186,52	12,32	186,52
07.01.009	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59
07.01.010	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41
07.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.937,79	269,83	14.937,79
07.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 454,86	42,67	454,86
07.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 341,36	26,90	341,36
07.01.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,15	5,00	84,15
07.01.015	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,35	15,00	220,35
07.02 ELEVAÇÃO													
07.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	2,85	0,48	2,85



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Gestor


Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Eng. Bruno Beiriz Pinto
 CREA 271623 8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEÇÃO Nº	19.06.2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prof. João Alves dos Santos			
											001	Valor do Contrato: R\$. 998.260,28		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
07.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	17,75	0,48	17,75	
07.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	13,71	0,48	13,71	
07.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	93,94	2,00	93,94	
07.03	COBERTURA										9.132,50			
07.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2360,48	26,90	2.360,48	
07.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2389,09	42,67	2.389,09	
07.03.003	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	490,54	75,70	490,54	
07.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31	
07.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3362,08	269,83	3.362,08	
07.04	REVESTIMENTO										14.184,95			
07.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	397,31	67,00	397,31	
07.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.914,19	67,00	1.914,19	
07.04.003	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	426,94	155,25	426,94	
07.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	348,66	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	11.446,51	348,66	11.446,51	
07.05	FORRO										1.006,05			
07.05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	1.006,05	14,90	1.006,05	
07.06	PAVIMENTAÇÃO										12.208,89			
07.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	4.675,10	201,60	4.675,10	
07.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm. Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	7.533,79	201,60	7.533,79	
07.07	PASSEIO										2.009,88			
07.07.001	Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	1.605,40	51,03	1.605,40	
07.07.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	10,92	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	404,48	34,83	404,48	
07.08	ESQUADRIAS													
07.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										11.160,33			
07.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.346,58	0,00	0,00	0,00	2.693,16	2,00	2.693,16	
07.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.633,74	0,00	0,00	0,00	3.267,48	2,00	3.267,48	
07.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	1.298,95	1,00	1.298,95	
07.08.001.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	2.434,70	2,00	2.434,70	
07.08.001.005	Porta em madeira de lei muiçacatiara com almofadas	M2	2,52	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	945,63	2,52	945,63	



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Gestor Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



 Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			VALORES						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							Valor do Contrato: R\$. 998.269,28						
							6.602,04						
07.08.001.006	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41	1,00	152,41
07.08.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	3,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	97,17	3,00	97,17
07.08.001.008	Batente em madeira de lei l = 0.14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83	1,00	270,83
07.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										6.602,04		
07.08.002.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	16,80	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	1.601,21	17,10	1.601,21
07.08.002.002	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	782,36	17,10	782,36
07.08.002.003	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	3,36	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	609,17	17,10	609,17
07.08.002.004	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	3.609,30	10,00	3.609,30
07.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.195,25		
07.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	610,20	6,00	610,20
07.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	386,80	5,00	386,80
07.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	1,00	134,41
07.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	un	4,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	63,84	4,00	63,84
07.10	METAIS E LOUÇAS										3.004,43		
07.10.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28
07.10.002	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72
07.10.003	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação, af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	1,00	412,05
07.10.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11
07.10.005	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	88,49	1,00	88,49
07.10.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	0,00	0,00	0,00	1.617,85	1,00	1.617,85
07.10.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, af 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	105,83	1,00	105,83
07.10.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10
07.11	PINTURAS										218,14		
07.11.001	PINTURA DE FORRO										218,14		
07.11.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	218,14	14,90	218,14
07.11.002	ESQUADRIAS										1.580,42		
07.11.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	419,85	27,00	419,85



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Eng. Bruno Beiriz Pinto
 CREA/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contrato: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Valor de Contrato: R\$. 998.269,28				
									001						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES			SALDO	
				DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL						ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
09.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.074,44	380,68	21.074,44		
09.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 678,30	63,63	678,30		
09.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 482,98	38,06	482,98		
09.02	COBERTURA										12.776,51				
09.02.001	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	4743,27	380,68	4.743,27		
09.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	3339,77	38,06	3.339,77		
09.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	3562,64	63,63	3.562,64		
09.02.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	30,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	572,25	30,70	572,25		
09.02.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	86,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	558,58	86,20	558,58		
09.03	REVESTIMENTO										5.932,22				
09.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	940,20	158,55	940,20		
09.03.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	4.529,77	158,55	4.529,77		
09.03.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,50	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	462,25	12,50	462,25		
09.04	PILARES										1.161,80				
09.04.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38		
09.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14		
09.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56		
09.04.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	26,40	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	885,72	26,40	885,72		
09.05	PAVIMENTAÇÃO										13.296,75				
09.05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.941,60	169,97	3.941,60		
09.05.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	9.355,15	169,97	9.355,15		
09.06	PASSEIO										5.938,70				
09.06.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	130,09	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	4.092,63	130,09	4.092,63		
09.06.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	49,84	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	1.846,07	34,83	1.846,07		
09.07	ESQUADRIAS METÁLICAS										8.462,50				
09.08	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	1,98	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	442,59	1,98	442,59		
09.08.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,80	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	223,82	0,80	223,82		
09.08.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	21,60	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	7.796,09	21,60	7.796,09		


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Haisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA/SE 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETEM DE	DATA	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves das Santas			
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023				
									001	Valor de Contrato: R\$: 998.269,28				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
09.09	PINTURAS													
09.09.001	PINTURA INTERNA											9.519,43		
09.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	5.497,61	375,52	5.497,61	
09.09.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	4.021,82	375,52	4.021,82	
09.09.002	PINTURA EXTERNA											6.617,40		
09.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	197,24	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	6.617,40	197,24	6.617,40	
09.09.004	ESQUADRIAS											1.850,11		
09.09.005	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	954,43	57,60	954,43	
09.09.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	895,68	57,60	895,68	
09.10	DIVERSOS											987,08		
09.10.001	Limpeza geral	m2	423,64	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	987,08	423,64	987,08	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 130.222,90		
10.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.01.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO											2.879,62		
10.01.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 414,30	15,00	414,30	
10.01.001.002	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,75	5,00	52,75	
10.01.001.004	Cabeçote de alumínio de 2"	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	2,00	37,06	
10.01.001.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	1,00	413,84	
10.01.001.006	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.001.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,60	60,00	1.374,60	
10.01.001.009	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	1,00	487,78	
10.01.002	QD1 - ADMINISTRATIVO											22.984,62		
10.01.002.001	RAMAL DE ENTRADA											2.574,48		
10.01.002.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	156,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.575,60	156,00	1.575,60	
10.01.002.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	39,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 816,66	39,00	816,66	
10.01.002.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.002.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,85	13,00	57,85	
10.01.002.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.002.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.002.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.002.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											1.578,01		

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabiana

Gestor

Thaís Lima Santos Eng. Breno de Assis Pinto
Engª Civil - CREA 2717391991 CREA 2721466399SE
Coordenadora de Núcleo SBP CONSTRUÇÕES
Prefeitura Municipal de Itabiana CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CRO/SE 471823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				SBP			Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE		ROLETIM DE	DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	001		Valor do Contrato: R\$: 998.269,25		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)		
10.01.002.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34
10.01.002.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.002.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16
10.01.002.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,94	1,00	88,94
10.01.002.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.002.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 253,30	5,00	253,30
10.01.002.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,25	5,00	61,25
10.01.002.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.002.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										18.832,13		
10.01.002.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.706,91	23,00	3.706,91
10.01.002.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.334,16	8,00	1.334,16
10.01.002.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.204,20	10,00	1.204,20
10.01.002.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w/ bivolt	un	36,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.632,04	36,00	3.632,04
10.01.002.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w/ bivolt - Rev 01	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.273,32	12,00	1.273,32
10.01.002.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 411,60	4,00	411,60
10.01.002.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	33,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.269,90	33,00	7.269,90
10.01.003	QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO										21.197,79		
10.01.003.001	RAMAL DE ENTRADA										3.012,76		
10.01.003.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	184,00	0,00	184,00	184,00	R\$ 10,10	0,00	1.858,40	1.858,40	R\$ 1.858,40	0,00	0,00
10.01.003.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	46,00	0,00	46,00	46,00	R\$ 20,94	0,00	963,24	963,24	R\$ 963,24	0,00	0,00
10.01.003.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 4,69	0,00	23,45	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.003.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15,00	0,00	15,00	15,00	R\$ 4,45	0,00	66,75	66,75	R\$ 66,75	0,00	0,00
10.01.003.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 14,96	0,00	14,96	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.003.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 18,62	0,00	37,24	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.003.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-85/2 95 mm²	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 12,18	0,00	48,72	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.003.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.455,38		
10.01.003.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 612,34	0,00	612,34	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor
Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaiana/SE		BOLETIM DE		DATA		VALORES	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				ACUMULADO			CONTRATO		PERÍODO		MEDIÇÃO Nº		Valor do Contrato: R\$. 998.269,28	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.003.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 88,94	0,00	88,94	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00	
10.01.003.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 119,15	0,00	357,45	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00	
10.01.003.002.006	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 47,64	0,00	95,28	95,28	R\$ 95,28	0,00	0,00	
10.01.003.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 47,64	0,00	47,64	47,64	R\$ 47,64	0,00	0,00	
10.01.003.002.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 12,25	0,00	49,00	49,00	R\$ 49,00	0,00	0,00	
10.01.003.002.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 40,45	0,00	40,45	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
10.01.003.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										16.729,65			
10.01.003.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 161,17	0,00	805,85	805,85	R\$ 805,85	0,00	0,00	
10.01.003.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	0,00	18,00	18,00	R\$ 166,77	0,00	3.001,86	3.001,86	R\$ 3.001,86	0,00	0,00	
10.01.003.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 120,42	0,00	1.083,78	1.083,78	R\$ 1.083,78	0,00	0,00	
10.01.003.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 106,11	0,00	954,99	954,99	R\$ 954,99	0,00	0,00	
10.01.003.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	23,00	0,00	23,00	23,00	R\$ 100,89	0,00	2.320,47	2.320,47	R\$ 2.320,47	0,00	0,00	
10.01.003.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca C-light ou similar	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 102,90	0,00	411,60	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00	
10.01.003.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	37,00	0,00	37,00	37,00	R\$ 220,30	0,00	8.151,10	8.151,10	R\$ 8.151,10	0,00	0,00	
10.01.004	QD3 - SALAS DE AULA										29.932,64			
10.01.004.001	RAMAL DE ENTRADA										3.585,61			
10.01.004.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	208,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.292,16	208,00	2.292,16	
10.01.004.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	52,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.088,88	52,00	1.088,88	
10.01.004.001.003	Fita em aço inox, fusítec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.004.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 80,10	18,00	80,10	
10.01.004.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.004.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.004.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.004.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.321,14			
10.01.004.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.004.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.004.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.004.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12	


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Gestor
Márcia Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CRO/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE		BOLETIM DE	DATA	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Valor de Contrato: R\$. 998.269,28			
						067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	001	Valor de Contrato: R\$. 998.269,28				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)		
10.01.004.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.004.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,50	6,00	73,50
10.01.004.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.004.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										25.025,89		
10.01.004.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.669,56	28,00	4.669,56
10.01.004.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94
10.01.004.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	61,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.438,30	61,00	13.438,30
10.01.004.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	54,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.448,06	54,00	5.448,06
10.01.004.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 318,33	3,00	318,33
10.01.004.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 308,70	3,00	308,70
10.01.005	QD4 - REFEITÓRIO										18.125,48		
10.01.005.001	RAMAL DE ENTRADA										2.054,45		
10.01.005.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	116,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.278,32	116,00	1.278,32
10.01.005.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,26	29,00	607,26
10.01.005.001.003	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.005.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,50	10,00	44,50
10.01.005.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96
10.01.005.001.006	Cuiva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24
10.01.005.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.005.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.529,97		
10.01.005.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34
10.01.005.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.005.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16
10.01.005.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12
10.01.005.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.005.002.006	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	1,00	233,33
10.01.005.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00
10.01.005.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.005.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										14.541,06		



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Gestor Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA 27214663995E
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



 Eng. Bruno de Assis Pinto
 CREA 27214663995E
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDICÃO Nº	19.06.2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Abreu dos Santos			
									001		Valor de Contrato: R\$: 999.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.005.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.502,17	21,00	3.502,17	
10.01.005.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.445,04	12,00	1.445,04	
10.01.005.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.609,00	30,00	6.609,00	
10.01.005.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.412,46	14,00	1.412,46	
10.01.005.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 954,99	9,00	954,99	
10.01.005.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40	
10.01.006	QD5 - VESTIÁRIO										13.666,14			
10.01.006.001	RAMAL DE ENTRADA										2.852,49			
10.01.006.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	164,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.807,28	164,00	1.807,28	
10.01.006.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	41,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 858,54	41,00	858,54	
10.01.006.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,30	14,00	62,30	
10.01.006.001.004	Fita em aço inox, fusímeq ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.006.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.006.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.006.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.167,48			
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 499,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 499,96	1,00	499,96	
10.01.006.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.006.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	1,00	68,59	
10.01.006.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.006.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,75	3,00	36,75	
10.01.006.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.006.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										9.646,17			
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,52	6,00	722,52	
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 644,68	4,00	644,68	
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	26,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.727,80	26,00	5.727,80	


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Anaísa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46
 Aq. Bruno Beiriz Pinto
 Criciúba/SC 13080-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiara/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDIÇÃO Nº	19.06.2023	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
							001		VALORES		BALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.006.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.715,13	17,00	1.715,13	
10.01.006.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 424,44	4,00	424,44	
10.01.006.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 411,60	4,00	411,60	
10.01.007	QD6 - ABRIGO										14.827,57			
10.01.007.001	RAMAL DE ENTRADA										1.846,53			
10.01.007.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,84	92,00	1.013,84	
10.01.007.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 481,62	23,00	481,62	
10.01.007.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,70	6,00	26,70	
10.01.007.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.007.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.007.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.007.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.007.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.496,12			
10.01.007.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.007.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.007.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.007.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	1,00	79,97	
10.01.007.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.007.002.006	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europau - linha branca), curva C, corrente SKA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,63	3,00	192,63	
10.01.007.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00	
10.01.007.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.007.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										11.684,92			
10.01.007.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.901,06	18,00	2.901,06	
10.01.007.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af. 01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94	
10.01.007.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível santonado embutido Ø 3/4"	un	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.507,50	25,00	5.507,50	
10.01.007.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.816,02	18,00	1.816,02	
10.01.007.003.005	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40	
10.01.008	QD7 - CASA DE APOIO										6.609,04			
10.01.008.001	RAMAL DE ENTRADA										926,01			
10.01.008.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	56,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,12	56,00	617,12	


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiara


 Gestor
 Anaísa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiara

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 A. Q. Bruno Beiriz Pinto
 CREA/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETEM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos				
							067/2023	02.05.2023 a 16.06.2023	MEDIÇÃO Nº	19.06.2023	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28				
									001						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	VALORES			SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE
10.01.008.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 185,22	14,00	185,22		
10.01.008.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,60	5,00	15,60		
10.01.008.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45		
10.01.008.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96		
10.01.008.001.006	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,47	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	2,00	20,94		
10.01.008.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72		
10.01.008.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										398,06				
10.01.008.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	1,00	143,09		
10.01.008.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/lampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12		
10.01.008.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16		
10.01.008.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,49	1,00	13,49		
10.01.008.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,75	3,00	36,75		
10.01.008.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45		
10.01.008.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										5.284,97				
10.01.008.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.289,36	8,00	1.289,36		
10.01.008.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 602,10	5,00	602,10		
10.01.008.003.003	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 237,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 237,23	1,00	237,23		
10.01.008.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.203,00	10,00	2.203,00		
10.01.008.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 742,77	7,00	742,77		
10.01.008.003.006	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 210,51	3,00	210,51		
11	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO/CAIXAS										54.131,26				
11.01	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO										50.140,16				
11.01.001	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.180,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.180,40	1,00	23.180,40		
11.01.002	Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x h=1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes), af 12/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.675,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.675,09	1,00	12.675,09		
11.01.003	Sumidouro paredes com tijolo maciço (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h=3,55m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.284,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.284,67	1,00	14.284,67		
11.02	CAIXAS										3.991,10				
11.02.001	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,65m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 392,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.178,70	3,00	1.178,70		
11.02.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 281,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.812,40	10,00	2.812,40		
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										47.672,00				
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										47.672,00				
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	350,00	0,00	48,29	48,29	R\$ 88,60	0,00	4.278,49	4.278,49	R\$ 31.010,00	301,71	26.731,51		

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor
Márcia Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CREA 2716238
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA



R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46

CONTRATO		PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	
067/2023		01.05.2023 a 16.06.2023	MEDIÇÃO N°	19.06.2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos
			001		Valor do Contrato: R\$: 998.260,28

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			SALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	350,00	0,00	48,29	48,29	R\$ 47,32	0,00	2.285,08	2.285,08	R\$ 16.562,00	301,71	14.276,92
			TOTAL DO ITEM										
			TOTAL DA MEDIÇÃO						137.400,50	137.400,50	998.260,28		860.859,78

Breno de Assis Pinto

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno Beiriz Pinto
 CREA/SE 271623-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor

Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

SBP CONSTRUÇÕES

RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532 - GRAGERU - ARACAJU-SE

REFORMA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA PREFEITO JOÃO ALVES DOS SANTOS

MEMORIAL DE CÁLCULO DA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	2m x 3m= 6m² ✓
4	LABORATÓRIO		
04.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
04.01.001	Demolição de reboco	m2	Lab. Informática (22,20m x 1,00m + 1,10m x 0,10m) + Biblioteca 1 (26,80m x 1,00m) + Auditório (32,40m x 1,00m) + Biblioteca 2 (2,55m x 0,30m + 1,30m x 0,30m)+ Hall (2,10m x 0,30m + 0,70m x 0,30m + 0,35m x 0,40m) + Área Ext. (38,23m x 1,50m + 3,00m x 1,20m + 18,10m x 1,00m + 0,80m x 0,10m + 8,10m x 0,35m + 2,10m x 0,10m + 0,75m x 0,10m + 7,50m x 1,00m + 2,50m x 0,10m) = 173,63m² ✓
04.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	WC M. (6,16m x 1,50m) + WC F. (6,16m x 1,50m) + Auditório (2,23m x 2,07m+0,92m x 0,66m)= 23,7m² ✓
04.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	WC M. (0,62m x 1,12m +1,45m x 1,11m + 0,64m x 0,11m) + WC F. (0,62m x 1,12m +1,45m x 1,11m + 0,64m x 0,11m)= 6,38m² ✓
04.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	WC M. (1,30m x 0,70m + 0,70m x 0,30m) + WC F. (1,30m x 0,45m + 0,72m x 0,25m) + Área externa (24,45m x 0,65m + 26,55m x 1,05m + 9,86m x 1,05m + 0,15m x 1,95m + 0,15m x 1,95m + 21,16m x 0,25m)= 61,89m² ✓
04.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	Biblioteca 1 (7,00m x 7,50m) + Lab Informática (4,00x7,50m)= 82,50m² ✓
04.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	Portas (1,00m x 2,50m x 2un + 0,80m x 2,50m x 1un + 0,80m x 2,10m x 1un + 0,70m x 2,10m x 2un + 0,60m x 2,10m x 4un) + Janelas (2,00m x 1,00m x 13un + 2,00m x 0,80m x 1un + 1,50m x 0,80m x 3un + 1,00m x 0,80m x 2un) = 63,91m² ✓
04.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	0,60mx1,5mx6un = 3,24m² ✓
04.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	2 unidades ✓
04.01.009	Remoção de lavatório	un	3 unidades ✓
04.01.010	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	1 unidade ✓

Elaine da Cunha Menezes
Eng^o Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

Thaís Lima Santos
Eng^o Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

04.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	25,50m x 6,95m + 25,42m x 4,90m = 301,83m²
04.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,24m
04.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,20m
04.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00m³
04.02	ELEVAÇÃO		
04.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,00m x 0,29m x 2un + 0,10m x 2,10m x 2un + 0,80m x 0,35m x 1un= 1,28m²
04.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,00m x 0,29m x 2un + 0,10m x 2,10m x 2un + 0,80m x 0,35m x 1un= 1,28m²
04.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,00m x 0,29m x 2un + 0,10m x 2,10m x 2un + 0,80m x 0,35m x 1un= 1,28m²
04.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	1,20m x 4un= 4,80m
04.03	COBERTURA		
04.03.001	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	76,16m
04.03.002	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	26,83m
04.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,20m²
04.03.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,24m
04.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	25,50m x 6,95m + 25,42m x 4,90m = 301,83m²
04.04	REVESTIMENTO		
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	Lab. Informática (22,20m x 1,00m + 1,10m x 0,10m) + Biblioteca 1 (26,80m x 1,00m) + Auditório (32,40m x 1,00m) + Biblioteca 2 (2,55m x 0,30m + 1,30m x 0,30m) + Hall (2,10m x 0,30m + 0,70m x 0,30m + 0,35m x 0,40m) + Área Ext. (38,23m x 1,50m + 3,00m x 1,20m + 18,10m x 1,00m + 0,80m x 0,10m + 8,10m x 0,35m + 2,10m x 0,10m + 0,75m x 0,10m + 7,50m x 1,00m + 2,50m x 0,10m) = 173,63m²
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	108,97m²
04.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	64,66
04.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	23,7m²

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Arq. Bruno Beliz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


04.04.005	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	WC M. (9,77m x 2,90m) + WC F. (9,77m x 2,90m) = 59,33m ² - Esquadrias (0,60m x 2,10m x 6un + 0,70m x 1,00m x 2un) = 47,74m²
04.05	FORRO		
04.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	Lab. Informática (30,00m ²) + Biblioteca 1 (52,50m ²) + Auditório (73,14m ²) + Biblioteca 2 (7,50m ²) + Hall Ent. (4,50m ²) + Hall (1,29m ²) + WC M. (3,17m ²) + WC F. (3,17m ²) = 175,27m²
04.06	PILARES		
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,33m x 2,80m x 6un = 5,50m²
04.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,33m x 2,80m x 6un = 5,50m²
04.06.003	Demolição de reboco	m2	0,33m x 2,80m x 6un = 5,50m²
04.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,10m²
04.07	PAVIMENTAÇÃO		
04.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	Lab. Informática (30,00m ²) + Biblioteca 1 (52,50m ²) + Auditório (73,14m ²) + Biblioteca 2 (7,50m ²) + Hall Ent. (4,50m ²) + Hall (2,16m ²) + Entrada (15,69m x 2,10m) = 202,75m²
04.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	WC M. (1,45m x 1,04m + 1,45m x 1,11m + 0,64m x 0,11m) + WC F. (1,45m x 1,04m + 1,45m x 1,11m + 0,64m x 0,11m) = 6,38m²
04.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	WC M. (1,45m x 1,04m + 1,45m x 1,11m + 0,64m x 0,11m) + WC F. (1,45m x 1,04m + 1,45m x 1,11m + 0,64m x 0,11m) = 6,38m²
04.08	PASSEIO		
04.08.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	WC M. (1,30m x 0,70m + 0,70m x 0,30m) + WC F. (1,30m x 0,45m + 0,72m x 0,25m) + Área externa (24,45m x 0,65m + 26,55m x 1,05m + 9,86m x 1,05m + 0,15m x 1,95m + 0,15m x 1,95m + 21,16m x 0,25m) = 61,89m²
04.09	ESQUADRIAS		
04.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA		
04.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4 unidades
04.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1 unidades

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBR CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arqu. Bruno Beiriz Pinto
 CREA 27112318-8
 SBR CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46



Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

04.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	4 unidades
04.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	2 unidades
04.09.001.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	49m ²
04.09.001.006	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	m ²	4,20m ²
04.09.001.007	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	2,00
04.09.001.008	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	6,00
04.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS		
04.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,00m x 1,00m x 13un + 2,00m x 0,90m x 1un + 1,50m x 0,80m x 3un + 1,00m x 0,70m x 2un = 32,80m ²
04.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOSTO		
04.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	WC M. (2un) + WC F. (2un) = 4 unidades
04.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	WC M. (1un) + WC F. (1un) = 2 unidades
04.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	WC M. (1un) + WC F. (1un) = 2 pontos
04.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	WC M. (2un) + WC F. (2un) = 4 unidades
04.11	METAIS E LOUÇAS		
04.11.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	WC M. (1un) + WC F. (1un) = 2 unidades
04.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	0,00
04.11.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	0,00
04.11.004	Saboneteira para sabão líquido	un	0,00
04.11.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1 unidade
04.12	PINTURAS		
04.12.001	PINTURA INTERNA		
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	Lab. Informática (23,00m) + Biblioteca 1 (29,00m) + Auditório (35,56m) + Biblioteca 2 (11,00m) + Hall Ent. (9,00m) + Hall (6,61m) = 114,17m x 2,83m = 323,43m ²

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

Thaís Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

Eng. Breno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ: 29.553.812/0001-46

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ: 29.553.812/0001-46

04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	Lab. Informática (23,00m) + Biblioteca 1 (29,00m) + Auditório (35,56m) + Biblioteca 2 (11,00m)+ Hall Ent. (9,00m) + Hall (6,61m)= 114,17m x 2,83m= 323,43m² + Forro (126,57m²) = 450m²
04.12.002	PINTURA EXTERNA		
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	Área Ext. 35,71m x 4,20m= 150,00m²
04.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS		
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	0,00
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	m2	73,70m²
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superficies metálicas - R1	m2	73,70m²
04.13	DIVERSOS		
04.13.001	Limpeza geral	m2	0,00
10.01.003	QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO		
10.01.003.001	RAMAL DE ENTRADA		
10.01.003.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	184,00
10.01.003.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	46,00
10.01.003.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00
10.01.003.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15,00
10.01.003.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00
10.01.003.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
10.01.003.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00
10.01.003.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
10.01.003.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	0,00


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 271610492-1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana


Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 271739199-1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana


Atiq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	0,00
10.01.003.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00
10.01.003.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00
10.01.003.002.006	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00
10.01.003.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00
10.01.003.002.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00
10.01.003.002.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00
10.01.003.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA		
10.01.003.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	5,00
10.01.003.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	18,00
10.01.003.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	9,00
10.01.003.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00
10.01.003.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	23,00
10.01.003.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00
10.01.003.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	37,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	48,29
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	48,29


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 053.812/0001-46


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Medição nº 1
02.05.2023 a 16.06.2023

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo servir de memória para os pagamentos efetuados por conta da referida medição, como também informar o andamento de serviços. Ele não substitui a medição efetuada considerando-se a planilha orçamentária, servindo de resumo para suporte à mesma.

DOS VALORES

A medição importa o valor de **R\$ 137.400,50 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos reais e cinquenta centavos)**, o que corresponde a 13,76% (treze vírgula setenta e seis por cento) do valor global dos serviços referentes à **Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos**.

DOS SERVIÇOS

Inicialmente, é importante destacar que a execução dos serviços para feita por blocos, tendo em vista a manutenção das atividades no local. O primeiro bloco em que os serviços estão sendo efetuados é o LABORATÓRIO (item 4 da planilha de medição).


Serviços Preliminares


Foi realizada a instalação da placa da obra, conforme modelo encaminhado pela Secretaria de Obras.

Demolição e Remoção

Foram realizadas as remoções das esquadrias de madeira, revestimentos, forro de gesso, lavatórios, vasos sanitários, necessárias a substituição dos itens. Foi realizada a retirada e limpeza de todo o telhado, sendo substituídas as telhas danificadas.

Elevação


Elaine da Cunha Menezes
Eng.ª Civil CREA 27161049/21
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399/SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Foi realizada a retirada das bandeiras existentes nas portas, sendo necessária a colocação de vesga para fins de vedação com alvenaria de bloco cerâmico, com posterior chapisco e reboco.

Cobertura

Foi realizada a revisão da cobertura, sendo substituídas todas as peças danificadas. Também foi realizada a imunização do madeiramento da cobertura, com imunizante anticupim e pragas.

Revestimento

Após a retirada de todo o revestimento dos banheiros, foi realizada a instalação de um novo, tanto nas paredes quanto no piso.

Forro

Foi realizada a instalação de forro de placa gesso em todo o bloco.

Pilares

Todos os pilares foram recuperados e foi realizada a pintura em todos eles.

Pavimentação

Foi realizada a substituição de piso de alta resistência danificado, sendo colocado novo piso. Todo o bloco teve o seu piso polido.

Passoio

Todo o passeio existente em volta do bloco foi demolido e refeito.

Esquadrias de madeira

Todas as portas existentes foram substituídas por novas, sendo colocados caixões, alisares, portas e fechaduras novas.

Esquadrias metálicas


Foi realizada a instalação de novas janelas em alumínio em todo o bloco.


Instalações hidráulicas e esgoto

Toda as tubulações existentes no bloco foram retiradas e substituídas por novas.

Metais e louças

Foi realizada a instalação de um novo registro, bem como novos vasos sanitários.


Eng. Breno de Assis Pinto
CAD/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Thaisa Lima Santos
Eng.ª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

Pintura Interna

Foi realizado o emassamento na parte interna e posterior pintura, sendo mantidas as cores existentes. Fora deixado uma margem para retoques futuros.

Pintura Externa

Foi realizado o emassamento na parte externa, tendo em vista várias paredes estarem danificadas, com posterior passagem de selador e pintura, sendo mantidas as cores existentes.


Pintura de Esquadrias


Foi realizado o lixamento de todas as grades existentes, sendo aplicado o zarcão e posterior pintura.

Parte Elétrica

Foi realizada a substituição de eletrodutos e cabeamentos de todo o bloco. Após, foram instaladas as luminárias, tomadas e interruptores. O quadro de distribuição e sua alimentação também foram substituídos por completo.

Aracaju, 19 de junho de 2023



Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01. Instalação da placa da obra


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Gestor Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Foto 02. Remoção de piso e revestimento cerâmico dos banheiros com a substituição de toda estrutura hidráulica e de esgoto. Remoção de antigos caixões de porta e instalação de novos




Foto 03. Remoção de esquadrias das janelas e início da demolição do reboco externo.





Foto 04. Remoção de piso e revestimento cerâmico dos banheiros. Remoção de antigos caixões de porta e instalação de novos



Foto 05. Remoção das telhas cerâmicas para limpeza e revisão do madeiramento do telhado. Remoção de forro de gesso.


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng^a Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabáiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


 Gestor Thaisa Lima Santos
 Eng^a Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabáiana



Foto 06. Remoção das telhas cerâmicas para limpeza e revisão do madeiramento do telhado. Remoção de forro de gesso.



Foto 08. Início da demolição de reboco externo danificado e demolição de passeio. Esquadrias metálicas instaladas e grades das janelas pintadas.



Foto 07. Remoção de passeio externo.

Elaine da Cunha Menezes
 Elaine da Cunha Menezes
 Eng^a Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itaboraí



Foto 09. Madeiramento do telhado após a remoção das telhas e aplicação de anticupim

Breno de Assis Pinto
 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Thaís Lima Santos
 Thaís Lima Santos
 Eng^a Civil - CREA 2717391991
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Thaís Lima Santos
 Gestor
 Thaís Lima Santos
 Eng^a Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itaboraí

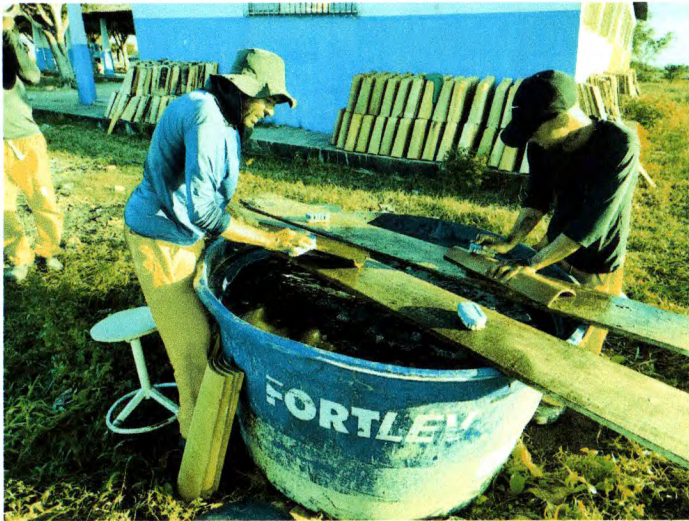


Foto 10. Execução de limpeza das telhas cerâmicas



Figura 12. Telhado após a limpeza realizada



Foto 11. Retelamento após a limpeza realizada e aplicação de produto em todo madeiramento

Elaine da Cunha Menezes
 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Foto 13. Retirada de esquadrias de madeiras existentes e preparação para instalação de novas esquadrias em alumínio. Instalação de caixa de porta novo

Breno de Assis Pinto
 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Breno de Assis Pinto
 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Thaís Lima Santos
 Gestor
 Thaís Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Página 10 de 25



Foto 14. Instalação de revestimento nos banheiros e picotamento da parede



Foto 15. Instalação de revestimento nas paredes

Elaine
Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 271610492-1
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

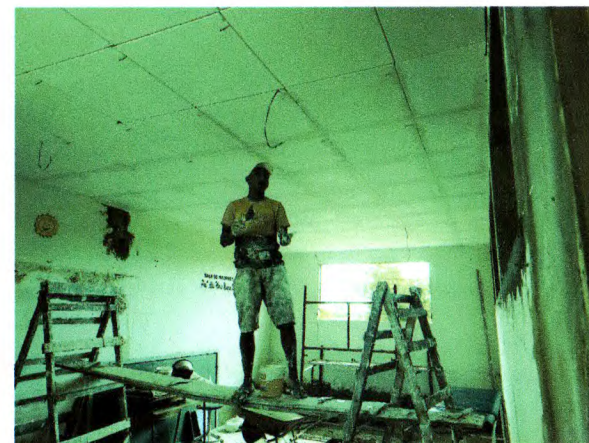


Foto 16. Instalação de novo forro em placas de gesso

Breno
Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Breno
Atq. Bruno Beliz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Maísa
Gestor Maísa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana





Foto 17. Instalação de novo forro em placas de gesso



Foto 18. Auditório com todo o gesso já instalado, emassado e pintado. Esquadrias metálicas instaladas e luminárias instaladas, bem como tomadas. Paredes emassadas e com uma demão de tinta.


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng^o Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N^o 29.553.812/0001-46


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA/SE 27214663-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46


 Thaisa Lima Santos
 Eng^o Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gestor



Foto 20. Revestimento do banheiro instalado.




Foto 22. Novos revestimentos dos banheiros e instalação de pontos de luz





Foto 21. Biblioteca e sala de informática com forro em placas de gesso finalizado, com instalação de luminárias e esquadrias em alumínio. Emassamento de paredes e pintura realizada




Foto 24. Instalação de luminárias


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor



Foto 25. Instalação de novas esquadrias em alumínio e pintura de grades




Foto 27. Emassamento de paredes externas




Foto 26. Instalação de novas esquadrias em alumínio e pintura de grades



Foto 28. Substituição de eletrodutos, caixas de passagem e fiação de todos os ambientes do bloco. Instalação de pontos de energia


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beliz Pinto
CAL/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46



Tháisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Foto 29. Instalação de novo quadro de energia e tubulação



Foto 31. Substituição de eletrodutos, caixas de passagem e fiação de todos os ambientes do bloco. Instalação de pontos de energia



Foto 30. Substituição de eletrodutos, caixas de passagem e fiação de todos os ambientes do bloco. Instalação de pontos de energia


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Belliz Pinto
 CAB/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gestor



Foto 32. Pilares finalizados



Foto 33. Piso de alta resistência polido e luminárias instaladas



Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 271610492
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

Foto 34. Portas de madeira instaladas

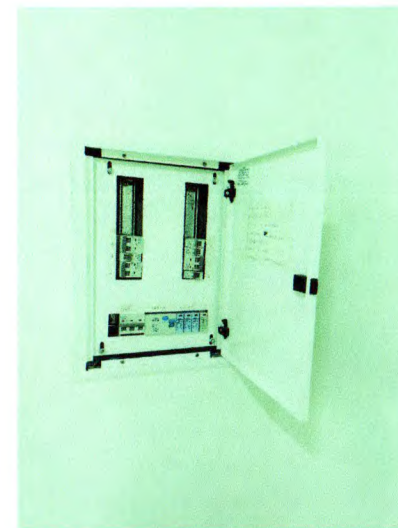




Foto 35. Quadro de distribuição finalizado


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Thaise Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana


Foto 36. Parte externa finalizada com instalação de refletores




Foto 37. Pintura externa e instalação de refletores


Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Foto 38. Parte externa e instalação de refletores


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Gestor



Foto 39. Pintura externa e instalação de refletores



Foto 40. Pintura externa e piso de alta resistência polido


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gestor



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46





Thaís Lima Santos
Eng.º Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana
Gestor

Foto 40. Instalação de vaso sanitário, piso dos banheiros e revestimentos


Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana


Eng.º Bruno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N.º 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46
