

Unidade de Saúde - Pov. Lagamar							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO		
							MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	01	13/10/25 A 07/11/25		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO	
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		
1	Unidade de Saúde - Pov. Lagamar							R\$	-	R\$ 43.263,30	R\$ 43.263,30	R\$ 631.384,56
01.01	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$	-	R\$ 37.922,91	R\$ 37.922,91	R\$ 57.718,11
01.01.001	PLACA DE OBRA							R\$	-	R\$ 2.631,92	R\$ 2.631,92	R\$ 2.631,92
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8	8	8		R\$ 328,99	R\$	-	R\$ 2.631,92	R\$ 2.631,92	R\$ 2.631,92
01.01.002	CANTEIRO DE OBRAS							R\$	-	R\$ 8.809,21	R\$ 8.809,21	R\$ 13.863,51
01.01.002.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022	mês	8	1	1		R\$ 722,04	R\$	-	R\$ 722,04	R\$ 722,04	R\$ 5.776,32
01.01.002.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	585,55	585,55	585,55		R\$ 8,87	R\$	-	R\$ 5.193,82	R\$ 5.193,82	R\$ 5.193,83
01.01.002.003	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af 03/2024	m2	533,83	533,83	533,83		R\$ 5,42	R\$	-	R\$ 2.893,35	R\$ 2.893,35	R\$ 2.893,36
01.01.003	DEMOLIÇÃO							R\$	-	R\$ 26.481,78	R\$ 26.481,78	R\$ 41.222,68
01.01.003.001	Demolição de forros	m2	160,56	160,56	160,56		R\$ 9,75	R\$	-	R\$ 1.565,46	R\$ 1.565,46	R\$ 1.565,46
01.01.003.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	17,43	17,43	17,43		R\$ 11,34	R\$	-	R\$ 197,65	R\$ 197,65	R\$ 197,66
01.01.003.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	15,31	15,31	15,31		R\$ 29,28	R\$	-	R\$ 448,27	R\$ 448,27	R\$ 448,28
01.01.003.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	36,01	4,17	4,17		R\$ 36,64	R\$	-	R\$ 152,78	R\$ 152,78	R\$ 1.319,41
01.01.003.005	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1		0		R\$ 127,16	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,18
01.01.003.006	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	8,96		0		R\$ 125,86	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,71
01.01.003.007	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	228,5	228,5	228,5		R\$ 24,43	R\$	-	R\$ 5.582,25	R\$ 5.582,25	R\$ 5.582,26
01.01.003.008	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2	2	2		R\$ 23,56	R\$	-	R\$ 47,12	R\$ 47,12	R\$ 47,12
01.01.003.009	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	14,06	14,06	14,06		R\$ 16,45	R\$	-	R\$ 231,28	R\$ 231,28	R\$ 231,29
01.01.003.010	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	29,41	29,41	29,41		R\$ 24,91	R\$	-	R\$ 732,60	R\$ 732,60	R\$ 732,60
01.01.003.011	Remoção, levagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum,fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabalana ou similar	m2	253,86	126,93	126,93		R\$ 90,74	R\$	-	R\$ 11.517,62	R\$ 11.517,62	R\$ 23.035,26
01.01.003.012	Demolição de piso de alta resistência	m2	196,6	196,6	196,6		R\$ 24,43	R\$	-	R\$ 4.802,93	R\$ 4.802,93	R\$ 4.802,94
01.01.003.013	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	un	8	8	8		R\$ 14,96	R\$	-	R\$ 119,68	R\$ 119,68	R\$ 119,68
01.01.003.014	Remoção de vaso sanitário	un	4	3	3		R\$ 15,78	R\$	-	R\$ 47,34	R\$ 47,34	R\$ 63,12
01.01.003.015	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	106,22	80	80		R\$ 12,96	R\$	-	R\$ 1.036,80	R\$ 1.036,80	R\$ 1.376,61
01.01.003.016	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	318,66		0		R\$ 1,40	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,12
01.02	FUNDAÇÃO							R\$	-	R\$ 2.026,77	R\$ 2.026,77	R\$ 15.383,54
01.02.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$	-	R\$ 709,11	R\$ 709,11	R\$ 1.906,87
01.02.001.001	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	26,77	9,11	9,11		R\$ 12,96	R\$	-	R\$ 118,06	R\$ 118,06	R\$ 346,94
01.02.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	22,31	9,11	9,11		R\$ 64,88	R\$	-	R\$ 591,05	R\$ 591,05	R\$ 1.447,47
01.02.001.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	80,33		0		R\$ 1,40	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,46
01.02.002	ALVENARIA DE PEDRA E VIGA BALDRAME							R\$	-	R\$ 1.317,66	R\$ 1.317,66	R\$ 13.476,67
01.02.002.001	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,82		0		R\$ 609,65	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.596,41
01.02.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,38	0,71	0,71		R\$ 1.845,79	R\$	-	R\$ 1.310,51	R\$ 1.310,51	R\$ 6.238,77
01.02.002.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	9,24	0,4	0,4		R\$ 17,88	R\$	-	R\$ 7,15	R\$ 7,15	R\$ 165,21
01.02.002.004	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	16,83		0		R\$ 28,64	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,28
01.03	SUPERESTRUTURA							R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.463,47
01.03.001	ARRANQUE DE PILAR							R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.307,24
01.03.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,25		0		R\$ 1.845,79	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.307,24
01.03.002	PILAR							R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.478,72

REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE Unidade de Saúde - Pov. Lagamar							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	
							MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	01	13/10/25 A 07/11/25	
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	
01.03.002.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,51		0		R\$ 1.845,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.478,72
01.03.003	LAJE							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.667,55
01.03.003.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	30,29		0		R\$ 181,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.485,82
01.03.003.002	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	20,84		0		R\$ 198,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.132,78
01.03.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	18,9		0		R\$ 55,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,95
01.03.004	VIGA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.009,96
01.03.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,05		0		R\$ 1.845,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.475,45
01.03.004.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	4,5		0		R\$ 118,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,51
01.04	ELEVACÃO							R\$ -	R\$ 1.653,34	R\$ 1.653,34	R\$ 21.390,31
01.04.001	PAREDES							R\$ -	R\$ 1.653,34	R\$ 1.653,34	R\$ 15.865,78
01.04.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	285,87	29,79	29,79		R\$ 55,50	R\$ -	R\$ 1.653,34	R\$ 1.653,34	R\$ 15.865,78
01.04.002	VERGAS E CONTRAVERGAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.524,53
01.04.002.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	140,86		0		R\$ 39,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.524,53
01.05	COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.930,30
01.05.001	TELHAMENTO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.930,30
01.05.001.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m	un	1		0		R\$ 1.344,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,85
01.05.001.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabellana ou similar	m2	137,59		0		R\$ 57,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.845,38
01.05.001.003	Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento	m	3,8		0		R\$ 69,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,18
01.05.001.004	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	90,64		0		R\$ 68,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.193,43
01.05.001.005	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada,seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01	m	15,65		0		R\$ 503,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.872,26
01.05.001.006	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	43,5		0		R\$ 9,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,20
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.287,28
01.06.001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.287,28
01.06.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1		0		R\$ 480,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,85
01.06.001.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1		0		R\$ 596,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 596,86
01.06.001.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Enerqisa	un	4		0		R\$ 22,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,40
01.06.001.004	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 10KA	un	1		0		R\$ 160,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,86
01.06.001.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	80		0		R\$ 23,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,80
01.06.001.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	27		0		R\$ 5,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,28
01.06.001.007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90º C	m	220		0		R\$ 21,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.791,60
01.06.001.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4		0		R\$ 129,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,88
01.06.001.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores,com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1		0		R\$ 1.975,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,04
01.06.001.010	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 10KA	un	1		0		R\$ 160,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,86
01.06.001.011	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5		0		R\$ 14,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,90
01.06.001.012	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5		0		R\$ 13,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,75
01.06.001.013	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva B	un	11		0		R\$ 53,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587,07
01.06.001.014	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1		0		R\$ 69,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36
01.06.001.015	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),corrente 5KA	un	3		0		R\$ 61,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,57

Unidade de Saúde - Pov. Lagamar								CONTRATO		283/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO		PERÍODO	
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:		01/05/2025		01		13/10/25 A 07/11/25	
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO				
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO					
01.06.001.016	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	2		0		R\$ 389,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,26				
01.06.001.017	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	100		0		R\$ 333,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.373,00				
01.06.001.018	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6		0		R\$ 75,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,66				
01.06.001.019	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 09/2024	un	28		0		R\$ 79,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,40				
01.06.001.020	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025	un	7		0		R\$ 33,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,00				
01.06.001.021	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	7		0		R\$ 9,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,31				
01.06.001.022	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	66		0		R\$ 69,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.600,20				
01.06.001.023	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	78		0		R\$ 248,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.414,98				
01.06.001.024	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	7		0		R\$ 301,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.109,66				
01.06.001.025	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4		0		R\$ 229,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 916,12				
01.06.001.026	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	13		0		R\$ 232,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.025,88				
01.06.001.027	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1		0		R\$ 228,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,55				
01.06.001.028	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	1		0		R\$ 365,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,57				
01.06.001.029	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10		0		R\$ 356,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.569,90				
01.06.001.030	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	1		0		R\$ 87,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,31				
01.06.001.031	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar	un	2		0		R\$ 32,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,42				
01.06.001.032	Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af 11/2019	un	10		0		R\$ 30,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,90				
01.06.001.033	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusiva tomada	un	8		0		R\$ 201,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.612,16				
01.06.001.034	Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida	un	17		0		R\$ 60,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,92				
01.06.001.035	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	150		0		R\$ 26,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.939,00				
01.06.001.036	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	50		0		R\$ 7,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,50				
01.06.001.037	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	150		0		R\$ 23,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,50				
01.06.001.038	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	50		0		R\$ 5,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,00				
01.07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.221,11				
01.07.001	HIDRAÚLICO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.453,02				
01.07.001.001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	13		0		R\$ 99,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.293,37				
01.07.001.002	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material,inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/lampa de concreto Rev. 01 - 10/2022	un	1		0		R\$ 1.811,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,57				
01.07.001.003	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	2		0		R\$ 822,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645,58				
01.07.001.004	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	30		0		R\$ 21,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 658,50				
01.07.001.005	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	25		0		R\$ 201,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.044,00				
01.07.002	SANITÁRIO				0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.768,09				
01.07.002.001	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	7,5		0		R\$ 55,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,65				
01.07.002.002	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af 12/2020	un	1		0		R\$ 5.103,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.103,81				
01.07.002.003	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1		0		R\$ 1.250,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,40				
01.07.002.004	Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil, Tigre ou similar	un	12		0		R\$ 147,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.766,88				
01.07.002.005	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m	un	1		0		R\$ 760,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,30				
01.07.002.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4		0		R\$ 29,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,52				
01.07.002.007	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	11		0		R\$ 10,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,35				

Unidade de Saúde - Pov. Lagamar								CONTRATO		283/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO		PERÍODO	
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:		01/05/2025		01		13/10/25 A 07/11/25	
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO				
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO					
01.07.002.008	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5			0	R\$ 13,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,50				
01.07.002.009	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	5			0	R\$ 28,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	142,55				
01.07.002.010	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	13			0	R\$ 19,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	247,13				
01.07.002.011	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1			0	R\$ 21,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,75				
01.07.002.012	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5			0	R\$ 60,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	303,10				
01.07.002.013	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	9			0	R\$ 52,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	468,99				
01.07.002.014	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1			0	R\$ 21,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,53				
01.07.002.015	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1			0	R\$ 16,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,57				
01.07.002.016	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af_12/2020	un	1			0	R\$ 4.813,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.813,11				
01.07.002.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	40			0	R\$ 41,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.678,00				
01.07.002.018	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	30			0	R\$ 19,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	591,00				
01.07.002.019	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	35			0	R\$ 24,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	866,95				
01.08	MURO E MURETA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.084,35				
01.08.001	MURO (EXISTENTE)							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.599,33				
01.08.001.001	Apicamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	313,49			0	R\$ 3,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.006,30				
01.08.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	313,49			0	R\$ 52,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16.593,03				
01.08.002	MURETA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.465,02				
01.08.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,4			0	R\$ 64,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	285,47				
01.08.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	5,28			0	R\$ 12,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	68,43				
01.08.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	15,84			0	R\$ 1,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,99				
01.08.002.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	4,4			0	R\$ 559,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.462,90				
01.08.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	16,06			0	R\$ 54,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	881,05				
01.08.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	32,12			0	R\$ 7,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	241,22				
01.08.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	32,12			0	R\$ 40,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.312,42				
01.08.002.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	32,12			0	R\$ 52,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.700,11				
01.08.002.009	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1			0	R\$ 27,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	27,68				
01.08.002.010	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	75,57			0	R\$ 128,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.746,26				
01.08.002.011	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	151,14			0	R\$ 24,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.710,49				
01.09	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.874,64				
01.09.001	PAREDE							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.535,39				
01.09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	737,97			0	R\$ 7,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.542,15				
01.09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	272,91			0	R\$ 37,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.138,61				
01.09.001.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	272,91			0	R\$ 49,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.637,31				

Unidade de Saúde - Pov. Lagamar							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	
							MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	01	13/10/25 A 07/11/25	
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	
01.09.001.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af. 02/2023_pe	m2	503,47			0	R\$ 95,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.217,32
01.09.002	TETO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.753,33
01.09.002.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Ver 06_10/2021	m2	279,94			0	R\$ 58,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.508,06
01.09.002.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	30,29			0	R\$ 14,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,05
01.09.002.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	30,29			0	R\$ 42,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.277,63
01.09.002.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	30,29			0	R\$ 49,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513,59
01.09.003	PISO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.144,63
01.09.003.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023	m3	13,85			0	R\$ 94,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.302,73
01.09.003.002	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	13,85			0	R\$ 4,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,70
01.09.003.003	Lona plástica preta	m2	553,38			0	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.574,83
01.09.003.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	553,38			0	R\$ 35,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.910,61
01.09.003.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	553,38			0	R\$ 29,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.562,66
01.09.003.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af. 02/2023_pe	m2	59,79			0	R\$ 125,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.478,53
01.09.003.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	224,05			0	R\$ 63,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.130,83
01.09.003.008	Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	269,54			0	R\$ 89,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.115,74
01.09.004	FACHADA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.441,29
01.09.004.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	231,11			0	R\$ 7,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.735,64
01.09.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	205,71			0	R\$ 40,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.405,31
01.09.004.003	Revestimento de parede com pedra natural ouro pálido, aplicada com argamassa industrializada ac-il	m2	43,29			0	R\$ 171,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.412,11
01.09.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	205,71			0	R\$ 52,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.888,23
01.10	ESQUADRIAS E VIDRO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.109,93
01.10.001	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.501,00
01.10.001.001	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroliho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	11,7			0	R\$ 458,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.359,77
01.10.001.002	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	5,04			0	R\$ 304,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.532,76
01.10.001.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	7			0	R\$ 973,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.812,26
01.10.001.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	7			0	R\$ 1.052,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.370,51
01.10.001.005	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	8,19			0	R\$ 821,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.730,95
01.10.001.006	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	21,55			0	R\$ 339,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.305,88
01.10.001.007	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	2,4			0	R\$ 162,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,87
01.10.002	VIDRO					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.608,93
01.10.002.001	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m2	19,4			0	R\$ 289,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.608,93
01.11	LOUÇAS E METAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.007,35

REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE Unidade de Saúde - Pov. Lagamar							CONTRATO		283/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO		PERÍODO	
							MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:		01/05/2025		01		13/10/25 A 07/11/25	
							VALORES R\$							CONTRATO
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO				
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO								
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.007,35			
01.11.001	LOUÇAS E METAIS						R\$ 697,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,46			
01.11.001.001	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2			0	R\$ 741,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.928,40			
01.11.001.002	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	un	8			0								
01.11.001.003	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	5			0	R\$ 449,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.245,70			
01.11.001.004	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	4			0	R\$ 241,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 965,80			
01.11.001.005	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	5			0	R\$ 374,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.871,95			
01.11.001.006	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	m	4,75			0	R\$ 757,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.598,41			
01.11.001.007	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	13,79			0	R\$ 1.005,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.869,71			
01.11.001.008	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico,válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	4			0	R\$ 282,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131,92			
01.12	PAISAGISMO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.107,36			
01.12.001	GRAMA						R\$ 29,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.107,36			
01.12.001.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	273,62			0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.632,69			
01.13	DIVERSOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.632,69			
01.13.001	DIVERSOS						R\$ 1.850,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,78			
01.13.001.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1			0	R\$ 130,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 641,07			
01.13.001.002	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	m2	4,9			0								
01.13.001.003	Letra em PVC expandido, inclusive instalação	un	25			0	R\$ 31,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,75			
01.13.001.004	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	22,42			0	R\$ 5,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,72			
01.13.001.005	Limpeza geral	m2	814,37			0	R\$ 2,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.231,37			
01.14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,28	R\$ 1.660,28	R\$ 25.194,12			
01.14.001	EQUIPE DIRIGENTES						R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,28	R\$ 1.660,28	R\$ 25.194,12			
01.14.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	84		5,54	5,5356	R\$ 148,13	R\$ -	R\$ 819,98	R\$ 819,98	R\$ 12.442,92			
01.14.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	168		11,07	11,0712	R\$ 75,90	R\$ -	R\$ 840,30	R\$ 840,30	R\$ 12.751,20			
							VALORES	R\$ -	R\$ 43.263,30	R\$ 43.263,30	R\$ 631.384,56			
</														

 REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE OBRA: Unidade de Saúde - Pov. Lagamar				
BM 01	MEMORIAL DE CÁLCULO			PERÍODO
				13/10/25 A 07/11/25
ITEM	SERVIÇOS	UND.	Equação	TOTAL
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	4*2	8
01.01.002.001	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02 02/2022	mês	1	1
01.01.002.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	21*16,35+11,07*20,65+2,5*5,44	585,55
01.01.002.003	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af 03/2024	m2	212,73+321,1	533,83
01.01.003.001	Demolição de forros	m2	11,78+7,29+4,03+45,92+7,06+36+40,32+2,85+1,77+1,77+1,77	160,56
01.01.003.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	11,76+3,78+1,89	17,43
01.01.003.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	2,45+2,45+2,1+2,1+2,1+2,1+2,01	15,31
01.01.003.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	(0,92+0,92+1,2+1,2+0,92+0,8+1,15+1+1,15)*3*0,15	4,17
01.01.003.007	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	42,47+37,82+39,37+21,39+23,715+5,27+5,0375+12,586+9,3+25,65+5,89	228,5
01.01.003.008	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	1+1	2
01.01.003.009	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	1+1,75+1+1+5,51+3,8	14,06
01.01.003.010	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	8,4+4,9+11,7+2,52+1,89	29,41
01.01.003.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ reaproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	19,45*6,526	126,93
01.01.003.012	Demolição de piso de alta resistência	m2	40,32+30,62+11,78+4,03+7,29+4,92+45,92+7,06+36+2,85+1,77+1,77+1,77+0,5	196,6
01.01.003.013	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	un	1+1+1+1+1+1+1	8
01.01.003.014	Remoção de vaso sanitário	un	1+1+1	3
01.01.003.015	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	196,6*0,25+30*0,09+160,56*0,1+228,5*0,05+4,17*0,15	80
01.02.001.001	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	21,8*0,6*0,6+15,8*0,2*0,4	9,11
01.02.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	21,8*0,6*0,6+15,8*0,2*0,4	9,11
01.02.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	15,8*0,3*0,15	0,71
01.02.002.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	15,8*0,1*0,25	0,04
01.04.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	2,54*5,91+2,87*5,15	29,79
01.14.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	84*6,59/100	5,54
01.14.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	168*6,59/100	11,07

Documento assinado digitalmente
gov.br IVANISE SANTOS NASCIMENTO
 Data: 28/11/2025 05:57:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADA: REIS CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 36.178.439/0001-56

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
 Data: 28/11/2025 09:12:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Documento assinado digitalmente
gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
 Data: 28/11/2025 09:36:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE	Obra:	Unidade de Saúde - Pov. Lagamar
	Período:	13/10/2025 a 07/11/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		

01.01.001.001 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022



01.01.002.001- Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022



01.01.002.002 - Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira



01.01.002.003 - Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024





01.01.003.001 - Demolição de forros



01.01.003.002 - Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023



01.01.003.003 - Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023





01.01.003.004 - Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida



01.01.003.007 - Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo



01.01.003.008 - Remoção de banco de concreto pré-moldado



01.01.003.009 - Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02



01.01.003.010 - Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022





01.01.003.011 - Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar



01.01.003.012 - Demolição de piso de alta resistência



01.01.003.013 - Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023




01.01.003.014 - Remoção de vaso sanitário





01.01.003.015 -Carga manual de material de 1ª categoria

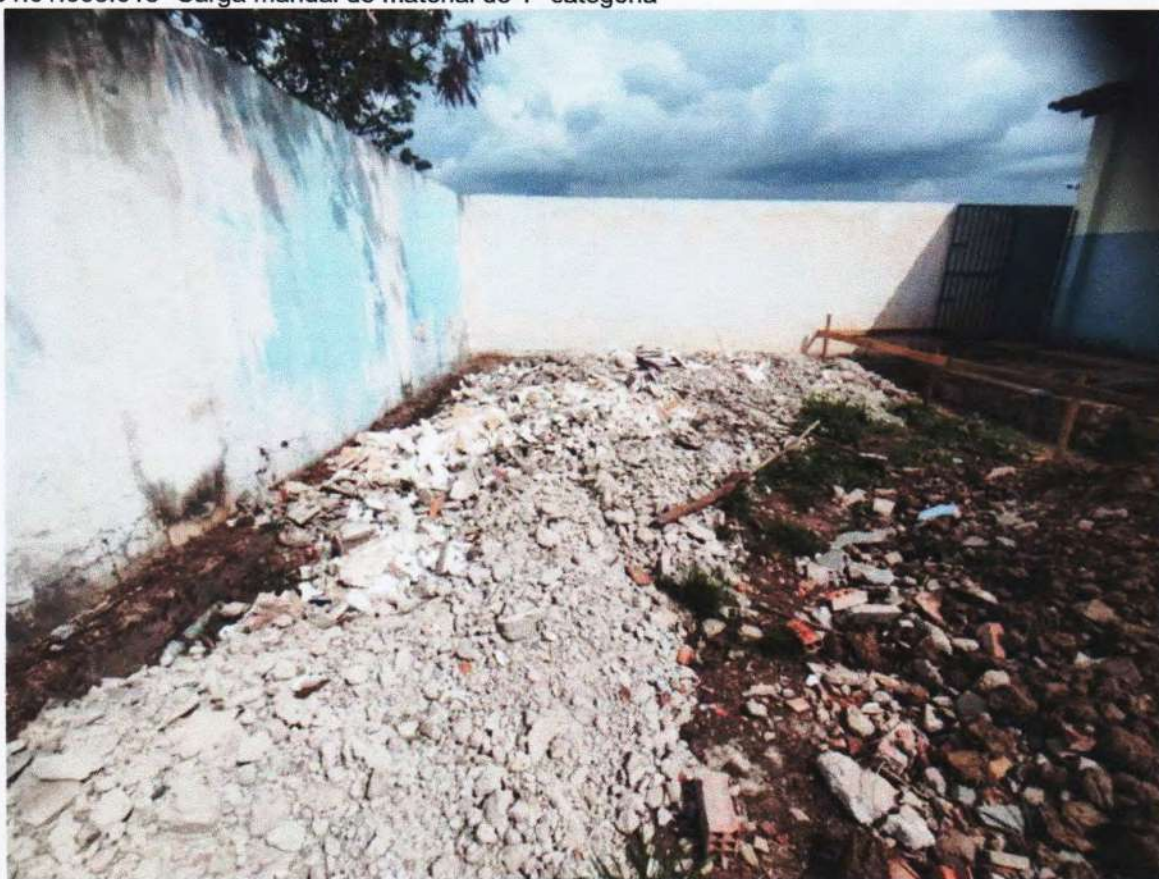



01.02.001.001 Carga manual de material de 1ª categoria



01.02.001.002 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50





01.02.002.002 - Concreto Armado $f_{ck}=21,0\text{MPa}$, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)



01.02.002.003 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação



01.04.001.001 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

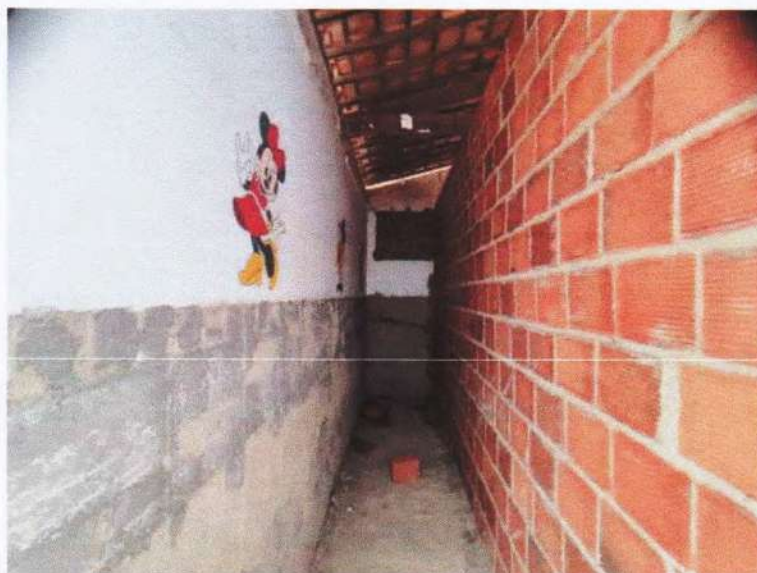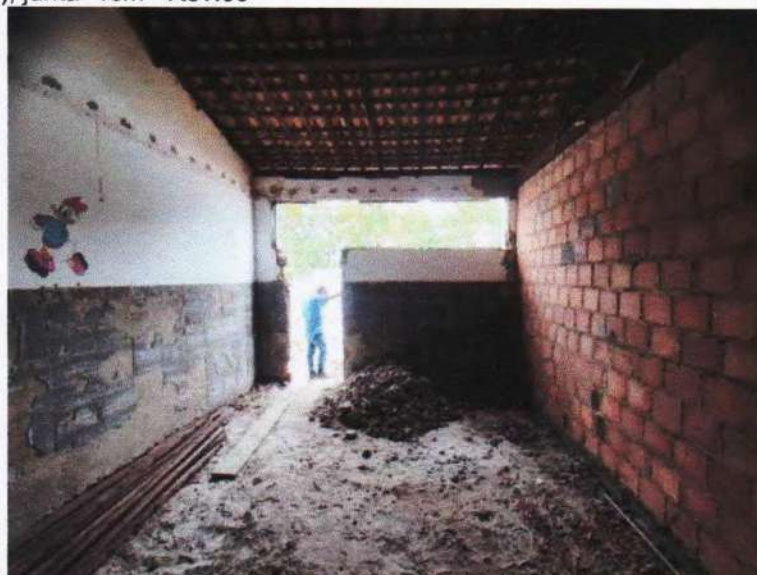

Documento assinado digitalmente

gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 28/11/2025 09:36:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br IVANISE SANTOS NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 06:02:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 28/11/2025 09:12:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
