

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				DATA DE INICIO: 07/04/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026				PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026				CONTRATO: 22/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 29/04/2026				REPASSE: CR 953630/2023/MTUR		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA													
1.01	PLACA DE OBRA								R\$ 2.651,52	R\$ -	R\$ 1.767,68	R\$ 1.767,68	R\$ 883,84	67%
1.01.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00		8,00	8,00	4,00	220,96	R\$ 2.651,52		R\$ 1.767,68	R\$ 1.767,68	R\$ 883,84	67%
1.02	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 5.376,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.376,60	0%
1.02.01	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00			0,00	6,00	488,00	R\$ 2.928,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,00	0%
1.02.02	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	6,00			0,00	6,00	408,10	R\$ 2.448,60		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,60	0%
1.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 1.724,64	R\$ -	R\$ 862,32	R\$ 862,32	R\$ 862,32	50%
1.03.01	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	140,00		70,00	70,00	70,00	7,32	R\$ 1.024,80		R\$ 512,40	R\$ 512,40	R\$ 512,40	50%
1.03.02	Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares	h	16,00		8,00	8,00	8,00	43,74	R\$ 699,84		R\$ 349,92	R\$ 349,92	R\$ 349,92	50%
1.04	SINALIZAÇÃO PROVISORIA								R\$ 72,84	R\$ -	R\$ 72,84	R\$ 72,84	R\$ -	100%
1.04.01	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5213835 - SICRO)	un.dia	50,00		50,00	50,00	0,00	0,93	R\$ 46,50		R\$ 46,50	R\$ 46,50	R\$ -	100%
1.04.02	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5212557 - SICRO)	un.dia	6,00		6,00	6,00	0,00	4,39	R\$ 26,34		R\$ 26,34	R\$ 26,34	R\$ -	100%
1.05	ENSAIOS								R\$ 10.406,89	R\$ -	R\$ 7.969,94	R\$ 7.969,94	R\$ 2.436,95	77%
1.05.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	17,00		17,00	17,00	0,00	100,65	R\$ 1.711,05		R\$ 1.711,05	R\$ 1.711,05	R\$ -	100%
1.05.02	Ensaio - Limite de liquidez	un	17,00		17,00	17,00	0,00	100,65	R\$ 1.711,05		R\$ 1.711,05	R\$ 1.711,05	R\$ -	100%
1.05.03	Ensaio - Limite de plasticidade	un	17,00		17,00	17,00	0,00	100,65	R\$ 1.711,05		R\$ 1.711,05	R\$ 1.711,05	R\$ -	100%

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				DATA DE INICIO: 07/04/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026				PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026				CONTRATO: 22/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 29/04/2026				REPASSE: CR 953630/2023/MTUR			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1.05.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	17,00		17,00	17,00	0,00	134,20	R\$ 2.281,40		R\$ 2.281,40	R\$ 2.281,40	R\$ -	100%	
1.05.05	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	17,00		17,00	17,00	0,00	32,67	R\$ 555,39		R\$ 555,39	R\$ 555,39	R\$ -	100%	
1.05.06	Ensaio - Marshall	un	17,00			0,00	17,00	143,35	R\$ 2.436,95		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.436,95	0%	
1.06	TERRAPLANAGEM								R\$ 377.507,49	R\$ -	R\$ 145.176,12	R\$ 145.176,12	R\$ 232.331,38	38%	
1.06.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	9351,61		9.351,61	9351,61	0,00	1,62	R\$ 15.149,60		R\$ 15.149,61	R\$ 15.149,61	R\$ -	100%	
1.06.02	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	m3	4675,81		1.529,23	1529,23	3146,58	5,44	R\$ 25.436,40		R\$ 8.319,01	R\$ 8.319,01	R\$ 17.117,39	33%	
1.06.03	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	t	7013,72		2.293,85	2293,85	4719,87	2,24	R\$ 15.710,73		R\$ 5.138,22	R\$ 5.138,22	R\$ 10.572,51	33%	
1.06.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5915321)	tkm	121337,36		39.683,61	39683,61	81653,75	0,40	R\$ 48.534,94		R\$ 15.873,44	R\$ 15.873,44	R\$ 32.661,50	33%	
1.06.05	Regularização do subleito - 100% Proctor Intermediário (SICRO - 4011209)	m2	9351,61		9.351,61	9351,61	0,00	1,83	R\$ 17.113,44		R\$ 17.113,45	R\$ 17.113,45	-R\$ 0,01	100%	
1.06.06	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor Intermediário (SICRO - 4011211)	m3	1402,74		458,77	458,77	943,97	16,34	R\$ 22.920,77		R\$ 7.496,30	R\$ 7.496,30	R\$ 15.424,47	33%	
1.06.07	Colchão de areia	m3	1402,74		458,77	458,77	943,97	159,14	R\$ 223.232,04		R\$ 73.008,66	R\$ 73.008,66	R\$ 150.223,38	33%	
1.06.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	tkm	21882,74		7.156,81	7156,81	14725,93	0,43	R\$ 9.409,57		R\$ 3.077,43	R\$ 3.077,43	R\$ 6.332,14	33%	
1.07	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 1.589.110,39	R\$ -	R\$ 131.761,50	R\$ 131.761,50	R\$ 1.457.348,89	8%	

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			DATA DE INICIO: 07/04/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026					PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026				CONTRATO: 22/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 29/04/2026				REPASSE: CR 953630/2023/MTUR		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.07.01	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011275)	m3	2805,48		917,54	917,54	1887,94	136,76	R\$ 383.677,44		R\$ 125.482,77	R\$ 125.482,77	R\$ 258.194,67	33%
1.07.02	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	t	4208,22		1.376,31	1376,31	2831,91	2,24	R\$ 9.426,41		R\$ 3.082,93	R\$ 3.082,93	R\$ 6.343,48	33%
1.07.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	tkm	22724,39		7.432,07	7432,07	15292,32	0,43	R\$ 9.771,48		R\$ 3.195,79	R\$ 3.195,79	R\$ 6.575,69	33%
1.07.04	Locação de serviços de pavimentação	m2	8338,24			0,00	8338,24	1,14	R\$ 9.505,59		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.505,59	0%
1.07.05	Imprimação com asfalto diluído - Somente aplicação (SICRO - 4011351)	m²	8338,24			0,00	8338,24	0,45	R\$ 3.752,20		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.752,20	0%
1.07.06	Asfalto diluído de petróleo - CM-30 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/2025)	t	10,01			0,00	10,01	7747,54	R\$ 77.552,87		R\$ -	R\$ -	R\$ 77.552,87	0%
1.07.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	300,30			0,00	300,30	1,85	R\$ 555,55		R\$ -	R\$ -	R\$ 555,55	0%
1.07.08	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2742,74			0,00	2742,74	0,73	R\$ 2.002,20		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002,20	0%
1.07.09	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	8338,24			0,00	8338,24	1,56	R\$ 13.007,65		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.007,65	0%
1.07.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	100,20			0,00	100,20	1,85	R\$ 185,37		R\$ -	R\$ -	R\$ 185,37	0%
1.07.11	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	915,16			0,00	915,16	0,73	R\$ 668,06		R\$ -	R\$ -	R\$ 668,06	0%
1.07.12	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m3	250,15			0,00	250,15	1750,35	R\$ 437.850,05		R\$ -	R\$ -	R\$ 437.850,05	0%
1.07.13	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	t	600,36			0,00	600,36	2,24	R\$ 1.344,80		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,80	0%
1.07.14	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	7504,50			0,00	7504,50	2,03	R\$ 15.234,13		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.234,13	0%

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				DATA DE INICIO: 07/04/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026				PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026				CONTRATO: 22/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 29/04/2026				REPASSE: CR 953630/2023/MTUR			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1.07.15	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	5003,00			0,00	5003,00	0,81	R\$ 4.052,43		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.052,43	0%	
1.07.16	Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial (SICRO - 4011478)	t	400,22			0,00	400,22	189,34	R\$ 75.777,65		R\$ -	R\$ -	R\$ 75.777,65	0%	
1.07.17	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	5002,80			0,00	5002,80	2,03	R\$ 10.155,68		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.155,68	0%	
1.07.18	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	3335,20			0,00	3335,20	0,81	R\$ 2.701,51		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.701,51	0%	
1.07.19	Cimento Asfáltico - CAP 50/70 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/20 25)	t	22,01			0,00	22,01	5654,91	R\$ 124.464,56		R\$ -	R\$ -	R\$ 124.464,56	0%	
1.07.20	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	660,30			0,00	660,30	1,85	R\$ 1.221,55		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.221,55	0%	
1.07.21	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6030,74			0,00	6030,74	0,73	R\$ 4.402,44		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.402,44	0%	
1.07.22	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecção em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	3284,47			0,00	3284,47	55,43	R\$ 182.058,17		R\$ -	R\$ -	R\$ 182.058,17	0%	
1.07.23	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	3284,47			0,00	3284,47	11,46	R\$ 37.640,02		R\$ -	R\$ -	R\$ 37.640,02	0%	
1.07.24	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	3377,90			0,00	3377,90	53,91	R\$ 182.102,58		R\$ -	R\$ -	R\$ 182.102,58	0%	
1.08	PINTURA								R\$ 2.124,39		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.124,39	0%
1.08.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)		919,65			0,00	919,65	2,31	R\$ 2.124,39		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.124,39	0%	
1.09	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 35.064,82		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.064,82	0%
1.09.01	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrilicas por aspersão - espessura de 0,6 mm (SICRO - 5213413)	m2	337,79			0,00	337,79	84,64	R\$ 28.590,54		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.590,54	0%	
1.09.02	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção (SICRO - 5213418)	m2	5,50			0,00	5,50	554,00	R\$ 3.047,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.047,00	0%	

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				DATA DE INICIO: 07/04/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026				PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026				CONTRATO: 22/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 29/04/2026				REPASSE: CR 953630/2023/MTUR			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1.09.03	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - peli cula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implan tação (SICRO - 5213457)	un	8,00			0,00	8,00	428,41	R\$ 3.427,28		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.427,28	0%	
1.10	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								R\$ 6.359,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359,09	0%	
1.10.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	9351,61			0,00	9351,61	0,68	R\$ 6.359,09		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359,09	0%	
1.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS								R\$ 1.522,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,68	0%	
1.11.01	Marco Inaugural PMI	un	1,00			0,00	1,00	1522,68	R\$ 1.522,68		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,68	0%	
1.11.02	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	2590,38	R\$ 2.590,38		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.590,38	0%	
1.12	ADMINISTRAÇÃO								R\$ 72.759,60	R\$ -	R\$ 18.189,90	R\$ 18.189,90	R\$ 54.569,70	25%	
1.12.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	120,00		30,00	30,00	90,00	156,24	R\$ 18.748,80		R\$ 4.687,20	R\$ 4.687,20	R\$ 14.061,60	25%	
1.12.02	Encarregado geral com encargos complementares	h	480,00		120,00	120,00	360,00	40,50	R\$ 19.440,00		R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00	R\$ 14.580,00	25%	
1.12.03	Vigia diurno com encargos complementares	h	1320,00		330,00	330,00	990,00	26,19	R\$ 34.570,80		R\$ 8.642,70	R\$ 8.642,70	R\$ 25.928,10	25%	
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 2.107.271,33	R\$ -	R\$ 305.800,29	R\$ 305.800,29	R\$ 1.801.471,04	14,51%		
									0,00%	14,51%	14,51%	85,49%			

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.19 13:46:25 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 21/05/2026 09:28:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 305.800,29 (trezentos e cinco mil, oitocentos reais e vinte e nove centavos.).
DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____


Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 21/05/2026 09:37:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.05	ENSAIOS		
1.05.02	Ensaio - Limite de liquidez	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	un	un
	ensaios realizados	17,00	17,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		17,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		17,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		17,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		17,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.05	ENSAIOS		
1.05.03	Ensaio - Limite de plasticidade	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	un	un
	ensaios realizados	17,00	17,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		17,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		17,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		17,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		17,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.05	ENSAIOS		
1.05.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	un	un
	ensaios realizados	17,00	17,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		17,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		17,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		17,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		17,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE.**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.05	ENSAIOS		
1.05.05	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto)	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	un	un
	ensaios realizados	17,00	17,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		17,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		17,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		17,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		17,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND
1.06	TERRAPLANAGEM	
1.06.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	ÁREA TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m² m²
	ÁREA LEVANTADA DO TERRENO PARA LOCAÇÃO DE TERRAPLENAGEM	9.351,61 9.351,61
	EXECUTADO NO PERÍODO:	9.351,61
	ACUMULADO ANTERIOR:	0,00
	ACUMULADO ATUAL:	9.351,61
	SALDO A MEDIR:	0,00
	CONTRATO:	9.351,61
	A MEDIR NO PERÍODO:	9.351,61
		MEMORIA DE CÁLCULO

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO
ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.02	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m ²	m	m ³
		3.058,47	0,50	1.529,23
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.529,23
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.529,23
	SALDO A MEDIR:			3.146,58
	CONTRATO:			4.675,81
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.529,23
		MEMORIA DE CÁLCULO		

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA,
NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.03	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	QUANTITATIVO TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m³	T/M³	T
		1.529,23	1,50	2.293,85
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.293,85
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2.293,85
SALDO A MEDIR:				4.719,87
CONTRATO:				7.013,72
A MEDIR NO PERÍODO:				2.293,85
		MEMORIA DE CÁLCULO		

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 22/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO
CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.06	TERRAPLANAGEM		
1.06.05	Regularização do subleito - 100% Proctor Intermediário (SICRO - 4011209)		ÁREA TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m ²	m ²
	ÁREA LEVANTADA DO TERRENO PARA REGULARIZAÇÃO	9.351,61	9.351,61
	EXECUTADO NO PERÍODO:		9.351,61
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		9.351,61
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		9.351,61
	A MEDIR NO PERÍODO:		9.351,61
		MEMORIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

MEMORIA DE CÁLCULO

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 22/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
1.06	TERRAPLANAGEM				
1.06.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m³	t/m³	km	TXKM
		458,77	1,50	10,40	7.156,81
EXECUTADO NO PERÍODO:					7.156,81
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					7.156,81
SALDO A MEDIR:					14.725,93
CONTRATO:					21.882,74
A MEDIR NO PERÍODO:					7.156,81
		MEMORIA DE CÁLCULO			

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA,
NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.07	PAVIMENTAÇÃO			
1.07.01	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011275)	ÁREA TOTAL	ESPESSURA	VOLUME TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m²	m	m³
		3.058,47	0,30	917,54
EXECUTADO NO PERÍODO:				917,54
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				917,54
SALDO A MEDIR:				1.887,94
CONTRATO:				2.805,48
A MEDIR NO PERÍODO:				917,54
		MEMORIA DE CÁLCULO		

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA,
NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.07	PAVIMENTAÇÃO			
1.07.02	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	VOLUME TOTOAL	DENSIDADE	VOLUME TOTAL EM T
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m³	m	T
		917,54	1,50	1.376,31
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.376,31
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.376,31
	SALDO A MEDIR:			1.429,17
	CONTRATO:			2.805,48
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.376,31
		MEMORIA DE CÁLCULO		

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 22/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	PAVIMENTAÇÃO				
1.07.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m³	t/m³	km	TXKM
		917,54	1,50	5,40	7.432,07
	EXECUTADO NO PERÍODO:				7.432,07
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				7.432,07
	SALDO A MEDIR:				14.450,67
	CONTRATO:				21.882,74
	A MEDIR NO PERÍODO:				7.432,07
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO
CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 22/2026

REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.12	ADMINISTRAÇÃO		
1.12.02	Encarregado geral com encargos complementares	HORAS	TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		H
		120,00	120,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		120,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		120,00
	SALDO A MEDIR:		360,00
	CONTRATO:		480,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		120,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

gov.br

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMORIA DE CÁLCULO

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.19 10:30:32 -03'00'



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1ª MEDIÇÃO

EMPRESA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**SERVIÇO: OBJETO: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO
ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA, SERGIPE**

LOCAL: ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA

CONTRATO: 22/2026

OBJETO: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE.

LOCAL DA OBRA: CAJAÍBA - ITABAIANA-SE

CONTRATO: 22/2026



MEDIÇÃO 01

Período: 07/04/2026 a 28/04/2026

Data da medição: 29/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 01- Limpeza



FOTO 02-Escavação



FOTO 03-Escavação

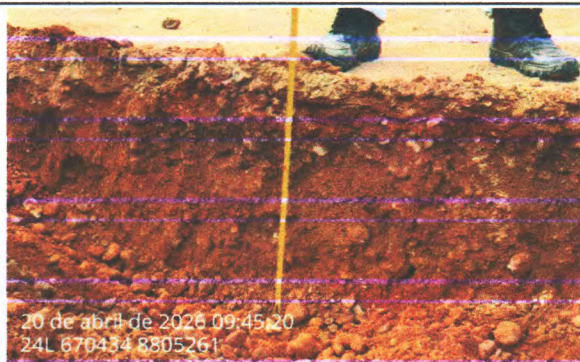


FOTO 04-Reforço do sub-leito



FOTO 05-Regularização



FOTO 06-Regularização



FOTO 07-Regularização



FOTO 08- Execução do colchão de areia



OBJETO: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE.

LOCAL DA OBRA: CAJAÍBA - ITABAIANA-SE

CONTRATO: 22/2026



MEDIÇÃO 01

Período: 07/04/2026 a 28/04/2026

Data da medição: 29/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 09- Execução da base



FOTO 10- Execução da base



FOTO 11-Execução da base



Documento assinado digitalmente



DIEGO OLIVEIRA BARROS

Data: 21/05/2026 09:28:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



JOAO VITOR REIS DOS SANTOS

Data: 21/05/2026 09:37:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415**

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.19 13:44:48 -03'00'
