




OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL			DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 171/2024			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			VIGÊNCIA 29/10/2025 EXECUÇÃO 01/05/2025				Período: 01/11/2024 a 11/11/2024							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 11/11/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS (POV. MANGUEIRA)													
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	343,06	2.058,36	0,00	2.058,36	2.058,36	0,00	100,00
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								1.491.345,30	0,00	205.098,45	205.098,45	1.286.246,85	13,75
02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	11.299,68	0,00	1.520,27	1.520,27	9.779,41	1,33	15.028,57	0,00	2.021,96	2.021,96	13.006,61	13,45
02.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	11.299,68	0,00	1.520,27	1.520,27	9.779,41	0,84	9.491,73	0,00	1.277,03	1.277,03	8.214,70	13,45
02.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	2.824,92	0,00	380,07	380,07	2.444,85	0,90	2.542,43	0,00	342,06	342,06	2.200,37	13,45
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.474,76	0,00	1.140,21	1.140,21	7.334,55	1,09	9.237,49	0,00	1.242,83	1.242,83	7.994,66	13,45
02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	11.299,68	0,00	1.520,27	1.520,27	9.779,41	109,51	1.237.427,96	0,00	166.484,77	166.484,77	1.070.943,19	13,45
02.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.117,55	0,00	442,60	442,60	1.674,95	39,56	83.770,28	0,00	17.509,26	17.509,26	66.261,02	20,90
02.007	Pintura de meio fio (calção)	m	2.117,55	0,00		0,00	2.117,55	3,66	7.750,23	0,00	0,00	0,00	7.750,23	0,00
02.008	Colchão de areia	m3	790,97	0,00	106,42	106,42	684,55	136,07	107.627,29	0,00	14.480,57	14.480,57	93.146,72	13,45
02.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11.864,66	0,00	1.596,30	1.596,30	10.268,36	1,09	12.932,48	0,00	1.739,97	1.739,97	11.192,51	13,45
02.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	11.299,68	0,00		0,00	11.299,68	0,49	5.536,84	0,00	0,00	0,00	5.536,84	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								40.954,50	0,00	5.460,60	5.460,60	35.493,90	13,33
03.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	150,00	0,00	20,00	20,00	130,00	146,23	21.934,50	0,00	2.924,60	2.924,60	19.009,90	13,33
03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	300,00	0,00	40,00	40,00	260,00	63,40	19.020,00	0,00	2.536,00	2.536,00	16.484,00	13,33
Total geral									1.534.358,16	0,00	212.617,41	212.617,41	1.321.740,75	13,86
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2024.11.11 18:03:27 -03'00' Engº Civil Paulo Cesar Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


 José Roberto Santos da Silva
 Eng. Civil - CREA 272829394
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL				MEMORIAL DE CALCULO BM 01		CONTRATO Nº 171/2024	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 11/11/2024			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS (POV. MANGUEIRA)						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	> 2,00m x 3,00m = 6,00m²			
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.520,27	163,10m² + 77,25m² + 241,50m² + 93,50m² + 58,22m² + 125,30m² + 82,00m² + 132,00m² + 118,00m² + 110,00m² + 112,00m² + 207,40m² = 1520,27m²			
02.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.520,27	163,10m² + 77,25m² + 241,50m² + 93,50m² + 58,22m² + 125,30m² + 82,00m² + 132,00m² + 118,00m² + 110,00m² + 112,00m² + 207,40m² = 1520,27m²			
02.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	380,07	1520,27m² x 0,25m = 380,07m³			
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.140,21	380,07m³ x 1,5t/m³ x 2,00 km = 1140,21tkm			
02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.520,27	163,10m² + 77,25m² + 241,50m² + 93,50m² + 58,22m² + 125,30m² + 82,00m² + 132,00m² + 118,00m² + 110,00m² + 112,00m² + 207,40m² = 1520,27m²			
02.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	442,60	442,60m			
02.008	Colchão de areia	m3	106,42	1520,27m² x 0,07m = 106,42m³			
02.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.596,30	106,42m³ x 1,5t/m³ x 10km = 1596,30tkm			
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
03.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,000	13,33% do contrato executado = 20,00h			
03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	40,000	13,33% do contrato executado = 40,00h			
PAULO CESAR LIMA Assinado de forma digital por JUNIOR:065248865 PAULO CESAR LIMA 00 JUNIOR:06524886500 Dados: 2024.12.24 09:39:30 -03'00'		Engº Civil Paulo Cesar Lima Junior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___			


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2705638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01


CONTRATO Nº
171/2024

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA




PLACA DA OBRA

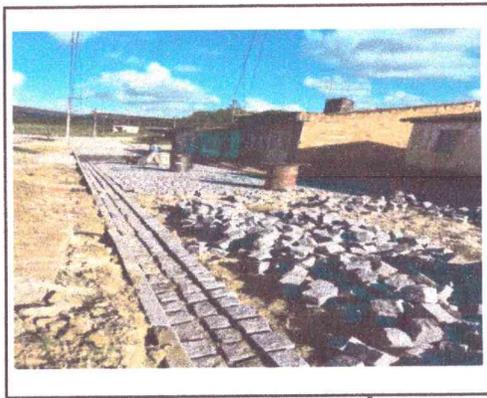


SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO




SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

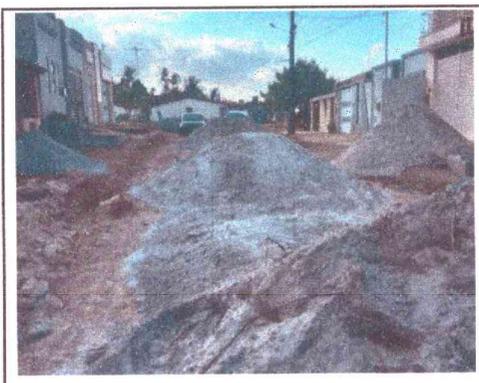

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

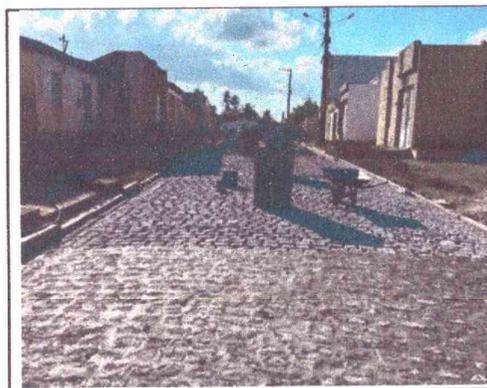

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

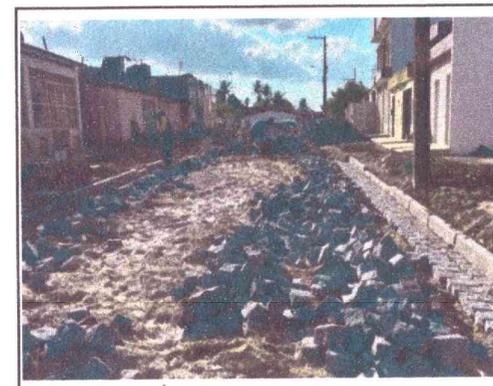

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

ELABORADO POR:

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2024.11.11
18:39:55 -03'00'

José Robson Santos de Pinho
Eng. Civil - CREA 2720293994
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2719638353
Coordenador de Núcleo

FOLHA 1 de 1
