


OBRA: MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 62/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			B.M.º. 01/2024					ORDEM DE SERVIÇO: 02/05/2024						
			PERÍODO: 02/05/2024 A 15/05/2024					DATA: 15/05/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>2.139,84</b>	-	<b>2.139,84</b>	<b>2.139,84</b>	-	<b>100,00</b>
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		<b>6,00</b>	6,00	-	R\$ 356,64	2.139,84	-	<b>2.139,84</b>	2.139,84	-	100,00
<b>03</b>	<b>MÓVIMENTAÇÕES DE SOLO</b>								<b>14.042,22</b>	-	<b>14.042,22</b>	<b>14.042,22</b>	-	<b>100,00</b>
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m3	560,00		<b>560,00</b>	560,00	-	R\$ 22,47	12.583,20	-	<b>12.583,20</b>	12.583,20	-	100,00
03.020	Coleta e carga manuais de entulho	m3	39,20		<b>39,20</b>	39,20	-	R\$ 37,22	1.459,02	-	<b>1.459,02</b>	1.459,02	-	100,00
<b>04</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>53.056,84</b>	-	<b>53.056,84</b>	<b>53.056,84</b>	-	<b>100,00</b>
04.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	560,00		<b>560,00</b>	560,00	-	R\$ 39,19	21.946,40	-	<b>21.946,40</b>	21.946,40	-	100,00
04.004	Execução de passeio (saída) ou piso de concreto com gererele moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af 08/2022	m3	42,00		<b>42,00</b>	42,00	-	R\$ 740,72	31.110,24	-	<b>31.110,24</b>	31.110,24	-	100,00
<b>08</b>	<b>PINTURA</b>								<b>13.028,56</b>	-	-	-	<b>13.028,56</b>	-
08.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m	1014,15				-	1.014,15	R\$ 4,42	4.482,54	-	-	-	4.482,54
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	102,00				-	102,00	R\$ 43,77	4.464,54	-	-	-	4.464,54
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	36,50				-	36,50	R\$ 14,24	519,76	-	-	-	519,76
08.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	201,00				-	201,00	R\$ 17,72	3.561,72	-	-	-	3.561,72
<b>11</b>	<b>PAISAGISMO</b>								<b>28.052,79</b>	-	-	-	<b>28.052,79</b>	-
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1292,16				-	1.292,16	R\$ 21,71	28.052,79	-	-	-	28.052,79
<b>12</b>	<b>ALAMBRADO/ESQUADRIAS</b>								<b>19.027,32</b>	-	<b>19.027,32</b>	<b>19.027,32</b>	-	<b>100,00</b>
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	204,00		<b>204,00</b>	204,00	-	R\$ 57,77	11.785,08	-	<b>11.785,08</b>	11.785,08	-	100,00
12.004	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	64,00		<b>64,00</b>	64,00	-	R\$ 113,16	7.242,24	-	<b>7.242,24</b>	7.242,24	-	100,00
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>3.022,92</b>	-	-	-	<b>3.022,92</b>	-
13.001	Limpeza geral	m2	560,00				-	560,00	R\$ 2,08	1.164,80	-	-	-	1.164,80
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00				-	1,00	R\$ 1.858,12	1.858,12	-	-	-	1.858,12
<b>14</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>6.525,00</b>	-	<b>4.245,60</b>	<b>4.245,60</b>	<b>2.279,40</b>	<b>65,07</b>
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00		<b>19,52</b>	19,52	10,48	R\$ 109,48	3.284,40	-	<b>2.137,05</b>	2.137,05	1.147,35	65,07
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00		<b>39,04</b>	39,04	20,96	R\$ 54,01	3.240,60	-	<b>2.108,55</b>	2.108,55	1.132,05	65,07
	<b>Total geral</b>								<b>138.895,29</b>	-	<b>92.511,62</b>	<b>92.511,62</b>	<b>46.383,67</b>	<b>66,61</b>

José Cristiano Silva Weber  
 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 2706685387

Atestamos que os serviços constantes na NF -  
 foram recebidos por nós em perfeita ordem.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



# MEMÓRIA DE CÁLCULO



CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:			
062/2024	MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVDADO BOM JARDIM			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022			
	3,00m x 2,00m = 6,00m <sup>2</sup>			
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01			
	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	
	35,00	16,00	560,00	
03.020	Coleta e carga manuais de entulho			
	ÁREA (m <sup>2</sup> )	ESP (m)	VOL (m <sup>3</sup> )	
	560,00	0,07	39,20	
04	PAVIMENTAÇÃO			
04.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado			
	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	
	35,00	16,00	560,00	
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022			
	ÁREA (m <sup>2</sup> )	ESP (m)	VOL (m <sup>3</sup> )	
	560,00	0,075	42,00	
12	ALAMBRADO/ESQUADRIAS			
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela			
	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	% de revisão
	35,00	16,00	4,000	50,00%
				ÁREA (m <sup>2</sup> ) - ((COMP + LARGURA X 2) X ALTURA X % DE REV.)
				204,00
12.004	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"			
	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	% de revisão	ÁREA (m <sup>2</sup> )
	16,00	4,000	100,00%	64,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (Acumulado até o período x engenheiro)/(Valor total do orçamento – administração local) (R\$ 88.266,02 x 30,00 h) / (R\$ 138.895,29 – R\$ 3.284,80) = 19,52h			
14.002	Mestre de obras com encargos complementares (Acumulado até o período x mestre) / (Valor total do orçamento – administração local) (R\$ 88.266,02 x 60,00 h) / (R\$ 138.895,29 – R\$ 3.240,60) = 39,04h			

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Favares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Cristiano Silva Weber  
Engenheiro Civil  
CREA. 2706685387



OBRA: MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-01



CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 062/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 15/05/2024



PLACA DE OBRA, REVISÃO DE ALAMBRADO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO



REVISÃO DE ALAMBRADO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO




REVISÃO DE ALAMBRADO, INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO E PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO



PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO



EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO

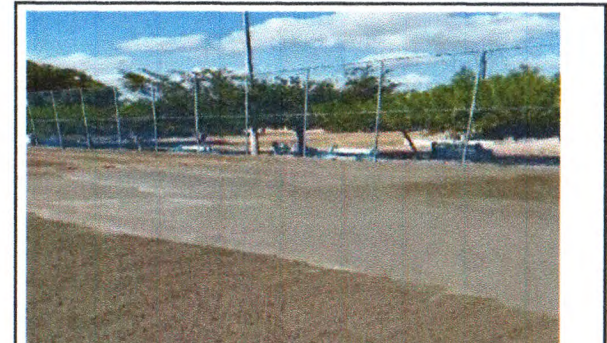

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO

ELABORADO POR:

\_\_\_\_\_

FISCALIZAÇÃO:

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo

Observações:

\_\_\_\_\_

José Cristiano Silva Weber  
Engenheiro Civil  
CREA. 2706685387



OBRA: MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO BOM JARDIM	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-01</b>	
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		CONTRATO Nº: 062/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 15/05/2024
 <p style="text-align: center;">DEMOLIÇÃO E CARGA DE ENTULHOS</p>		
ELABORADO POR:  <hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	FISCALIZAÇÃO:  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Prefeitura Municipal de Itabaiana <b>Yan Henrique Tavares Santana</b> Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo</p> </div> </div>	Observações:

José Cristiano Silva Weber  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 2706685387
