


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 171/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE			B.M.Nº. 01				ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026						
			PERÍODO: 08/06/2026 a 30/06/2026				DATA: 30/06/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.423,16	0,00	6.423,16	6.423,16	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	355,94	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	156,08		156,08	156,08	27,47	4.287,52	0,00	4.287,52	4.287,52	0,00	100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							4.433,90	0,00	755,08	755,08	3.678,83	17,03
02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	33,16		33,16	33,16	10,16	336,91	0,00	336,91	336,91	0,00	100,00
02.002	Demolição de concreto manualmente	m3	4,16		4,16	4,16	266,29	1.107,77	0,00	1.107,77	1.107,77	0,00	100,00
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	78,54		78,54	78,54	26,47	2.078,95	0,00	2.078,95	2.078,95	0,00	100,00
02.004	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	8,00		8,00	8,00	19,40	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	100,00
02.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,91		1,91	1,91	54,72	104,52	0,00	104,52	104,52	0,00	100,00
02.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	18,42		18,42	18,42	10,81	199,12	0,00	199,12	199,12	0,00	100,00
02.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	376,20		376,20	376,20	1,20	451,44	0,00	451,44	451,44	0,00	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO							17.872,78	0,00	12.524,41	12.524,41	5.348,36	70,08
03.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	33,16		33,16	33,16	44,38	1.471,64	0,00	1.471,64	1.471,64	0,00	100,00
03.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	1,28		1,28	1,28	774,92	991,90	0,00	991,90	991,90	0,00	100,00
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	124,54		80,00	80,00	120,08	14.954,76	0,00	9.606,40	9.606,40	5.348,36	64,24
03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	13,20		13,20	13,20	34,43	454,48	0,00	454,48	454,48	0,00	100,00
4	PINTURA							4.778,80	0,00	0,00	0,00	4.778,80	0,00
04.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	234,02		0,00	0,00	20,22	4.731,88	0,00	0,00	0,00	4.731,88	0,00
04.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	4,00		0,00	0,00	11,73	46,92	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00
5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							19.378,83	0,00	0,00	0,00	19.378,83	0,00
05.001	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	4,00		0,00	0,00	550,37	2.201,48	0,00	0,00	0,00	2.201,48	0,00
05.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00		0,00	0,00	333,63	667,26	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00
05.003	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00		0,00	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00
05.004	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00		0,00	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	0,00	0,00	8.944,94	0,00
05.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4". sercipark ou similar	un	1,00		0,00	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	0,00	0,00	3.859,06	0,00
6	PAISAGISMO							7.704,10	0,00	0,00	0,00	7.704,10	0,00
06.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	230,00		0,00	0,00	25,37	5.835,10	0,00	0,00	0,00	5.835,10	0,00
06.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00		0,00	0,00	37,38	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00
7	DIVERSOS							4.078,51	0,00	0,00	0,00	4.078,51	0,00
07.001	Limpeza geral	m2	822,42		0,00	0,00	2,42	1.990,26	0,00	0,00	0,00	1.990,26	0,00
07.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.542,80	0,00	885,70	885,70	2.657,10	25,00
8.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00		2,50	2,50	154,93	1.549,30	0,00	387,33	387,33	1.161,98	25,00
8.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	25,00		6,25	6,25	79,74	1.993,50	0,00	498,38	498,38	1.495,13	25,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA SAMPOLY ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 171/2026/PMI					
				B.M.Nº. 01				ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026					
				PERÍODO: 08/06/2026 a 30/06/2026				DATA: 30/06/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
TOTAL GERAL								68.212,88	0,00	20.588,35	20.588,35	47.624,53	30,18
CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439684-9			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 01 30/06/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO N°	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
171/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 = 3.00MX2,00: 6,00 M2
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto = 56,08m+25,00m+50,00m+25,00m: 156,08 m
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado= 8,16m+15,00m+10,00m: 33,16m
02.002	Demolição de concreto manualmente= 41,6*1,00*0,10: 4,16m³
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01= 8,54m²+40,00m²+30m²: 78,54 m²
02.004	Remoção de banco de concreto pré-moldado: 2un+2un+2un+2un: 8un
02.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m= 19,1m*1,00m*0,10m: 1,91 m³
02.006	Carga manual de material de 1ª categoria= 184,2m²*0,10m: 18,42m³
02.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³= 37,62t*10km: 376,20tkm
03	PAVIMENTAÇÃO
3001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024= 8,16m+15,00m+10,00m: 33,16m
3002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022=12,8m*1,00m*0,10m: 1,28m³
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina= 30m²+20m²+30m²:80m²
03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm= 3,20m²+6,00m²+4,0m²: 13,20m²
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 2,50 h
10.002	Mestre de obras com encargos complementares = 6,25h

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 24/08/2026 15:19:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU
ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO
PRAÇA JUBAL CARVALHO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA


CONTRATO Nº: 171/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 30/06/2026



PLACA DE OBRA

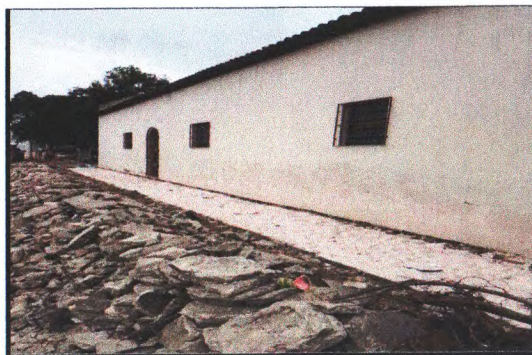

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO



REMOÇÃO DE BANCOS



PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO



PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO



REBOCO

ELABORADO POR:

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

[Signature]
MARCUS CARDOSO ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 270439694-9

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU
ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (
REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 171/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 30/06/2026



REMOÇÃO DE BANCOS



TAPUME



DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO



DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO



PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO



MEIO-FIO

ELABORADO POR:

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

Maria Gardenia Araújo Silva
MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

FISCALIZAÇÃO:

Observações:
