

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 09/2026		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME								B.M.Nº: 01				Data da medição: 02/03/2026		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 22/01/2026 a 27/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	EQUIPE ADMINISTRATIVA								29.993,60	0,00	3.899,17	3.899,17	26.094,43	13,00
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00		13,00	13,00	87,00	117,20	11.720,00	0,00	1.523,60	1.523,60	10.196,40	13,00
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00		26,00	26,00	174,00	59,96	11.992,00	0,00	1.558,96	1.558,96	10.433,04	13,00
01.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	320,00		41,60	41,60	278,40	19,63	6.281,60	0,00	816,61	816,61	5.464,99	13,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES								51.684,49	0,00	44.364,49	44.364,49	7.320,00	83,33
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00		12,00	12,00	0,00	313,97	3.767,64	0,00	3.767,64	3.767,64	0,00	100,00
02.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	225,00		225,00	225,00	0,00	164,32	36.972,00	0,00	36.972,00	36.972,00	0,00	100,00
02.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00		1,00	1,00	0,00	1.590,53	1.590,53	0,00	1.590,53	1.590,53	0,00	100,00
02.004	Ligação Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00		1,00	1,00	0,00	570,32	570,32	0,00	570,32	570,32	0,00	100,00
02.005	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00		1,00	1,00	5,00	1.464,00	8.784,00	0,00	1.464,00	1.464,00	7.320,00	16,67
03	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA								12.020,08	0,00	12.020,08	12.020,08	0,00	100,00
03.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	138,54		138,54	138,54	0,00	9,51	1.317,52	0,00	1.317,52	1.317,52	0,00	100,00
03.002	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	17,86		17,86	17,86	0,00	45,58	814,06	0,00	814,06	814,06	0,00	100,00
03.003	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	30,35		30,35	30,35	0,00	94,91	2.880,52	0,00	2.880,52	2.880,52	0,00	100,00
03.004	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	14,59		14,59	14,59	0,00	94,91	1.384,74	0,00	1.384,74	1.384,74	0,00	100,00
03.005	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.373,40		1.373,40	1.373,40	0,00	1,80	2.472,12	0,00	2.472,12	2.472,12	0,00	100,00
03.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	81,21		81,21	81,21	0,00	10,18	826,72	0,00	826,72	826,72	0,00	100,00
03.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.192,83		2.192,83	2.192,83	0,00	1,06	2.324,40	0,00	2.324,40	2.324,40	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO								108.014,72	0,00	15.564,16	15.564,16	92.450,56	51,84
04.001	LOCAÇÃO OBRA								1.209,47	0,00	1.209,47	1.209,47	0,00	100,00
04.001.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.015,78		2.015,78	2.015,78	0,00	0,60	1.209,47	0,00	1.209,47	1.209,47	0,00	100,00
04.002	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO								106.805,25	0,00	14.354,69	14.354,69	92.450,56	3,67
04.003	PISO CONCRETO DESEMPOLADO								39.555,56	0,00	14.354,69	14.354,69	25.200,87	22,00
04.003.001	Lona plástica preta	m2	386,86		116,06	116,06	270,80	5,58	2.158,68	0,00	647,61	647,61	1.511,07	30,00
04.003.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	386,86		116,06	116,06	270,80	51,61	19.965,84	0,00	5.989,86	5.989,86	13.975,98	30,00
04.003.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	428,14		214,07	214,07	214,07	36,05	15.434,45	0,00	7.717,22	7.717,22	7.717,23	50,00
04.003.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	428,14			0,00	428,14	3,78	1.618,37	0,00	0,00	0,00	1.618,37	0,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vicente Matheus Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 09/2026			
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME							B.M.Nº: 01				Data da medição: 02/03/2026			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 22/01/2026 a 27/02/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
04.003.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00			0,00	1,00	378,22	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22	0,00
04.004	PISO AZUL								9.155,19	0,00	0,00	0,00	9.155,19	0,00
04.004.001	Lona plástica preta	m2	103,32			0,00	103,32	5,58	576,53	0,00	0,00	0,00	576,53	0,00
04.004.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	103,32			0,00	103,32	74,81	7.729,37	0,00	0,00	0,00	7.729,37	0,00
04.004.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	103,32			0,00	103,32	8,22	849,29	0,00	0,00	0,00	849,29	0,00
04.005	PISO (PALCO)								6.938,11	0,00	0,00	0,00	6.938,11	0,00
04.005.001	Lona plástica preta	m2	42,20			0,00	42,20	5,58	235,48	0,00	0,00	0,00	235,48	0,00
04.005.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	42,20			0,00	42,20	74,81	3.156,98	0,00	0,00	0,00	3.156,98	0,00
04.005.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	2,73			0,00	2,73	76,40	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57	0,00
04.005.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	3,27			0,00	3,27	10,18	33,29	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00
04.005.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	4,67			0,00	4,67	19,57	91,39	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00
04.005.006	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m2	10,23			0,00	10,23	271,89	2.781,43	0,00	0,00	0,00	2.781,43	0,00
04.005.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	52,43			0,00	52,43	8,22	430,97	0,00	0,00	0,00	430,97	0,00
04.006	ESPAÇO AREIA								2.957,09	0,00	0,00	0,00	2.957,09	0,00
04.006.001	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	157,37			0,00	157,37	6,85	1.077,98	0,00	0,00	0,00	1.077,98	0,00
04.006.002	Colchão de areia	m3	15,73			0,00	15,73	119,46	1.879,11	0,00	0,00	0,00	1.879,11	0,00
04.007	PISO INTERTRAVADO VERMELHO								39.674,37	0,00	0,00	0,00	39.674,37	0,00
04.007.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af. 10/2022	m2	362,82			0,00	362,82	109,35	39.674,37	0,00	0,00	0,00	39.674,37	0,00
04.008	PISO INTERTRAVADO AMARELO								8.524,93	0,00	0,00	0,00	8.524,93	0,00
04.008.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af. 10/2022	m2	77,96			0,00	77,96	109,35	8.524,93	0,00	0,00	0,00	8.524,93	0,00
05	QUADRA								198.122,24	0,00	10.313,57	10.313,57	187.808,67	14,29
05.001	PISO QUADRA								67.176,08	0,00	0,00	0,00	67.176,08	0,00
05.001.001	Lona plástica preta	m2	431,41			0,00	431,41	5,58	2.407,27	0,00	0,00	0,00	2.407,27	0,00
05.001.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	431,41			0,00	431,41	16,32	7.040,61	0,00	0,00	0,00	7.040,61	0,00
05.001.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 2,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	431,41			0,00	431,41	34,62	14.935,41	0,00	0,00	0,00	14.935,41	0,00

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 09/2026			
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME							B.M.Nº: 01				Data da medição: 02/03/2026			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 22/01/2026 a 27/02/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
05.001.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	431,41			0,00	431,41	63,23	27.278,05	0,00	0,00	0,00	27.278,05	0,00
05.001.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	431,41			0,00	431,41	33,29	14.361,64	0,00	0,00	0,00	14.361,64	0,00
05.001.006	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	130,00			0,00	130,00	8,87	1.153,10	0,00	0,00	0,00	1.153,10	0,00
05.002	ALAMBRADO E MURETA								130.946,16	0,00	10.313,57	10.313,57	120.632,59	28,57
05.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	11,60		11,60	11,60	0,00	76,40	886,24	0,00	886,24	886,24	0,00	100,00
05.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,92		13,92	13,92	0,00	10,18	141,71	0,00	141,71	141,71	0,00	100,00
05.002.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	13,20		13,20	13,20	0,00	50,93	672,28	0,00	672,28	672,28	0,00	100,00
05.002.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	17,86		17,86	17,86	0,00	482,27	8.613,34	0,00	8.613,34	8.613,34	0,00	100,00
05.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	25,78			0,00	25,78	49,09	1.265,54	0,00	0,00	0,00	1.265,54	0,00
05.002.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,81			0,00	2,81	2.252,50	6.329,52	0,00	0,00	0,00	6.329,52	0,00
05.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	109,07			0,00	109,07	35,92	3.917,79	0,00	0,00	0,00	3.917,79	0,00
05.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	109,07			0,00	109,07	6,06	660,96	0,00	0,00	0,00	660,96	0,00
05.002.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	109,07			0,00	109,07	43,55	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
05.002.010	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	2,88			0,00	2,88	711,75	2.049,84	0,00	0,00	0,00	2.049,84	0,00
05.002.011	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	383,84			0,00	383,84	239,42	91.898,97	0,00	0,00	0,00	91.898,97	0,00
05.002.012	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	31,25			0,00	31,25	26,77	836,56	0,00	0,00	0,00	836,56	0,00
05.002.013	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	10,02			0,00	10,02	7,32	73,35	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00
05.002.014	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	483,61			0,00	483,61	18,30	8.850,06	0,00	0,00	0,00	8.850,06	0,00
06	ARQUIBANCADA								12.549,11	0,00	0,00	0,00	12.549,11	0,00
06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	7,38			0,00	7,38	76,40	563,83	0,00	0,00	0,00	563,83	0,00
06.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,86			0,00	8,86	10,18	90,19	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vicente Matheus Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 09/2026			
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME							B.M.Nº: 01				Data da medição: 02/03/2026			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 22/01/2026 a 27/02/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
06.003	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m2	34,26			0,00	34,26	271,89	9.314,95	0,00	0,00	0,00	9.314,95	0,00
06.004	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	5,36			0,00	5,36	19,57	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90	0,00
06.005	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	28,94			0,00	28,94	6,06	175,38	0,00	0,00	0,00	175,38	0,00
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	28,94			0,00	28,94	35,92	1.039,52	0,00	0,00	0,00	1.039,52	0,00
06.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	28,94			0,00	28,94	43,55	1.260,34	0,00	0,00	0,00	1.260,34	0,00
07	PAISAGISMO								17.972,19	0,00	0,00	0,00	17.972,19	0,00
07.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	389,60			0,00	389,60	29,06	11.321,78	0,00	0,00	0,00	11.321,78	0,00
07.002	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	17,00			0,00	17,00	136,49	2.320,33	0,00	0,00	0,00	2.320,33	0,00
07.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	78,00			0,00	78,00	35,27	2.751,06	0,00	0,00	0,00	2.751,06	0,00
07.004	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	8,00			0,00	8,00	97,27	778,16	0,00	0,00	0,00	778,16	0,00
07.005	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	23,00			0,00	23,00	34,82	800,86	0,00	0,00	0,00	800,86	0,00
08	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS								34.583,94	0,00	0,00	0,00	34.583,94	0,00
08.001	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00			0,00	1,00	3.564,67	3.564,67	0,00	0,00	0,00	3.564,67	0,00
08.002	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	1,00			0,00	1,00	3.398,45	3.398,45	0,00	0,00	0,00	3.398,45	0,00
08.003	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00			0,00	1,00	8.860,91	8.860,91	0,00	0,00	0,00	8.860,91	0,00
08.004	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00			0,00	1,00	5.627,01	5.627,01	0,00	0,00	0,00	5.627,01	0,00
08.005	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00			0,00	1,00	5.934,03	5.934,03	0,00	0,00	0,00	5.934,03	0,00
08.006	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00			0,00	1,00	4.795,48	4.795,48	0,00	0,00	0,00	4.795,48	0,00


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27235922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vicente Mafreus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 01 Período: 22/01/2026 a 27/02/2026				CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 02/03/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
08.007	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	1,00			0,00	1,00	2.403,39	2.403,39	0,00	0,00	0,00	2.403,39	0,00
09	DIVERSOS								32.858,55	0,00	0,00	0,00	32.858,55	0,00
09.001	MOBILIARIO URBANO								6.062,56	0,00	0,00	0,00	6.062,56	0,00
09.001.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	25,62			0,00	25,62	189,01	4.842,44	0,00	0,00	0,00	4.842,44	0,00
09.001.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	305,03	1.220,12	0,00	0,00	0,00	1.220,12	0,00
09.001.003	MURETA LETREIRO								9.005,20	0,00	0,00	0,00	9.005,20	0,00
09.001.004	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	20,36			0,00	20,36	336,32	6.847,48	0,00	0,00	0,00	6.847,48	0,00
09.001.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	40,72			0,00	40,72	43,55	1.773,36	0,00	0,00	0,00	1.773,36	0,00
09.001.006	Letra em pvc expandido - fornecimento e instalação	un	12,00			0,00	12,00	32,03	384,36	0,00	0,00	0,00	384,36	0,00
09.002	PERGOLADO								11.280,50	0,00	0,00	0,00	11.280,50	0,00
09.002.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	51,01			0,00	51,01	206,24	10.520,30	0,00	0,00	0,00	10.520,30	0,00
09.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	51,02			0,00	51,02	14,90	760,20	0,00	0,00	0,00	760,20	0,00
09.003	ARTIGOS ESPORTIVOS								6.510,29	0,00	0,00	0,00	6.510,29	0,00
09.003.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00			0,00	1,00	3.479,66	3.479,66	0,00	0,00	0,00	3.479,66	0,00
09.003.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	1,00			0,00	1,00	3.030,63	3.030,63	0,00	0,00	0,00	3.030,63	0,00
10	INSTAÇÕES ELETRICAS								157.676,25	0,00	0,00	0,00	157.676,25	0,00
10.001	PADRÃO ENTRADA								3.897,05	0,00	0,00	0,00	3.897,05	0,00
10.001.001	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	31,00			0,00	31,00	49,89	1.546,59	0,00	0,00	0,00	1.546,59	0,00
10.001.002	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00			0,00	1,00	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00
10.001.003	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	10,00			0,00	10,00	33,17	331,70	0,00	0,00	0,00	331,70	0,00
10.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	8,00			0,00	8,00	3,48	27,84	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00
10.001.005	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril, Rev 03	un	1,00			0,00	1,00	433,28	433,28	0,00	0,00	0,00	433,28	0,00
10.001.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			0,00	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10.001.007	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00			0,00	2,00	14,79	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00


Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 01 Período: 22/01/2026 a 27/02/2026				CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 02/03/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
10.001.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			0,00	1,00	379,07	379,07	0,00	0,00	0,00	379,07	0,00
10.001.009	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	1,00			0,00	1,00	344,25	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25	0,00
10.001.010	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	62,00			0,00	62,00	9,56	592,72	0,00	0,00	0,00	592,72	0,00
10.001.011	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00			0,00	2,00	52,63	105,26	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00
10.001.012	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00			0,00	1,00	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00
10.002	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA								142.608,21	0,00	0,00	0,00	142.608,21	0,00
10.002.001	Luminária Decorativa, IP66, IK08, bivolto, 80w, 10.400lm, distribuição luminosa simétrica, fixação em topo de poste 60,3mm, conforme projeto, fornecimento e instalação	un	30,00			0,00	30,00	2.244,86	67.345,80	0,00	0,00	0,00	67.345,80	0,00
10.002.002	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	30,00			0,00	30,00	1.581,49	47.444,70	0,00	0,00	0,00	47.444,70	0,00
10.002.003	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00			0,00	3,00	46,45	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35	0,00
10.002.004	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00			0,00	12,00	127,10	1.525,20	0,00	0,00	0,00	1.525,20	0,00
10.002.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	35,00			0,00	35,00	146,77	5.136,95	0,00	0,00	0,00	5.136,95	0,00
10.002.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	30,00			0,00	30,00	115,86	3.475,80	0,00	0,00	0,00	3.475,80	0,00
10.002.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	480,00			0,00	480,00	9,56	4.588,80	0,00	0,00	0,00	4.588,80	0,00
10.002.008	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	284,00			0,00	284,00	8,43	2.394,12	0,00	0,00	0,00	2.394,12	0,00
10.002.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	240,00			0,00	240,00	16,15	3.876,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00
10.002.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	80,00			0,00	80,00	2,95	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00
10.002.011	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	29,00			0,00	29,00	6,79	196,91	0,00	0,00	0,00	196,91	0,00
10.002.012	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	4,00			0,00	4,00	1.095,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
10.002.013	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1700mm	un	4,00			0,00	4,00	178,44	713,76	0,00	0,00	0,00	713,76	0,00
10.002.014	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento	m	76,00			0,00	76,00	7,60	577,60	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00
10.002.015	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	40,00			0,00	40,00	8,88	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00
10.002.016	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	13,00			0,00	13,00	1,86	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00
10.002.017	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4,00			0,00	4,00	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
10.002.018	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	12,00			0,00	12,00	3,48	41,76	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00
10.002.019	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	4,00			0,00	4,00	22,32	89,28	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00
10.002.020	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	2,00			0,00	2,00	10,97	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00
10.002.021	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00			0,00	2,00	11,53	23,06	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 01 Período: 22/01/2026 a 27/02/2026				CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 02/03/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.003	INTERNET PÚBLICA								2.408,79	0,00	0,00	0,00	2.408,79	0,00
10.003.001	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00			0,00	1,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
10.003.002	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	1,00			0,00	1,00	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00
10.003.003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00			0,00	1,00	46,51	46,51	0,00	0,00	0,00	46,51	0,00
10.003.004	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			0,00	1,00	379,07	379,07	0,00	0,00	0,00	379,07	0,00
10.003.005	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	80,00			0,00	80,00	7,60	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
10.003.006	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00			0,00	1,00	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00
10.003.007	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	10,00			0,00	10,00	16,02	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00
10.003.008	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00			0,00	1,00	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00
10.003.009	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	3,00			0,00	3,00	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00
10.004	SERVIÇOS FINAIS								8.762,20	0,00	0,00	0,00	8.762,20	0,00
10.004.001	MARCO INAUGURAL H=1,80m, base 1,20x0,75 cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA- EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	1,00			0,00	1,00	4.186,38	4.186,38	0,00	0,00	0,00	4.186,38	0,00
10.004.002	Limpeza geral	m2	2.015,78			0,00	2.015,78	2,27	4.575,82	0,00	0,00	0,00	4.575,82	0,00
TOTAIS									655.475,17	0,00	86.161,47	86.161,47	569.313,70	13,14%
PERCENTUAL									100,00%	0,00%	13,14%	13,14%	86,86%	
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:							APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:					

José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 01 Período: 22/01/2026 a 27/02/2026	CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 02/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO				
01	EQUIPE ADMINISTRATIVA			
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: $13,00\% \times 100,00h = 13,00h$	
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: $13,00\% \times 200,00h = 26,00h$	
01.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: $13,00\% \times 320,00h = 41,60h$	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	Área total: $3,00m \times 4,00m = 12,00m^2$	
02.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	Comprimento total: 225,00m	
02.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive	un	Quantidade total: 1,00und	
02.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	Quantidade total: 1,00und	
02.005	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	Quantidade total: 1,00 mês	
03	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA			
03.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	Comprimento total: $22,10m + 16,00m + 5,14m + 9,04m + 1,40m + 72,31m + 12,55m = 138,54m$	
03.002	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	Volume total: $(24,30m \times 0,40m \times 0,50m) + (65,00m \times 0,40m \times 0,50m) = 4,86m^3 + 13,00m^3 = 17,86m^3$	
03.003	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	Volume total: $16,00m \times 27,10m \times 0,07m = 30,35m^3$	
03.004	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	Volume total: $(138,54m \times 1,00 \times 0,07m) + (50,00m \times 1,00 \times 0,07m) + (20,00m \times 1,00 \times 0,07m) = 9,69m^3 + 3,50m^3 + 1,40m^3 = 14,59m^3$	
03.005	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	Área total: $2.015,78m^2 - 642,38m^2 = 1.373,40m^2$ (medido em projeto)	
03.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	Volume total: $67,68m^3 \times 1,2$ (empolamento) = $81,21m^3$	
03.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	Transporte total: $81,21m^3 \times 1,5$ (densidade) $\times 18,00km = 2.192,83tkm$.	
04	PAVIMENTAÇÃO			
04.001	LOCAÇÃO OBRA			
04.001.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	Área total: 2.015,78m2 (medido em projeto)	
04.002	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO			
04.003	PISO CONCRETO DESEMPOLADO			
04.003.001	Lona plástica preta	m2	Área total: $78,42m \times 1,48m = 116,06m^2$	

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 01 Período: 22/01/2026 a 27/02/2026		CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 02/03/2026	
MEMORIAL DE CÁLCULO					
04.003.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	Área total: 78,42m x 1,48m = 116,06m2		
04.003.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	Comprimento total: 214,07m		
05	QUADRA				
05.002	ALAMBRADO E MURETA				
05.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	Volume total: 85,93m (comprimento) x 0,30m (largura) x 0,45m (profundidade) = 11,60m3		
05.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	Volume total: 11,60m3 x 1,2 (empolamento) = 13,92m3		
05.002.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	Volume total: 6,60m x 5,00m x 0,40m (espessura) = 13,20m3		
05.002.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	Volume total: (24,30m x 0,40m x 0,50m) + (65,00m x 0,40m x 0,50m) = 4,86m3 + 13,00m3 = 17,86m3		
 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Vicente Matheus Rocha Bezerra Engenheiro Civil CREA - SE 2707034703		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:		APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:	
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra					

José Arnaldo da N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obr: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026


B.M.Nº: 01

Período: 22/01/2026 a 27/02/2026

Data da medição: 02/03/2026




ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

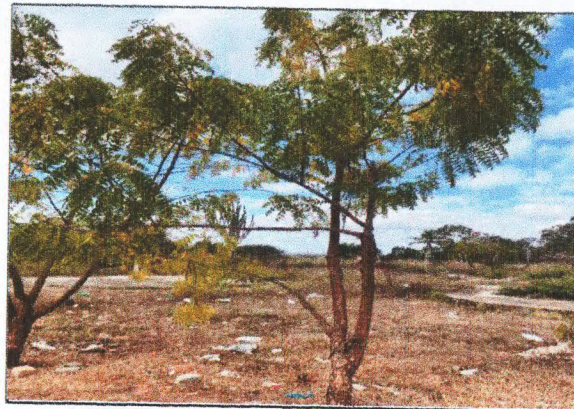

ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS




ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

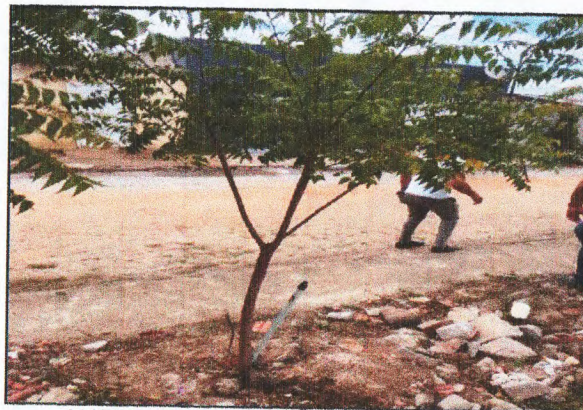

ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

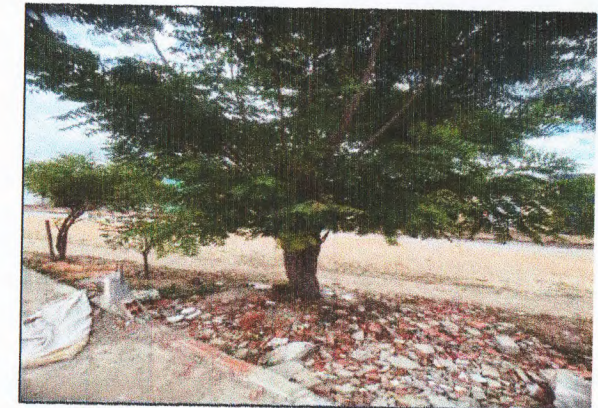

ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 01

Período: 22/01/2026 a 27/02/2026

Data da medição: 02/03/2026



PLACA DA OBRA



TAPUME METÁLICO



TAPUME METÁLICO E INST. DE ENERGIA



TAPUME METÁLICO E INST. DE ÁGUA



CONTAINER



DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

1999 Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS

Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 01

Período: 22/01/2026 a 27/02/2026

Data da medição: 02/03/2026



DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES



DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES



DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES



DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES



COLETA DO MATERIAL DEMOLIDO



COLETA DO MATERIAL DEMOLIDO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 01

Período: 22/01/2026 a 27/02/2026

Data da medição: 02/03/2026



REGULARIZAÇÃO MECANIZADA



REGULARIZAÇÃO E ATERRO



REGULARIZAÇÃO E ATERRO



REGULARIZAÇÃO E MEIO-FIO



MEIO-FIO E LOCAÇÃO DA PRAÇA



MEIO-FIO, ATERRO E LOCAÇÃO DA PRAÇA

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS

Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 09/2026

B.M.Nº: 01

Período: 22/01/2026 a 27/02/2026

Data da medição: 02/03/2026



MEIO-FIO, ATERRO E LOCAÇÃO DA PRAÇA



MEIO-FIO E LONA PLÁSTICA



LONA PLÁSTICA E PISO EM CONCRETO



LONA PLÁSTICA E PISO EM CONCRETO



ALVENARIA DE PEDRA DA MURETA



ALVENARIA DE PEDRA DA MURETA

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO QUEIMADAS Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 01 Período: 22/01/2026 a 27/02/2026	CONTRATO Nº: 09/2026 Data da medição: 02/03/2026
 ALVENARIA DE PEDRA DA MURETA	 ALVENARIA DE PEDRA DA MURETA	 ALVENARIA DE PEDRA DA MURETA
VICENTE MATHEUS ROCHA Assinado de forma digital por VICENTE MATHEUS ROCHA BEZERRA:00748836586 Dados: 2026.03.04 12:09:24 -03'00' CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: João Vitor Reis dos Santos Eng. Civil CREA 272335922-0 Coordenador de Nucleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:

José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
