


Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 194/2026		
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 13/07/2026		
CNPJ:	14.490.446/0001-56							Período: 01/06/2026 à 13/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
00.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								31.471,20	0,00	5.350,10	5.350,10	26.121,10	17,00%
00.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00		20,40	20,40	99,60	134,90	16.188,00	0,00	2.751,96	2.751,96	13.436,04	17,00%
00.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00		40,80	40,80	199,20	63,68	15.283,20	0,00	2.598,14	2.598,14	12.685,06	17,00%
00.002	SERVIÇOS PRELIMINARES								43.288,53	0,00	43.288,53	43.288,53	0,00	100,00%
00.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10,00		10,00	10,00	0,00	413,23	4.132,30	0,00	4.132,30	4.132,30	0,00	100,00%
00.002.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	206,27		206,27	206,27	0,00	189,83	39.156,23	0,00	39.156,23	39.156,23	0,00	100,00%
00.003	ESTACIONAMENTO								16.235,06	0,00	16.235,06	16.235,06	0,00	100,00%
00.003.001	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	226,62		226,62	226,62	0,00	71,64	16.235,06	0,00	16.235,06	16.235,06	0,00	100,00%
00.004	PASSEIO (CALÇADA)								11.839,70	0,00	8.000,81	8.000,81	3.838,89	
00.004.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	130,61		130,61	130,61	0,00	31,87	4.162,54	0,00	4.162,54	4.162,54	0,00	100,00%
00.004.002	Lona plástica preta	m2	130,61		65,30	65,30	65,31	6,33	826,76	0,00	413,34	413,34	413,42	50,00%
00.004.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	130,31		65,15	65,15	65,16	52,57	6.850,40	0,00	3.424,93	3.424,93	3.425,47	50,00%
00.005	MURO								130.048,60	0,00	20.799,39	20.799,39	109.249,21	15,99%
00.005.001	Demolição de reboco	m2	380,08		114,02	114,02	266,06	10,88	4.135,27	0,00	1.240,53	1.240,53	2.894,74	30,00%
00.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	380,08		114,02	114,02	266,06	42,33	16.088,79	0,00	4.826,46	4.826,46	11.262,33	30,00%
00.005.003	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m2	36,72		18,36	18,36	18,36	66,65	2.447,39	0,00	1.223,69	1.223,69	1.223,70	50,00%
00.005.004	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	36,72			0,00	36,72	224,39	8.239,60	0,00	0,00	0,00	8.239,60	0,00%
00.005.005	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	19,60		19,60	19,60	0,00	689,22	13.508,71	0,00	13.508,71	13.508,71	0,00	100,00%
00.005.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.549,06			0,00	1.549,06	51,25	79.389,32	0,00	0,00	0,00	79.389,32	0,00%
00.005.007	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zincado - R2	m2	208,54			0,00	208,54	9,15	1.908,14	0,00	0,00	0,00	1.908,14	0,00%
00.005.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	208,54			0,00	208,54	20,77	4.331,38	0,00	0,00	0,00	4.331,38	0,00%
00.006	ÁREA PISCINA								29.916,00	0,00	0,00	0,00	29.916,00	0,00%
00.006.001	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	m2	74,34			0,00	74,34	399,05	29.665,38	0,00	0,00	0,00	29.665,38	0,00%
00.006.002	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	3,00			0,00	3,00	83,54	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00%
00.007	CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA								80.173,72	0,00	11.153,77	11.153,77	69.019,95	13,91%
00.007.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,40		16,40	16,40	0,00	65,37	1.072,07	0,00	1.072,06	1.072,06	0,01	100,00%
00.007.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual, af_05/2021	m3	2,05		2,05	2,05	0,00	511,14	1.047,84	0,00	1.047,83	1.047,83	0,01	100,00%
00.007.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	13,20		13,20	13,20	0,00	577,69	7.625,51	0,00	7.625,50	7.625,50	0,01	100,00%
00.007.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	31,60		22,12	22,12	9,48	63,67	2.011,97	0,00	1.408,38	1.408,38	603,59	70,00%
00.007.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	63,20			0,00	63,20	42,33	2.675,26	0,00	0,00	0,00	2.675,26	0,00%
00.007.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	63,20			0,00	63,20	51,25	3.239,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	0,00%


 João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA-272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA-272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)							BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 194/2026			
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01			Data da medição: 13/07/2026			
CNPJ:	14.490.446/0001-56							Período: 01/06/2026 à 13/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
00.007.007	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	42,00			0,00	42,00	762,17	32.011,14	0,00	0,00	0,00	32.011,14	0,00%
00.007.008	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,30			0,00	0,30	610,72	183,22	0,00	0,00	0,00	183,22	0,00%
00.007.009	Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m, da Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14 verde de amarração e instalação	m	213,77			0,00	213,77	60,49	12.930,95	0,00	0,00	0,00	12.930,95	0,00%
00.007.010	Dreno espinha de peixe (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões, af_07/2021	m	65,30			0,00	65,30	86,82	5.669,35	0,00	0,00	0,00	5.669,35	0,00%
00.007.011	Colchão de areia	m3	74,90			0,00	74,90	136,97	10.259,05	0,00	0,00	0,00	10.259,05	0,00%
00.007.012	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00			0,00	1,00	1.149,31	1.149,31	0,00	0,00	0,00	1.149,31	0,00%
00.007.013	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00			0,00	1,00	299,05	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05	0,00%
00.008	CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA (FUNDO DO GINÁSIO)								99.910,24	0,00	0,00	0,00	99.910,24	0,00%
00.008.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.002,16			0,00	2.002,16	5,46	10.931,79	0,00	0,00	0,00	10.931,79	0,00%
00.008.002	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	741,24			0,00	741,24	120,04	88.978,45	0,00	0,00	0,00	88.978,45	0,00%
00.009	CANTEIRO (PRAÇA)								20.625,07	0,00	0,00	0,00	20.625,07	0,00%
00.009.001	Lona plástica preta	m2	141,07			0,00	141,07	6,33	892,97	0,00	0,00	0,00	892,97	0,00%
00.009.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	141,07			0,00	141,07	52,57	7.416,05	0,00	0,00	0,00	7.416,05	0,00%
00.009.003	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00			0,00	2,00	1.147,77	2.295,54	0,00	0,00	0,00	2.295,54	0,00%
00.009.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	28,20			0,00	28,20	43,56	1.228,39	0,00	0,00	0,00	1.228,39	0,00%
00.009.005	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	3,00			0,00	3,00	826,78	2.480,34	0,00	0,00	0,00	2.480,34	0,00%
00.009.006	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00			0,00	1,00	1.227,10	1.227,10	0,00	0,00	0,00	1.227,10	0,00%
00.009.007	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	5.084,68	5.084,68	0,00	0,00	0,00	5.084,68	0,00%
00.010	CANTEIRO LATERAL (LESTE)								6.609,41	0,00	0,00	0,00	6.609,41	0,00%
00.010.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	54,24			0,00	54,24	43,56	2.362,69	0,00	0,00	0,00	2.362,69	0,00%
00.010.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	51,20			0,00	51,20	37,35	1.912,32	0,00	0,00	0,00	1.912,32	0,00%
00.010.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	10,00			0,00	10,00	233,44	2.334,40	0,00	0,00	0,00	2.334,40	0,00%
00.011	PAVIMENTAÇÃO LATERAL (LESTE)								34.081,76	0,00	0,00	0,00	34.081,76	0,00%
00.011.001	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	283,92			0,00	283,92	120,04	34.081,76	0,00	0,00	0,00	34.081,76	0,00%
00.012	IRRIGAÇÃO CANTEIROS								9.231,74	0,00	0,00	0,00	9.231,74	0,00%
00.012.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,50			0,00	12,50	65,37	817,13	0,00	0,00	0,00	817,13	0,00%
00.012.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	208,38			0,00	208,38	16,14	3.363,25	0,00	0,00	0,00	3.363,25	0,00%
00.012.003	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	12,50			0,00	12,50	21,80	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00%

Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)								BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 194/2026			
Contratada: SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA								B.M.Nº: 01			Data da medição: 13/07/2026			
CNPJ: 14.490.446/0001-56								Período: 01/06/2026 à 13/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
00.012.004	Conector, cpvc, soldável, dn22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00			0,00	25,00	36,50	912,50	0,00	0,00	0,00	912,50	0,00%
00.012.005	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	25,00			0,00	25,00	128,58	3.214,50	0,00	0,00	0,00	3.214,50	0,00%
00.012.006	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	15,00			0,00	15,00	24,24	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00%
00.012.007	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	8,00			0,00	8,00	18,36	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00%
00.012.008	Junção 45º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00			0,00	2,00	14,64	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00%
00.012.009	Fornecimento de mangueira em polietileno linear de baixa densidade, perfurada a raio laser, para irrigação, com ø=28mm, ref. 1100/15, da Santeno ou similar	m	71,40			0,00	71,40	1,57	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00%
00.013	ÁREA VERDE								33.006,24	0,00	0,00	0,00	33.006,24	0,00%
00.013.001	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	7,00			0,00	7,00	806,40	5.644,80	0,00	0,00	0,00	5.644,80	0,00%
00.013.002	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un	4,00			0,00	4,00	116,82	467,28	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00%
00.013.003	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	8,00			0,00	8,00	116,82	934,56	0,00	0,00	0,00	934,56	0,00%
00.013.004	Planta - Manjêlo (syzygium cumini), fornecimento e plantio	un	1,00			0,00	1,00	116,82	116,82	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00%
00.013.005	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00			0,00	30,00	42,44	1.273,20	0,00	0,00	0,00	1.273,20	0,00%
00.013.006	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	657,82			0,00	657,82	37,35	24.569,58	0,00	0,00	0,00	24.569,58	0,00%
00.014	DRENAGEM								8.825,88	0,00	0,00	0,00	8.825,88	0,00%
00.014.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	36,63			0,00	36,63	20,77	760,81	0,00	0,00	0,00	760,81	0,00%
00.014.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	36,63			0,00	36,63	9,15	335,16	0,00	0,00	0,00	335,16	0,00%
00.014.003	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16"	m	24,42			0,00	24,42	316,54	7.729,91	0,00	0,00	0,00	7.729,91	0,00%
00.015	PISTA ATLETISMO / SALTO A DISTÂNCIA								22.131,30	0,00	0,00	0,00	22.131,30	
00.015.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	967,70			0,00	967,70	22,87	22.131,30	0,00	0,00	0,00	22.131,30	0,00%
01	GINÁSIO								899.399,32	0,00	149.435,25	149.435,25	749.964,07	16,62%
01.001	PISO								323.377,10	0,00	0,00	0,00	323.377,10	0,00%
01.001.001	Demolição de piso asfáltico (capa) em quadras de tênis de forma manual	m2	1.370,30			0,00	1.370,30	8,69	11.907,91	0,00	0,00	0,00	11.907,91	0,00%
01.001.002	Piso flexível de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou similar	m2	1.370,30			0,00	1.370,30	227,30	311.469,19	0,00	0,00	0,00	311.469,19	0,00%
01.002	COBERTURA								214.251,95	0,00	0,00	0,00	214.251,95	0,00%
01.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.752,04			0,00	1.752,04	20,77	36.389,87	0,00	0,00	0,00	36.389,87	0,00%
01.002.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	1.752,04			0,00	1.752,04	9,15	16.031,17	0,00	0,00	0,00	16.031,17	0,00%
01.002.003	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	700,81			0,00	700,81	4,77	3.342,86	0,00	0,00	0,00	3.342,86	0,00%
01.002.004	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	700,81			0,00	700,81	223,39	156.553,95	0,00	0,00	0,00	156.553,95	0,00%
01.002.005	Limpeza de calha de zinco	m	88,72			0,00	88,72	21,80	1.934,10	0,00	0,00	0,00	1.934,10	0,00%
01.003	VEDAÇÃO								53.041,83	0,00	53.041,81	53.041,81	0,02	100,00%
01.003.001	Remoção de brises	m2	79,20		79,20	79,20	0,00	4,33	342,94	0,00	342,93	342,93	0,01	100,00%
01.003.002	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	m2	79,20		79,20	79,20	0,00	665,39	52.698,89	0,00	52.698,88	52.698,88	0,01	100,00%
01.004	PARADE INTERNA								30.919,37	0,00	0,00	0,00	30.919,37	0,00%
01.004.001	Demolição de reboco	m2	136,80			0,00	136,80	10,88	1.488,38	0,00	0,00	0,00	1.488,38	0,00%
01.004.002	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2				0,00	136,80	37,90	5.184,72	0,00	0,00	0,00	5.184,72	0,00%

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 194/2026		
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 13/07/2026		
CNPJ:	14.490.446/0001-56							Período: 01/06/2026 à 13/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.004.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores, Rev 03_04/2022	m2	492,51			0,00	492,51	49,23	24.246,27	0,00	0,00	0,00	24.246,27	0,00%
01.005L	PAREDE EXTERNA								37.276,47	0,00	0,00	0,00	37.276,47	0,00%
01.005.001L	Demolição de reboco	m2	167,50			0,00	167,50	10,88	1.822,40	0,00	0,00	0,00	1.822,40	0,00%
01.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	167,50			0,00	167,50	42,33	7.090,27	0,00	0,00	0,00	7.090,27	0,00%
01.005.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	553,44			0,00	553,44	51,25	28.363,80	0,00	0,00	0,00	28.363,80	0,00%
01.006L	ESQUADRIAS / PORTÕES GINÁSIO								5.292,72	0,00	0,00	0,00	5.292,72	0,00%
01.006.001L	Revisão de esquadria de ferro	m2	24,00			0,00	24,00	160,69	3.856,56	0,00	0,00	0,00	3.856,56	0,00%
01.006.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	48,00			0,00	48,00	20,77	996,96	0,00	0,00	0,00	996,96	0,00%
01.006.003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	48,00			0,00	48,00	9,15	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00%
01.007L	BANHEIROS QUADRA								6.180,26	0,00	3.021,25	3.021,25	3.159,01	48,89%
01.007.001L	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores, Rev 03_04/2022	m2	61,37		61,37	61,37	0,00	49,23	3.021,25	0,00	3.021,25	3.021,25	0,00	100,00%
01.007.002L	Revisão de esquadria de madeira	m2	7,56			0,00	7,56	118,03	892,31	0,00	0,00	0,00	892,31	0,00%
01.007.003L	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	9,54			0,00	9,54	142,22	1.356,78	0,00	0,00	0,00	1.356,78	0,00%
01.007.004L	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	15,12			0,00	15,12	60,18	909,92	0,00	0,00	0,00	909,92	0,00%
01.008L	ARQUIBANCADA QUADRA								2.975,34	0,00	0,00	0,00	2.975,34	0,00%
01.008.001L	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	21,00			0,00	21,00	9,15	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15	0,00%
01.008.002L	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,00			0,00	21,00	20,77	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17	0,00%
01.008.003L	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	39,00			0,00	39,00	60,18	2.347,02	0,00	0,00	0,00	2.347,02	0,00%
01.009L	TELA NYLON								22.739,86	0,00	971,48	971,48	21.768,38	4,27%
01.009.001L	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	899,52		899,52	899,52	0,00	1,08	971,48	0,00	971,48	971,48	0,00	100,00%
01.009.002L	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	899,52			0,00	899,52	24,20	21.768,38	0,00	0,00	0,00	21.768,38	0,00%
01.010L	GUARDA CORPO QUADRA								1.315,28	0,00	0,00	0,00	1.315,28	0,00%
01.010.001L	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	43,96			0,00	43,96	20,77	913,05	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00%
01.010.002L	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	43,96			0,00	43,96	9,15	402,23	0,00	0,00	0,00	402,23	0,00%
01.011L	ADMINISTRAÇÃO								4.631,01	0,00	3.656,80	3.656,80	974,21	78,96%
01.011.001L	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores, Rev 03_04/2022	m2	74,28		74,28	74,28	0,00	49,23	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80	0,00	100,00%
01.011.002L	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.011.003L	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.011.004L	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	3,33			0,00	3,33	142,22	473,59	0,00	0,00	0,00	473,59	0,00%
01.012L	SALA PROFESSORES								4.272,62	0,00	3.362,41	7.609,97	1.723,71	178,11%

Eng. Civil CREA-272345146-1
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Civil CREA-272345146-1
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:		REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 194/2026		
Contratada:		SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 13/07/2026		
CNPJ:		14.490.446/0001-56							Período: 01/06/2026 à 13/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
01.012.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	68,30		68,30	68,30	0,00	49,23	3.362,41	0,00	3.362,41	3.362,41	0,00	100,00%	
01.012.002	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%	
01.012.003	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.012.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,88			0,00	2,88	142,22	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00%	
01.013	SALA DOS PRIMEIROS SOCORROS								2.937,28	0,00	2.123,78	2.123,78	813,50	72,30%	
01.013.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	43,14		43,14	43,14	0,00	49,23	2.123,78	0,00	2.123,78	2.123,78	0,00	100,00%	
01.013.002	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%	
01.013.003	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.013.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,20			0,00	2,20	142,22	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88	0,00%	
01.014	VESTIÁRIO FEMININO								9.303,48	0,00	5.211,98	5.211,98	353,25	56,02%	
01.014.001	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00			0,00	4,00	38,74	154,96	0,00	0,00	0,00	154,96	0,00%	
01.014.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68			0,00	1,68	118,03	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29	0,00%	
01.014.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	5,22			0,00	5,22	142,22	742,39	0,00	0,00	0,00	742,39	0,00%	
01.014.004	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	3,24			0,00	3,24	862,24	2.793,66	0,00	0,00	0,00	2.793,66	0,00%	
01.014.005	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			0,00	3,36	60,18	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00%	
01.014.006	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	105,87		105,87	105,87	0,00	49,23	5.211,98	0,00	5.211,98	5.211,98	0,00	100,00%	
01.015	VESTIÁRIO ACESSÍVEL FEMININO								2.686,44	0,00	1.878,62	1.878,62	807,82	69,93%	
01.015.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	38,16		38,16	38,16	0,00	49,23	1.878,62	0,00	1.878,62	1.878,62	0,00	100,00%	
01.015.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.015.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,16			0,00	2,16	142,22	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00%	
01.015.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%	
01.016	VESTIÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO								2.686,44	0,00	1.878,62	1.878,62	807,82	69,93%	
01.016.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	38,16		38,16	38,16	0,00	49,23	1.878,62	0,00	1.878,62	1.878,62	0,00	100,00%	
01.016.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.016.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,16			0,00	2,16	142,22	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00%	
01.016.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%	
01.017	VESTIÁRIO MASCULINO								8.372,26	0,00	5.211,98	5.211,98	3.160,28	62,25%	
01.017.001	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00			0,00	4,00	38,74	154,96	0,00	0,00	0,00	154,96	0,00%	
01.017.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68			0,00	1,68	118,03	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29	0,00%	
01.017.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	5,22			0,00	5,22	142,22	742,39	0,00	0,00	0,00	742,39	0,00%	
01.017.004	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	2,16			0,00	2,16	862,24	1.862,44	0,00	0,00	0,00	1.862,44	0,00%	


Rykelme Mendonça de Jesus
 Eng. Civil CREA-272345146-1
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA-272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 194/2026		
Contratada: SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA								B.M.Nº: 01				Data da medição: 13/07/2026		
CNPJ: 14.490.446/0001-56								Período: 01/06/2026 à 13/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.017.005	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			0,00	3,36	60,18	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00%
01.017.006	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	105,87		105,87	105,87	0,00	49,23	5.211,98	0,00	5.211,98	5.211,98	0,00	100,00%
01.018	COPA								2.496,90	0,00	0,00	0,00	2.496,90	0,00%
01.018.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.018.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	1,35			0,00	1,35	142,22	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00%
01.018.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.018.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	36,65			0,00	36,65	49,23	1.804,28	0,00	0,00	0,00	1.804,28	0,00%
01.019	DEPOSITO								4.773,24	0,00	3.362,41	3.362,41	1.410,83	70,44%
01.019.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	4,20			0,00	4,20	118,03	495,73	0,00	0,00	0,00	495,73	0,00%
01.019.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,88			0,00	2,88	142,22	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00%
01.019.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	8,40			0,00	8,40	60,18	505,51	0,00	0,00	0,00	505,51	0,00%
01.019.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	68,30		68,30	68,30	0,00	49,23	3.362,41	0,00	3.362,41	3.362,41	0,00	100,00%
01.020	ACESSO MEZANINO								3.034,98	0,00	0,00	0,00	3.034,98	0,00%
01.020.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.020.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	0,72			0,00	0,72	142,22	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00%
01.020.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.020.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	49,40			0,00	49,40	49,23	2.431,96	0,00	0,00	0,00	2.431,96	0,00%
01.021	ESCADAS								4.559,75	0,00	0,00	0,00	4.559,75	0,00%
01.021.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	85,76			0,00	85,76	49,23	4.221,96	0,00	0,00	0,00	4.221,96	0,00%
01.021.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	11,29			0,00	11,29	9,15	103,30	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00%
01.021.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	11,29			0,00	11,29	20,77	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49	0,00%
01.022	MEZANINO								5.178,00	0,00	0,00	0,00	9.295,40	0,00%
01.022.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	84,82			0,00	84,82	49,23	4.175,69	0,00	0,00	0,00	4.175,69	0,00%
01.022.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	33,50			0,00	33,50	9,15	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00%
01.022.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	33,50			0,00	33,50	20,77	695,79	0,00	0,00	0,00	695,79	0,00%
01.023	APARELHOS ESPORTIVOS								2.344,27	0,00	0,00	0,00	2.344,27	0,00%
01.023.001	Revisão de esquadria de ferro	m2	10,44			0,00	10,44	160,69	1.677,60	0,00	0,00	0,00	1.677,60	0,00%
01.023.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	10,44			0,00	10,44	9,15	95,53	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00%

João Vitor Mendes Santos
 Eng. Civil CREA-27233592/0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 194/2026		
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 13/07/2026		
CNPJ:	14.490.446/0001-56							Período: 01/06/2026 à 13/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.023.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	10,44			0,00	10,44	20,77	216,84	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00%
01.023.004	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00			0,00	1,00	354,30	354,30	0,00	0,00	0,00	354,30	0,00%
01.024	SERVIÇOS FINAIS								8.118,23	0,00	0,00	0,00	12.510,02	0,00%
01.024.001	Limpeza geral	m2	2.002,16			0,00	2.002,16	2,89	5.786,24	0,00	0,00	0,00	5.786,24	0,00%
01.024.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	2.331,99	2.331,99	0,00	0,00	0,00	2.331,99	0,00%
01.025	REFORMA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA								136.634,24	0,00	65.714,11	65.714,11	70.920,13	48,09%
01.025.001	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	31,00		31,00	31,00	0,00	2.119,81	65.714,11	0,00	65.714,11	65.714,11	0,00	100,00%
01.025.002	Lâmpada led 80w, luz branca 6500k, TLN170 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar	un	24,00			0,00	24,00	202,13	4.851,12	0,00	0,00	0,00	4.851,12	0,00%
01.025.003	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	21,00			0,00	21,00	155,18	3.258,78	0,00	0,00	0,00	3.258,78	0,00%
01.025.004	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm,	un	2,00			0,00	2,00	360,75	721,50	0,00	0,00	0,00	721,50	0,00%
01.025.005	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação, af_04/2025	un	7,00			0,00	7,00	2.636,01	18.452,07	0,00	0,00	0,00	18.452,07	0,00%
01.025.006	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm,	un	12,00			0,00	12,00	257,92	3.095,04	0,00	0,00	0,00	3.095,04	0,00%
01.025.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.000,00			0,00	2.000,00	11,48	22.960,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00	0,00%
01.025.008	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	38,00			0,00	38,00	22,18	842,84	0,00	0,00	0,00	842,84	0,00%
01.025.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	38,00			0,00	38,00	154,96	5.888,48	0,00	0,00	0,00	5.888,48	0,00%
01.025.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	210,00			0,00	210,00	16,50	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00%
01.025.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	70,00			0,00	70,00	7,84	548,80	0,00	0,00	0,00	548,80	0,00%
01.025.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00			0,00	20,00	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00%
01.025.013	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,00			0,00	210,00	21,27	4.466,70	0,00	0,00	0,00	4.466,70	0,00%
01.025.014	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	20,00			0,00	20,00	10,85	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00%
01.025.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00			0,00	70,00	4,23	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10	0,00%
01.025.016	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	60,00			0,00	60,00	26,72	1.603,20	0,00	0,00	0,00	1.603,20	0,00%
01.025.017	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00			0,00	5,00	14,86	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00%
01.025.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	20,00			0,00	20,00	6,21	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00%
									1.476.793,77	0,00	254.262,91	254.262,91	1.222.530,86	17,22%
PERCENTUAL									100,00%	0,00%	17,22%	17,22%	82,78%	
 Documento assinado digitalmente LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 28/07/2026 10:54:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM DATA: ____ / ____ / ____						VALOR DA MEDIÇÃO:					
									R\$ 254.262,91					
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA														

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelle Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ sob nº 14.490.446/0001-56

Objeto:

REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE
(CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)

Contratada:

SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 194/2026

B.M.Nº: 01

Período: 01/06/2026 a 13/07/2026

Data da medição: 13/07/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

00.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
00.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,40					20,40	20,40
00.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	40,80					40,80	40,80
00.002	SEVIÇOS PRELIMINARES								
00.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	5,00		2,00				10,00
00.002.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m,	m	206,27						206,27
00.003	ESTACIONAMENTO								
00.003.001	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	32,37		7,00				226,62
00.004	PASSEIO (CALÇADA)								
00.004.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	108,84		1,20				130,61
00.004.002	Lona plástica preta	m2	54,42		1,20				65,30
00.004.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	54,29		1,20				65,15
00.005	MURO								
00.005.001	Demolição de reboco	m2	63,34		1,80				114,02
00.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	62,34		1,80				114,02
00.005.003	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m2	22,95		0,80				18,36

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Lykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

00.005.005	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	9,00		2,18					19,60
00.007	CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA									
00.007.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	68,33	0,30	0,80					16,40
00.007.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	97,62	0,30	0,07					2,05
00.007.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	60,27	0,30	0,73					13,20
00.007.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	44,12		0,50					22,12
01.003	VEDAÇÃO									
01.003.001	Remoção de brises	m2	15,84		5,00					79,20
01.003.002	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	m2	15,84		5,00					79,20
01.007	BANHEIROS QUADRA									
01.007.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	27,89		2,20					61,37
01.009	TELA NYLON									
01.009.001	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	44,97		20,00					899,52
01.011	ADMINISTRAÇÃO									
01.011.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	33,76		2,20					74,28
01.012	SALA PROFESSORES									
01.012.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	31,05		2,20					68,30
01.013	SALA DOS PRIMEIROS SOCORROS									

Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
 Eng. Civil CREA-272345146-1
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.013.001 □	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	19,61		2,20					43,14
01.014	VESTIÁRIO FEMININO									
01.014.006 □	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	48,12		2,20					105,87
01.015	VESTIÁRIO ACESSÍVEL FEMININO									
01.015.001 □	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	17,34		2,20					38,16
01.016	VESTIÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO									
01.016.001 □	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	17,34		2,20					38,16
01.017	VESTIÁRIO MASCULINO									
01.017.006 □	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	48,12		2,20					105,87
01.019	DEPÓSITO									
01.019.004 □	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	31,04		2,20					68,30
01.025	REFORMA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA									
01.025.001 □	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	31,00						31,00	31,00

D&C CONSTRUTORA LTDA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 28/07/2026 10:53:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 01


Ref.: Contrato 194/2026


Objeto: Boletim de Medição 01 referente aos Serviços de Engenharia para REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE) em Itabaiana/SE.

A Empresa SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob nº 14.490.446/0001-56, localizada a Rua José Freire, nº 588 – Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-410, representada pelo Sócio Alisson Figueiredo Santos Pinheiro, com o R.G. nº: 32509707 – SSP/SE e CPF nº: 019.082.885-40, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição nº 01 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 01/06/2026 até 13/07/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 01**.

1- PLACA DE OBRA;




Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



2- TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA;



3- REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (ESTACIONAMENTO);




João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboraia

Leandro Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboraia



4 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, LONA PLÁSTICA, PISO EM CONCRETO SIMPLES (PASSEIO (CALÇADA));

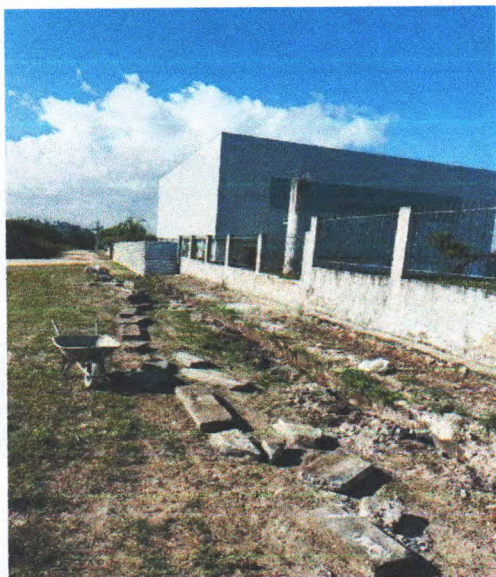

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**5 – DEMOLIÇÃO, REBOCO, REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE
ESQUADRIA DE FERRO, PORTÃO EM FERRO.**



João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




6 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE PEDRA CÁLCAREA, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA);



Rykelle Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Mendes dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

7 – REMOÇÃO DE BRISES, INSTALAÇÃO DE BRISES (VEDAÇÃO);

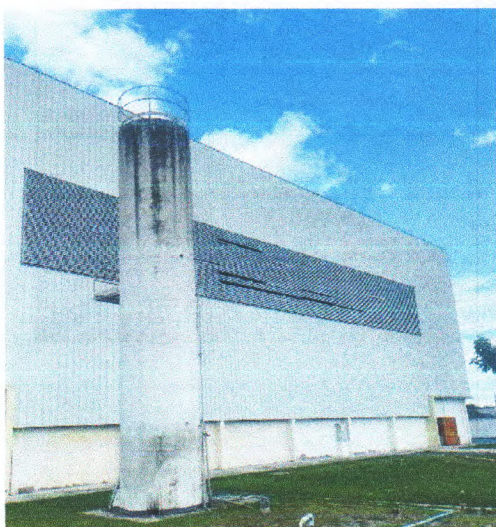


8 – PINTURAS PARA INTERIORES (BANHEIRO QUADRA, ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES, SALA DOS PRIMEIROS SOCORROS, VESTIÁRIO FEMININO, VESTIÁRIO ACESSÍVEL FEMININO, VESTIÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO, VESTIÁRIO MASCULINO, DÉPOSITO).



Rykelle
Rykelle Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





João Vitor
João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

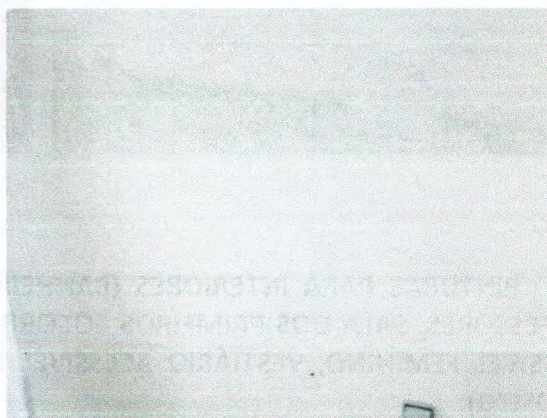

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



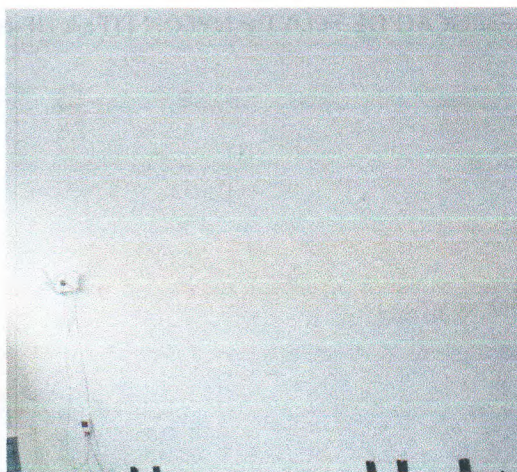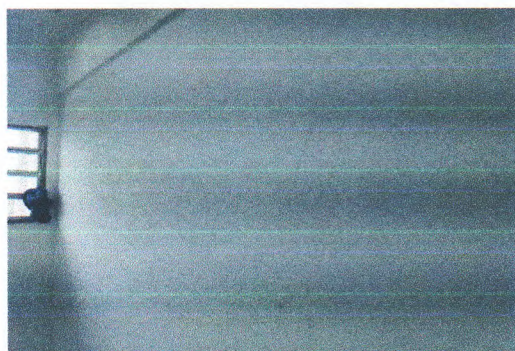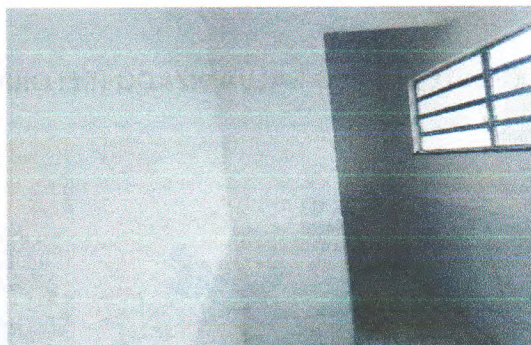


Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



9 – POSTE EM AÇO GALVANIZADO (REFORMA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA);

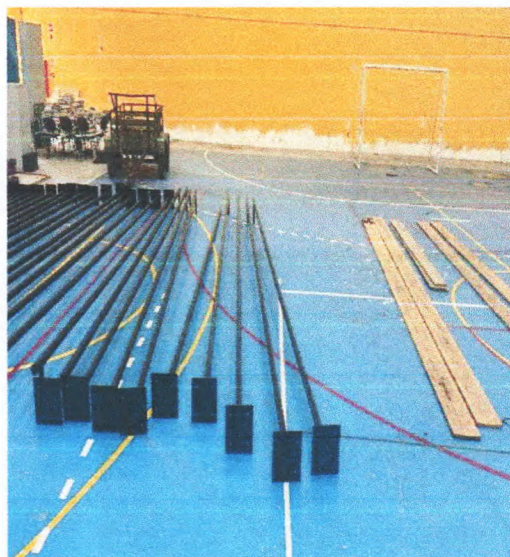

10 – REMOÇÃO DE TELA DE NYLON (TELA DE NYLON).



João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 277335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelma Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Itabaiana/SE, em 13 de julho de 2026.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

Data: 28/07/2026 10:53:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SE nº 270963955-6

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

