



CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana

CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 07.159.244/0001-60

OBRA: Conclusão dos serviços remanescentes da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Povoado

Agrovila

LOCAL: Itabaiana

CONTRATO Nº 363/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

MEDICÃO Nº.: 01

PERÍODO DA MEDICÃO: 24/11/2025

À

01/02/2026

DATA DA MEDICÃO: 02/02/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng.º Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	[%]	ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO 01			TOTAL ACUMULADO			SALDO DO CONTRATO		
							QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 7.640,75	4,84%	0,00	R\$ -	0,00%		R\$ 97.320,86	61,60%		R\$ 97.320,86	61,60%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,000	354,48	R\$ 2.835,84	1,79%	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 2.835,84	1,79%	8,00	R\$ 2.835,84	1,79%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
01.002	Limpeza geral	m2	191,57000	2,94	R\$ 563,22	0,36%	0,00	R\$ -	0,00%	191,57	R\$ 563,22	0,36%	191,57	R\$ 563,22	0,36%		R\$ 0,00	
01.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,000	702,94	R\$ 702,94	0,44%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 702,94	0,44%	1,00	R\$ 702,94	0,44%		R\$ 0,00	
01.004	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,000	2.063,93	R\$ 2.063,93	1,31%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2.063,93	1,31%	1,00	R\$ 2.063,93	1,31%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
01.005	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	274,64000	5,37	R\$ 1.474,82	0,93%	0,00	R\$ -	0,00%	274,64	R\$ 1.474,82	0,93%	274,64	R\$ 1.474,82	0,93%		R\$ 0,00	0,00%
02	ELEVACÃO				R\$ 864,64	0,55%	0,00	R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 864,64	0,55%
02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	4,5000	63,02000	R\$ 283,59	0,18%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	4,50	R\$ 283,59	0,18%
02.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	6,000	21,42000	R\$ 128,52	0,08%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 128,52	0,08%
02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,000	41,62000	R\$ 249,72	0,16%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 249,72	0,16%
02.004	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	1,000	202,81000	R\$ 202,81	0,13%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,13%
03	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 26.622,59	16,85%		R\$ -	0,00%		R\$ 10.722,60	6,79%	0,00	R\$ 10.722,60	6,79%	0,00	R\$ 15.899,98	10,06%
03.001	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	27,48000	166,29000	R\$ 4.566,32	2,89%	0,00	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 1.995,48	1,26%	12,00	R\$ 1.995,48	1,26%	15,46	R\$ 2.570,84	1,63%
03.002	Lona plástica preta	m2	195,35000	6,47000	R\$ 1.263,91	0,80%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	195,35	R\$ 1.263,91	0,80%
03.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	17,58000	558,36000	R\$ 9.815,97	6,21%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	17,58	R\$ 9.815,97	6,21%
03.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	62,89000	103,5000	R\$ 6.509,12	4,12%	0,00	R\$ -	0,00%	62,89	R\$ 6.509,12	4,12%	62,89	R\$ 6.509,12	4,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
03.005	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	44,99000	12,11000	R\$ 544,83	0,34%	0,00	R\$ -	0,00%	44,99	R\$ 544,83	0,34%	44,99	R\$ 544,83	0,34%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
03.006	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	2,000	1124,63000	R\$ 2.249,26	1,42%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.249,26	1,42%
03.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	44,99000	37,19000	R\$ 1.673,18	1,06%	0,00	R\$ -	0,00%	44,99	R\$ 1.673,18	1,06%	44,99	R\$ 1.673,18	1,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
04	REVESTIMENTO				R\$ 6.998,54	4,43%		R\$ -	0,00%		R\$ 6.998,53	4,43%	0,00	R\$ 6.998,53	4,43%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
04.001	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	20,07000	59,99000	R\$ 1.204,00	0,76%	0,00	R\$ -	0,00%	20,07	R\$ 1.204,00	0,76%	20,07	R\$ 1.204,00	0,76%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
04.002	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhasadeiras	m2	29,98000	3,2000	R\$ 95,94	0,06%	0,00	R\$ -	0,00%	29,98	R\$ 95,94	0,06%	29,98	R\$ 95,94	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
04.003	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	29,98000	4,24000	R\$ 127,12	0,08%	0,00	R\$ -	0,00%	29,98	R\$ 127,12	0,08%	29,98	R\$ 127,12	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
04.004	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhão, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	29,98000	185,84000	R\$ 5.571,48	3,53%	0,00	R\$ -	0,00%	29,98	R\$ 5.571,48	3,53%	29,98	R\$ 5.571,48	3,53%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
05	FORRO				R\$ 10.575,82	6,69%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 10.575,82	6,69%	0,00	R\$ 10.575,82	6,69%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	162,78000	64,97000	R\$ 10.575,82	6,69%	0,00	R\$ -	0,00%	162,78	R\$ 10.575,82	6,69%	162,78	R\$ 10.575,82	6,69%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
06	ESQUADRIAS				R\$ 26.782,69	16,95%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 25.180,15	15,94%	0,00	R\$ 25.180,15	15,94%	0,00	R\$ 1.602,54	1,01%
06.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, exclusive batentes e ferragens	un	3,000	776,87000	R\$ 2.330,61	1,48%	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 2.330,61	1,48%	3,00	R\$ 2.330,61	1,48%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
06.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento	un	4,000	896,55000	R\$ 3.586,20	2,27%	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 3.586,20	2,27%	4,00	R\$ 3.586,20	2,27%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
06.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento	un	8,000	1075,88000	R\$ 8.606,88	5,45%	0,00	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 7.531,02	4,77%	7,00	R\$ 7.531,02	4,77%	1,00	R\$ 1.075,86	0,68%
06.004	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	45,000	90,54000	R\$ 4.074,30	2,58%	0,00	R\$ -	0,00%	42,00	R\$ 3.802,68	2,41%	42,00	R\$ 3.802,68	2,41%	3,00	R\$ 271,62	0,17%
06.005	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	15,000	255,06000	R\$ 3.825,90	2,42%	0,00	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 3.570,84	2,26%	14,00	R\$ 3.570,84	2,26%	1,00	R\$ 255,06	0,16%
06.006	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,56000	315,22000	R\$ 2.698,28	1,71%	0,00	R\$ -	0,00%	8,56	R\$ 2.698,28	1,71%	8,56	R\$ 2.698,28	1,71%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
06.007	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	24,000	25,35000	R\$ 608,40	0,39%	0,00	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 608,40	0,39%	24,00	R\$ 608,40	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
06.008	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	1,04000	279,42000	R\$ 290,60	0,18%	0,00	R\$ -	0,00%	1,04	R\$ 290,60	0,18%	1,04	R\$ 290,60	0,18%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
06.009	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	24,000	31,73000	R\$ 761,52	0,48%	0,00	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 761,52	0,48%	24,00	R\$ 761,52	0,48%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 21.388,42	13,54%		R\$ -	0,00%		R\$ 21.388,42	13,54%	0,00	R\$ 21.388,42	13,54%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001	PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO				R\$ 5.280,45	3,34%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 5.280,45	3,34%	0,00	R\$ 5.280,45	3,34%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.001	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un	1,000	306,91000	R\$ 306,91	0,19%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 306,91	0,19%	1,00	R\$ 306,91	0,19%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,000	595,78000	R\$ 595,78	0,38%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 595,78	0,38%	1,00	R\$ 595,78	0,38%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,000	22,2000	R\$ 44,40	0,03%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 44,40	0,03%	2,00	R\$ 44,40	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,000	158,74000	R\$ 317,48	0,20%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 317,48	0,20%	2,00	R\$ 317,48	0,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.005	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,000	107,3000	R\$ 107,30	0,07%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 107,30	0,07%	1,00	R\$ 107,30	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.006	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	m	220,000	10,46000	R\$ 2.301,20	1,46%	0,00	R\$ -	0,00%	220,00	R\$ 2.301,20	1,46%	220,00	R\$ 2.301,20	1,46%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.007	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,000	107,3000	R\$ 107,30	0,07%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 107,30	0,07%	1,00	R\$ 107,30	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	4,000	13,09000	R\$ 52,36	0,03%	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 52,36	0,03%	4,00	R\$ 52,36	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,000	13,09000	R\$ 13,09	0,01%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 13,09	0,01%	1,00	R\$ 13,09	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%



CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 07.159.244/0001-60

OBRA: Conclusão dos serviços remanescentes da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Povoado

LOCAL: Itabaiana

PLANILHA - UBS ARGOVILA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 363/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

MEDIÇÃO Nº: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 24/11/2025

À

01/02/2026

DATA DA MEDIÇÃO:

02/02/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO:

05 MESES

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	[%]	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO 01			TOTAL ACUMULADO			SALDO DO CONTRATO			
							QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	
07.001.010	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,000	362,61000	R\$ 725,22	0,46%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$ 725,22	0,46%	2,00	R\$ 725,22	0,46%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	7,000	65,23000	R\$ 456,61	0,29%	0,00	R\$	-	0,00%	7,00	R\$ 456,61	0,29%	7,00	R\$ 456,61	0,29%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.001.012	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 18a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	4,000	63,20000	R\$ 252,80	0,16%	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 252,80	0,16%	4,00	R\$ 252,80	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002	ELETRODUTOS, LUVAS, LUMINÁRIAS, TUG, TUE E INTERRUPTORES				R\$ 16.107,97	10,19%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 16.107,97	10,19%	0,00	R\$ 16.107,97	10,19%		R\$ 0,00	0,00%
07.002.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	700,000	3,18000	R\$ 2.226,00	1,41%	0,00	R\$	-	0,00%	700,00	R\$ 2.226,00	1,41%	700,00	R\$ 2.226,00	1,41%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	700,000	4,71000	R\$ 3.297,00	2,09%	0,00	R\$	-	0,00%	700,00	R\$ 3.297,00	2,09%	700,00	R\$ 3.297,00	2,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	640,000	7,10000	R\$ 4.544,00	2,88%	0,00	R\$	-	0,00%	640,00	R\$ 4.544,00	2,88%	640,00	R\$ 4.544,00	2,88%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.004	Luminária plafon de sobropor em LED 22 5x22 5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	19,000	66,92000	R\$ 1.271,48	0,80%	0,00	R\$	-	0,00%	19,00	R\$ 1.271,48	0,80%	19,00	R\$ 1.271,48	0,80%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.005	Luminária em led 40W sobrepôr, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	22,000	77,16000	R\$ 1.697,52	1,07%	0,00	R\$	-	0,00%	22,00	R\$ 1.697,52	1,07%	22,00	R\$ 1.697,52	1,07%		R\$ 0,00	0,00%
07.002.006	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	50,000	32,30000	R\$ 1.615,00	1,02%	0,00	R\$	-	0,00%	50,00	R\$ 1.615,00	1,02%	50,00	R\$ 1.615,00	1,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.007	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	7,000	125,29000	R\$ 877,03	0,56%	0,00	R\$	-	0,00%	7,00	R\$ 877,03	0,56%	7,00	R\$ 877,03	0,56%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.008	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	24,000	22,34000	R\$ 536,16	0,34%	0,00	R\$	-	0,00%	24,00	R\$ 536,16	0,34%	24,00	R\$ 536,16	0,34%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.009	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	1,000	26,05000	R\$ 26,05	0,02%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$ 26,05	0,02%	1,00	R\$ 26,05	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
07.002.010	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	1,000	17,73000	R\$ 17,73	0,01%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$ 17,73	0,01%	1,00	R\$ 17,73	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
08	PINTURA				R\$ 19.643,41	12,43%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 19.643,41	12,43%
08.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	2,3000	9,69000	R\$ 22,29	0,01%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,30	R\$ 22,29	0,01%
08.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	2,3000	24,4000	R\$ 56,12	0,04%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,30	R\$ 56,12	0,04%
08.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	68,04000	65,98000	R\$ 4.487,92	2,84%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	68,04	R\$ 4.487,92	2,84%
08.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	643,4000	15,83000	R\$ 10.185,02	6,45%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	643,40	R\$ 10.185,02	6,45%
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	310,41000	15,76000	R\$ 4.892,06	3,10%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	310,41	R\$ 4.892,06	3,10%
09	TESTES HIDROSSANITÁRIOS				R\$ 649,46	0,41%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 649,46	0,41%	0,00	R\$ 649,46	0,41%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	91,000	3,08000	R\$ 280,28	0,18%	0,00	R\$	-	0,00%	91,00	R\$ 280,28	0,18%	91,00	R\$ 280,28	0,18%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
09.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	126,000	2,93000	R\$ 369,18	0,23%	0,00	R\$	-	0,00%	126,00	R\$ 369,18	0,23%	126,00	R\$ 369,18	0,23%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10	LOUÇAS E METAIS				R\$ 17.102,53	10,82%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 10.385,39	6,57%	0,00	R\$ 10.385,39	6,57%	0,00	R\$ 6.717,14	4,25%
10.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,000	792,36000	R\$ 1.584,72	1,00%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$ 1.584,72	1,00%	2,00	R\$ 1.584,72	1,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,000	532,14000	R\$ 1.064,28	0,67%	0,00	R\$	-	0,00%	2,00	R\$ 1.064,28	0,67%	2,00	R\$ 1.064,28	0,67%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.003	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	4,000	74,22000	R\$ 296,88	0,19%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 296,88	0,19%
10.004	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	10,000	90,01000	R\$ 900,10	0,57%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 900,10	0,57%
10.005	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	10,000	106,49000	R\$ 1.064,90	0,67%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.064,90	0,67%
10.006	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	1,000	1.693,24000	R\$ 1.693,24	1,07%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.693,24	1,07%
10.007	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev 02	un	1,000	1.228,32000	R\$ 1.228,32	0,78%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.228,32	0,78%
10.008	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev 04	un	5,000	975,28000	R\$ 4.876,40	3,09%	0,00	R\$	-	0,00%	5,00	R\$ 4.876,40	3,09%	5,00	R\$ 4.876,40	3,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.009	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,75000	526,44000	R\$ 921,27	0,58%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,75	R\$ 921,27	0,58%
10.010	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,000	83,59000	R\$ 83,59	0,05%	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$ 83,59	0,05%	1,00	R\$ 83,59	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,000	265,32000	R\$ 530,64	0,34%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 530,64	0,34%
10.012	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	1,000	81,79000	R\$ 81,79	0,05%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 81,79	0,05%
10.013	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	10,000	277,64000	R\$ 2.776,40	1,76%	0,00	R\$	-	0,00%	10,00	R\$ 2.776,40	1,76%	10,00	R\$ 2.776,40	1,76%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11	PAISAGISMO				R\$ 2.126,45		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.126,45	1,35%
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	6,68000	43,2000	R\$ 288,58	0,18%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,68	R\$ 288,58	0,18%
11.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	19,000	45,95000	R\$ 873,05	0,55%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	19,00	R\$ 873,05	0,55%
11.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	5,45000	63,02000	R\$ 343,46	0,22%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,45	R\$ 343,46	0,22%
11.004	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	5,45000	21,42000	R\$ 116,74	0,07%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,45	R\$ 116,74	0,07%
11.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,45000	41,62000	R\$ 226,83	0,14%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,45	R\$ 226,83	0,14%
11.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	5,45000	50,97000	R\$ 277,79	0,18%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,45	R\$ 277,79	0,18%



CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana

CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 07.159.244/0003-60

OBRA: Conclusão dos serviços remanescentes da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Povoado Agrovila

LOCAL: Itabaiana

CONTRATO Nº 363/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

MEDIÇÃO Nº.: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 24/11/2025

À

01/02/2026

DATA DA MEDIÇÃO:
PRAZO DE EXECUÇÃO:02/02/2026
05 MESES

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	[%]	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO 01			TOTAL ACUMULADO			SALDO DO CONTRATO		
							QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%
12	RAMPA DE ACESSO				R\$ 3.127,40	1,98%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 3.127,40	1,98%
12.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,67000	63,02000	R\$ 105,24	0,07%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,67	R\$ 105,24	0,07%
12.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.02_04/2022	m2	1,67000	21,42000	R\$ 35,77	0,02%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,67	R\$ 35,77	0,02%
12.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,67000	41,62000	R\$ 69,51	0,04%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,67	R\$ 69,51	0,04%
12.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1,67000	50,97000	R\$ 85,12			R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 85,12	0,05%
12.005	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	2,31000	166,29000	R\$ 384,13	0,24%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,31	R\$ 384,13	0,24%
12.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	8,14000	57,85000	R\$ 470,90	0,30%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	8,14	R\$ 470,90	0,30%
12.007	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	6,15000	321,42000	R\$ 1.976,73	1,25%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,15	R\$ 1.976,73	1,25%
13	COBERTURA FACHADA				R\$ 4.734,79	3,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.734,79	3,00%
13.001	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	13,93000	216,43000	R\$ 3.014,87	1,91%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	13,93	R\$ 3.014,87	1,91%
13.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	13,93000	49,79000	R\$ 693,57	0,44%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	13,93	R\$ 693,57	0,44%
13.003	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	9,95000	34,71000	R\$ 345,36	0,22%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	9,95	R\$ 345,36	0,22%
13.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	2,000	159,26000	R\$ 318,52			R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 318,52	0,20%
13.005	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	3,000	2,45000	R\$ 7,35	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7,35	0,00%
13.006	Tratamento de junta de dilatação com manta asfáltica aderida com maçarico. af_09/2023	m	9,95000	35,69000	R\$ 355,12	0,22%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	9,95	R\$ 355,12	0,22%
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 2.183,01	1,38%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.183,01	1,38%
14.001	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,32000	526,44000	R\$ 694,90	0,44%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,32	R\$ 694,90	0,44%
14.002	Limpeza geral	m2	506,16000	2,94000	R\$ 1.488,11	0,94%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	506,16	R\$ 1.488,11	0,94%
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 7.559,50	4,78%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 3.779,75	2,39%	0,00	R\$ 3.779,75	2,39%	0,00	R\$ 3.779,75	2,39%
15.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	25,000	147,14000	R\$ 3.678,50	2,33%	0,00	R\$ -	0,00%	12,50	R\$ 1.839,25	1,16%	12,50	R\$ 1.839,25	1,16%	12,50	R\$ 1.839,25	1,16%
15.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	50,000	77,62000	R\$ 3.881,00	2,46%	0,00	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 1.940,50	1,23%	25,00	R\$ 1.940,50	1,23%	25,00	R\$ 1.940,50	1,23%
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO					R\$ 158.000,00			R\$ -	0,00%		R\$ 97.320,86	61,60%		R\$ 97.320,86	61,60%		R\$ 60.679,14	38,40%

R\$ 60.679,14

DATA DE APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO

NOTA:

Aprovamos que os serviços medidos foram executados pela contratada, porém é de responsabilidade da contratada o reparo, demolição e reconstrução dos itens caso apresentem manifestações patológicas e/ou vícios construtivos.



Documento assinado digitalmente

DANIEL CAMPOS SANTANA

Data: 23/02/2026 10:38:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CONTRATO Nº: 363/2025
Período: 15/12/2025 a 01/02/2026

CNPJ: 07.159.244/0001-60



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,00	2x4 = 8,0 m²
1.002	Limpeza geral	m2	191,57	Área interna do prédio.
1.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1 Unidade
1.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00	1 Unidade
1.005	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	274,64	Área do passeio + estacionamento, externo ao prédio.
03	PAVIMENTAÇÃO			
3.001	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	12,00	120,00 x 0,10 = 12,00 m³
3.004	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	62,88	Área do estacionamento, intertravado.
3.005	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	44,99	Perímetro externo.
3.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	44,99	Perímetro externo.
04	REVESTIMENTO			
4.001	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	20,07	200,7 x 0,1 = 20,07 m²
4.002	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	29,98	18,86 + 4,12 = 29,98 m²
4.003	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	29,98	18,86 + 4,12 = 29,98 m²
4.004	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhão, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	29,98	18,86 + 4,12 = 29,98 m²
05	FORRO			
5.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	162,78	24,29+5,92+3,69+3,69+5,39+8,79+7,41+14,45+8,85+12,36+2,79+2,79+2,08+4,19+7,12+4,36+4,36+2,22+2,22+6,30+10,36+19,15 = 162,78 m²
06	ESQUADRIAS			
6.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, exclusive batentes e ferragens	un	3,00	3 Unidades
6.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento	un	4,00	4 Unidades
6.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento	un	7,00	7 Unidades
6.004	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	42,00	42 Unidades, 3 para cada porta.
6.005	Fechadura Pado, linha Ecolinox, modelo Vitória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	14,00	14 Unidades
6.006	Porta ou janela em alumínio, cor NPB, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,56	1 + (4x0,9x2,10) = 8,56 m²
6.007	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	24,00	3 Dias trabalhados
6.008	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	1,04	0,8 x 1,30 = 1,04 m²
6.009	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	24,00	3 Dias trabalhados
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.001	PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO			
7.001.001	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un	1,00	1 Unidades
7.001.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1 Unidades
7.001.003	Caixa pré moldada em concreto citampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00	2 Unidades
7.001.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	2 Unidades
7.001.005	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	1 Unidades
7.001.006	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	m	220,00	220 M
7.001.007	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	1 Unidades
7.001.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	4 Unidades
7.001.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	1 Unidades
7.001.010	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref. SSM1 312-CMB, Siemens ou similar	un	2,00	2 UN
7.001.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	7,00	7 Unidades
7.001.012	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	4 Unidades
7.002	ELETRODUTOS, LUVAS, LUMINÁRIAS, TUG, TUE E INTERRUPTORES			
7.002.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	700,00	700 M
7.002.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	700,00	700 M
7.002.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	640,00	640 M
7.002.004	Luminária plafon de sobrepôr em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	19,00	19 UN
7.002.005	Luminária em led 40W sobrepôr, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	22,00	22 UN
7.002.006	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	50,00	50 Unidades
7.002.007	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-polar 30a, embutida	un	7,00	7 UN
7.002.008	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	24,00	24 UN
7.002.009	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	1 UN
7.002.010	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	1,00	1 Unidades
09	TESTES HIDROSSANITÁRIOS			
9.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	91,00	91 M
9.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	126,00	126 M
10	LOUÇAS E METAS			
10.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. essento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	2 UN

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

10.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	2 UN
10.008	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	5,00	5 Unidades
10.010	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00	1 Unidades
10.013	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	10,00	10 Unidades
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
15.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	12,50	Valores correspondem a menos que 5% do
15.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	25,00	valor da obra.



Documento assinado digitalmente

DANIEL CAMPOS SANTANA

Data: 10/03/2026 09:25:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA

CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ:

07.159.244/0001-60

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PERÍODO:

24/11/2025 a 01/02/2026

Medição: 01

CONTRATO:

363/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



lavagem de parede



lavagem de parede



lavagem de parede



Instalação de padrão de entrada




Instalação elétrica



Instalação de portas


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA

CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ:

07.159.244/0001-60



CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PERÍODO:


24/11/2025 a 01/02/2026

Medição: 01

CONTRATO:

363/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

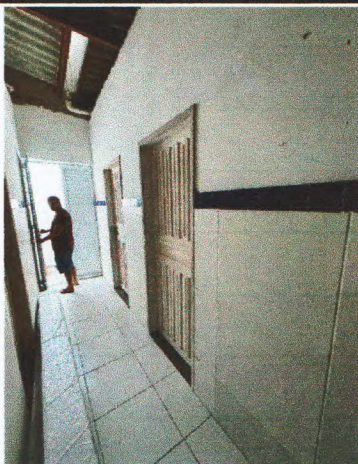

Instalação de portas



Instalação de portas




Instalação de portas



Instalação de vidro




Instalação de pastilhas 10x10 cm

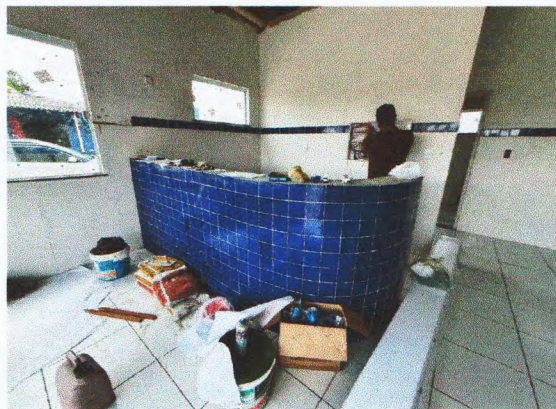

Instalação de pastilhas 10x10 cm


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA			
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	CNPJ:	07.159.244/0001-60	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	PERÍODO:	24/11/2025 a 01/02/2026	
Medição: 01	CONTRATO:	363/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Instalação de pastilhas 5x5 cm



Meio fio



Meio fio



Instalação de pia de louça



instalação de pia de louça



Instalação de pia de louça

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA

CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ:

07.159.244/0001-60

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PERÍODO:

24/11/2025 a 01/02/2026

Medição: 01

CONTRATO:

363/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



instalação de vaso sanitário



instalação de chuveiro



Instalação de pia de inox



Forro de PVC



Forro de PVC



Forro de PVC

Documento assinado digitalmente



DANIEL CAMPOS SANTANA

Data: 11/03/2026 15:32:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
