

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO: 076/2022

Boletim de Medição: ADITIVO

PERÍODO: 01/10/2023 à 20/10/2023

Data de medição: 30/10/2023



Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
SERVIÇOS														
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ													
01.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
01.01.003	TRECHO 01													
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO								4.465,95	0,00	4.465,95	4.465,95	0,00	
01.01.003.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.488,65	-	1.488,65	1.488,65	-	3,00	4.465,95	-	4.465,95	4.465,95	-	100,00
01.01.004	TRECHO 02								4.948,02	0,00	4.948,02	4.948,02	0,00	
01.01.004.002	PAVIMENTAÇÃO								4.948,02	-	4.948,02	4.948,02	-	
01.01.004.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.649,34	-	1.649,34	1.649,34	-	3,00	4.948,02	-	4.948,02	4.948,02	-	100,00
01.01.005	TRECHO 03								5.232,06	132,06	5.100,00	5.232,06	0,00	
01.01.005.002	PAVIMENTAÇÃO								5.232,06	132,06	5.100,00	5.232,06	-	
01.01.005.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	54,80	54,80	-	54,80	-	1,27	69,59	69,59	-	69,59	-	100,00
01.01.005.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,59/m³	tkm	164,41	164,41	-	164,41	-	0,38	62,47	62,47	-	62,47	-	100,00
01.01.005.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	-	3,00	5.100,00	-	5.100,00	5.100,00	-	100,00
01.01.006	TRECHO 04								13.779,82	8.286,07	5.493,75	13.779,82	0,00	
01.01.006.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								483,98	483,98	0,00	483,98	0,00	
01.01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	278,15	278,15	-	278,15	-	1,74	483,98	483,98	-	483,98	-	100,00
01.01.006.002	PAVIMENTAÇÃO								13.295,84	7.802,09	5.493,75	13.295,84	-	
01.01.006.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	278,15	278,15	-	278,15	-	1,50	417,22	417,22	-	417,22	-	100,00
01.01.006.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	55,63	55,63	-	55,63	-	130,47	7.268,04	7.268,04	-	7.268,04	-	100,00
01.01.006.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,59/m³	tkm	333,78	333,78	-	333,78	-	0,38	126,83	126,83	-	126,83	-	100,00
01.01.006.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.831,25	-	1.831,25	1.831,25	-	3,00	5.493,75	-	5.493,75	5.493,75	-	100,00
01.01.007	TRECHO 05								3.560,28	0,00	3.560,28	3.560,28	0,00	
01.01.007.002	PAVIMENTAÇÃO								3.560,28	-	3.560,28	3.560,28	-	
01.01.007.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.186,76	-	1.186,76	1.186,76	-	3,00	3.560,28	-	3.560,28	3.560,28	-	100,00
01.01.008	TRECHO 06								5.609,25	0,00	5.609,25	5.609,25	0,00	
01.02.008.002	PAVIMENTAÇÃO								5.609,25	-	5.609,25	5.609,25	-	
01.01.008.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.869,75	-	1.869,75	1.869,75	-	3,00	5.609,25	-	5.609,25	5.609,25	-	100,00
01.01.009	TRECHO 07								2.485,02	0,00	2.485,02	2.485,02	0,00	
01.01.009.002	PAVIMENTAÇÃO								2.485,02	-	2.485,02	2.485,02	-	
01.01.009.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	828,34	-	828,34	828,34	-	3,00	2.485,02	-	2.485,02	2.485,02	-	100,00
01.01.010	SINALIZAÇÃO VERTICAL								2.457,12	-	-	-	2.457,12	-
01.01.010.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un.	4,00	-	-	-	4,00	814,28	2.457,12	-	-	-	2.457,12	-
01.01.011	TRECHO 08								113.551,50	45.984,83	63.497,39	109.482,22	4.069,28	
01.01.011.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.302,04	1.302,04	0,00	1.302,04	0,00	
01.01.011.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	748,30	748,30	-	748,30	-	1,74	1.302,04	1.302,04	-	1.302,04	-	100,00
01.01.011.002	PAVIMENTAÇÃO								108.180,18	44.682,79	63.497,39	108.180,18	-	
01.01.011.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	336,76	336,76	-	336,76	-	1,27	427,68	427,68	-	427,68	-	100,00
01.01.011.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,59/m³	tkm	1.010,21	1.010,21	-	1.010,21	-	0,38	383,87	383,87	-	383,87	-	100,00
01.01.011.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	748,30	748,30	-	748,30	-	1,50	1.122,45	1.122,45	-	1.122,45	-	100,00
01.01.011.002.004	Reforço do sub-leito	m3	149,66	149,66	-	149,66	-	20,03	2.997,68	2.997,68	-	2.997,68	-	100,00
01.01.011.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,59/m³	tkm	2.693,88	2.693,88	-	2.693,88	-	0,38	1.023,67	1.023,67	-	1.023,67	-	100,00
01.01.011.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	149,66	149,66	-	149,66	-	130,47	19.526,14	19.526,14	-	19.526,14	-	100,00
01.01.011.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,59/m³	tkm	897,96	897,96	-	897,96	-	0,38	341,22	341,22	-	341,22	-	100,00
01.01.011.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	748,30	748,30	-	748,30	-	13,38	10.012,25	10.012,25	-	10.012,25	-	100,00
01.01.011.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.496,60	-	1.496,60	1.496,60	-	3,00	4.489,80	-	4.489,80	4.489,80	-	100,00
01.01.011.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	37,42	-	37,42	37,42	-	1.428,00	53.435,76	-	53.435,76	53.435,76	-	100,00
01.01.011.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: bkm). af_07/2020	tkm	2.693,88	-	2.693,88	2.693,88	-	1,56	4.202,45	-	4.202,45	4.202,45	-	100,00
01.01.011.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: bkm). af_07/2020	tkm	2.244,90	-	2.244,90	2.244,90	-	0,61	1.369,38	-	1.369,38	1.369,38	-	100,00
01.01.011.002.013	Misto-flo de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	290,60	290,60	-	290,60	-	28,89	8.395,43	8.395,43	-	8.395,43	-	100,00
01.01.011.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,85	7,85	-	7,85	-	36,85	287,70	287,70	-	287,70	-	100,00
01.01.011.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	9,81	9,81	-	9,81	-	0,73	7,16	7,16	-	7,16	-	100,00
01.01.011.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,59/m³	tkm	29,42	29,42	-	29,42	-	0,38	11,17	11,17	-	11,17	-	100,00

AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS
 Alexandre Albuquerque
 Eng. Civil - RNP nº 180000010

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ivan Henrique Torres Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATO:
070/2022

Boletim de Medição: ADITIVO



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA:
EXECUÇÃO:

Período: 01/10/2023 à 20/10/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 30/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
SERVIÇOS														
01.01.011.002.017	Colchão de areia	m3	1,31	1,31	-	1,31	-	104,91	137,43	137,43	-	137,43	-	100,00
01.01.011.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	23,54	23,54	-	23,54	-	0,38	8,94	8,94	-	8,94	-	100,00
01.01.011.003	DIVERSOS								4.069,28				4.069,28	
01.01.011.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	65,59	-	-	-	65,59	14,20	931,37	-	-	-	931,37	-
01.01.011.003.002	Pintura de meio fio (calação)	m	290,60	-	-	-	290,60	4,00	1.162,40	-	-	-	1.162,40	-
01.01.011.003.003	Limpeza geral	m2	748,30	-	-	-	748,30	2,64	1.975,51	-	-	-	1.975,51	-
01.01.012	TRECHO 09								114.015,14	47.660,71	61.800,88	109.461,59	4.553,55	
01.01.012.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.267,29	1.267,29	0,00	1.267,29	0,00	
01.01.012.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	1,74	1.267,29	1.267,29	-	1.267,29	-	100,00
01.01.012.002	PAVIMENTAÇÃO								108.194,30	46.393,42	61.800,88	108.194,30		
01.01.012.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	327,75	327,75	-	327,75	-	1,27	416,24	416,24	-	416,24	-	100,00
01.01.012.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	983,25	983,25	-	983,25	-	0,38	373,63	373,63	-	373,63	-	100,00
01.01.012.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af 11/2019	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	1,50	1.092,49	1.092,49	-	1.092,49	-	100,00
01.01.012.002.004	Reforço do sub-leito	m3	145,67	145,67	-	145,67	-	20,03	2.917,77	2.917,77	-	2.917,77	-	100,00
01.01.012.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.621,99	2.621,99	-	2.621,99	-	0,38	996,35	996,35	-	996,35	-	100,00
01.01.012.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusiva carga e transporte, af 11/2019	m3	145,67	145,67	-	145,67	-	130,47	19.005,56	19.005,56	-	19.005,56	-	100,00
01.01.012.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	874,00	874,00	-	874,00	-	0,38	332,12	332,12	-	332,12	-	100,00
01.01.012.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30, af 11/2019	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	13,38	9.745,05	9.745,05	-	9.745,05	-	100,00
01.01.012.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c, af 11/2019	m2	1.456,66	-	1.456,66	1.456,66	-	3,00	4.369,98	-	4.369,98	4.369,98	-	100,00
01.01.012.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte, af 11/2019	m3	36,42	-	36,42	36,42	-	1.428,00	52.007,76	-	52.007,76	52.007,76	-	100,00
01.01.012.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm), af 07/2020	tkm	2.621,99	-	2.621,99	2.621,99	-	1,56	4.090,30	-	4.090,30	4.090,30	-	100,00
01.01.012.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm), af 07/2020	tkm	2.184,99	-	2.184,99	2.184,99	-	0,61	1.332,84	-	1.332,84	1.332,84	-	100,00
01.01.012.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	378,20	378,20	-	378,20	-	28,89	10.926,19	10.926,19	-	10.926,19	-	100,00
01.01.012.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,21	10,21	-	10,21	-	36,65	374,19	374,19	-	374,19	-	100,00
01.01.012.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	12,76	12,76	-	12,76	-	0,73	9,31	9,31	-	9,31	-	100,00
01.01.012.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	38,29	38,29	-	38,29	-	0,38	14,55	14,55	-	14,55	-	100,00
01.01.012.002.017	Colchão de areia	m3	1,70	1,70	-	1,70	-	104,91	178,34	178,34	-	178,34	-	100,00
01.01.012.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	30,63	30,63	-	30,63	-	0,38	11,63	11,63	-	11,63	-	100,00
01.01.012.003	DIVERSOS								4.553,55				4.553,55	
01.01.012.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,73	-	-	-	78,73	14,20	1.117,96	-	-	-	1.117,96	-
01.01.012.003.002	Pintura de meio fio (calação)	m	378,20	-	-	-	378,20	4,00	1.512,80	-	-	-	1.512,80	-
01.01.012.003.003	Limpeza geral	m2	728,33	-	-	-	728,33	2,64	1.922,79	-	-	-	1.922,79	-
TOTAL:									270.104,16	102.063,67	156.960,54	259.024,21	11.079,95	95,89%
PERCENTUAL										37,78%	58,11%	95,89%	4,11%	

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA:

Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP Nº 180324912-9

José Robson Santos de Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Soares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC

Período: 01/10/2023 à 20/10/2023

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

Boletim de Medição: ADITIVO

RUAS	ESTACA		Extensão da OS / Ligações Fretadas	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESSURA SUB-LEITO	ESPESSURA SUB-BASE	ESPESSURA BASE	ESPESSURA CONCRETO BETUMINOSO	01.01.003.002.009		
	INICIO	FINAL														
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A25		
CALCULOS UTILIZADOS			prqj	prqj	FATOR	FATOR	FATOR	RECU	Execução	Execução	prqj	Campo	Campo	=A24		
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		m³	m³	m³	m³	m³	m²		
PAVIMENTAÇÃO																
Ruas																
			15	13,6	313,56	313,56	1,30	1,15	1,50			0,50	0,20	0,20	0,05	1.488,65
THECHO 01 - RUA "E"	+															
	+															
	+															
	+															
	+															
	+															
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A): 1.488,65																
QUANTIDADES: REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS") (B):																
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B): 1.488,65																
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO (ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D): 1.488,65																
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA "OS") (E): 1.488,65																
REMANESCENTES DESTA MEDIÇÃO (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS") (F):																

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CRE-5 27.20293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Marques Santana
 Engº Civil CRE-5 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA		Extensão da OS / Ligações Preliais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESSURA SUB-LEITO	ESPESSURA SUB-BASE	ESPESSURA BASE	ESPESSURA CONCRETO BETUMINOSO	01.01.005.002.001	01.01.005.002.002	01.01.005.002.009				
	INICIO	FINAL												Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019				
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A17	A18	A25				
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR		Execução	Execução	proj	Campo	Campo	ANEXO MAPA DE CUBAÇÃO	=A17*2(KM)*1,5(DE NS.)	=A24				
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m3	tkm	m2				
PAVIMENTAÇÃO																				
Ruas																				
		+	17	+	+	340,00	340,00	1,30	1,15	1,50	5,00		0,50	0,20	0,20	0,05	54,80	164,41	1.700,00	
	THECHO 03 - RUA "A1"																			
		+		+																
		+		+																
		+		+																
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														54,80	164,41	1.700,00				
QUANTIDADES:																				
REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):																				
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):														54,80	164,41	1.700,00				
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):																1.700,00				
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA"OS") (E):																1.700,00				

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Engº Civil - RNP nº 180824912-9

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2728293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA 2775638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 070/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM ADITIVO

TRECHO 01



TRECHO 01



TRECHO 02



TRECHO 03



TRECHO 04



TRECHO 04



TRECHO 05



TRECHO 06



AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP nº 180324912-9

Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil CREA 3715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 070/2023




Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM ADITIVO

TRECHO 07




TRECHO 08

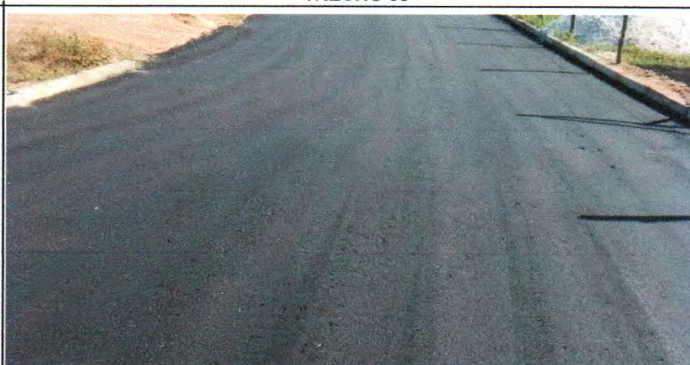

TRECHO 09



TRECHO 09

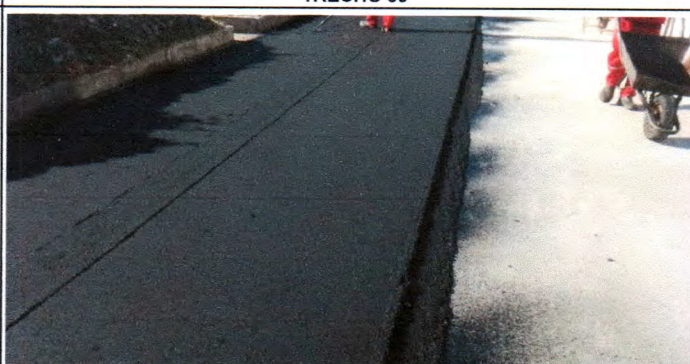

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP Nº 180924017

José Robson Santos da Amiação
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
