

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 025/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDITY & QUALITY	
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 02/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
				PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026				DATA: 06/04/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	355,94	4.271,28	4.271,28	0,00	4.271,28	0,00	100,00
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	88,45	88,45	0,00	88,45	27,47	2.429,72	2.429,72	0,00	2.429,72	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							996,66	996,66	0,00	996,66	0,00	100,00
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023	m3	10,29	10,29	0,00	10,29	96,90	996,66	996,66	0,00	996,66	0,00	100,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							3.500,84	3.500,84	0,00	3.500,84	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	110,52	110,52	0,00	110,52	10,16	1.122,88	1.122,88	0,00	1.122,88	0,00	100,00
03.012	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	29,46	29,46	0,00	29,46	13,33	392,70	392,70	0,00	392,70	0,00	100,00
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	75,00	75,00	0,00	75,00	26,47	1.985,25	1.985,25	0,00	1.985,25	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							21.684,30	5.332,70	16.351,60	21.684,30	0,00	100,00
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	120,16	120,16	0,00	120,16	44,38	5.332,70	5.332,70	0,00	5.332,70	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	17,85	0,00	17,85	17,85	774,92	13.832,32	0,00	13.832,32	13.832,32	0,00	100,00
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	20,98	0,00	20,98	20,98	120,08	2.519,28	0,00	2.519,28	2.519,28	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE							832,96	0,00	832,96	832,96	0,00	100,00
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00	2,00	2,00	416,48	832,96	0,00	832,96	832,96	0,00	100,00
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							361,45	0,00	361,45	361,45	0,00	100,00
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,56	0,00	0,56	0,56	645,44	361,45	0,00	361,45	361,45	0,00	100,00
08	PINTURA							10.820,37	0,00	10.646,07	10.646,07	174,30	98,39
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	466,60	0,00	466,60	466,60	20,22	9.434,65	0,00	9.434,65	9.434,65	0,00	100,00
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020	m2	2,00	0,00	2,00	2,00	28,46	56,92	0,00	56,92	56,92	0,00	100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	25,00	0,00	25,00	25,00	46,18	1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	100,00
08.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	5,76	0,00	0,00	0,00	30,26	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3.893,10	0,00	3.893,10	3.893,10	0,00	100,00
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	0,00	4,00	4,00	806,46	3.225,84	0,00	3.225,84	3.225,84	0,00	100,00
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	333,63	667,26	0,00	667,26	667,26	0,00	100,00
11	PAISAGISMO							398,31	0,00	398,31	398,31	0,00	100,00
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	15,70	0,00	15,70	15,70	25,37	398,31	0,00	398,31	398,31	0,00	100,00
12	ALAMBRADO/ESQUADRIAS							132,58	0,00	132,58	132,58	0,00	100,00
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	2,00	0,00	2,00	2,00	66,29	132,58	0,00	132,58	132,58	0,00	100,00
13	DIVERSOS							2.034,86	0,00	889,96	889,96	1.144,91	43,74
13.001	Limpeza geral	m2	473,10	0,00	0,00	0,00	2,42	1.144,90	0,00	0,00	0,00	1.144,90	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	35,30	0,00	35,30	35,30	10,81	381,64	0,00	381,64	381,64	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	423,60	0,00	423,60	423,60	1,20	508,32	0,00	508,32	508,32	0,00	100,00

José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA 2721031899
 Coordenador de Nucleo

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 025/2026/PMI							
				B.M.Nº. 02/2026		ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026							
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026		DATA: 06/04/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	1.650,65	1.650,65	3.301,31	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	5,25	5,25	10,50	154,93	1.626,77	813,38	813,38	1.626,77	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	10,50	10,50	21,00	79,74	1.674,54	837,27	837,27	1.674,54	0,00	100,00
TOTAL GERAL								54.657,73	18.181,85	35.156,68	53.338,53	1.319,20	97,59
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					

Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 20/04/2026 10:44:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 20/04/2026 08:02:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 20/04/2026 08:10:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO 02	
BM 02 06/04/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
025/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)
04	PAVIMENTAÇÃO
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022 - 17,85 m3
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. - 20,98 m2
05	ACESSIBILIDADE
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - 2,00 und
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado - 0,56 m3
08	PINTURA
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021 - 466,60 m2
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020 - 2,00 m2
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 25,00 m2
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m - 4,00 und
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar - 2,00 und
11	PAISAGISMO
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio - 15,70 M2
12	ALAMBRADO/ESQUADRIAS
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela - 2,00 m2
13	DIVERSOS
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria - 35,30 M3
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 423,60 TKM
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 5,25 h
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 10,50 h



Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 20/04/2026 10:45:52-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 20/04/2026 08:02:08-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 20/04/2026 08:10:29-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 025/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/04/2026



PASSEIO




INTERTRAVADO



RAMPA



CONCRETO

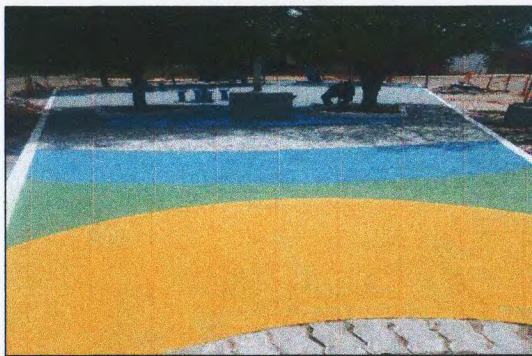

PINTURA DE PISO



PINTURA ACRÍLICA METÁLICA

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-2
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO,
ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 025/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/04/2026



PINTURA EXTERIORES



MESA EM CONCRETO



LIXEIRA



GRAMA EM PLACAS



REVISÃO EM ESTRUTURA METÁLICA



CARGA

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA






CONTRATO Nº: 025/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/04/2026



TRANSPORTE



ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 20/04/2026 10:46:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 20/04/2026 08:02:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 20/04/2026 08:10:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
