

 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310 CNPJ : 29.889.275/0001-00														
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO														
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).	ORDEM DE SERVIÇO		CONTRATO		PERÍODO CONTRATO		BOLETIM Nº		PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA:	10/12/2025	
		13/10/2025		280/2025		12 MESES		02		11/11/2025 A 07/12/2025				
		CONTRATO				MEDIÇÃO								(%) MEDIDA
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE				712.000,00					192.394,68	75.266,82	267.661,33	444.338,50	
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.959,46					1.959,46	-	1.959,46	-	
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	326,58	1.959,46	6,00	-	6,00	-	1.959,46	-	1.959,46	-	100,00%
01.002	RUA ELEANORO DO NASCIMENTO SILVA				59.684,06					-	-	-	59.684,07	
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO				56.184,64					-	-	-	56.184,64	
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	493,46	1,34	661,24		-	-	493,46	-	-	-	661,24	0,00%
01.002.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	493,46	0,82	404,64		-	-	493,46	-	-	-	404,64	0,00%
01.002.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	461,10	108,14	49.863,35		-	-	461,10	-	-	-	49.863,35	0,00%
01.002.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50/m³)	tkm	853,05	0,72	614,20		-	-	853,05	-	-	-	614,20	0,00%
01.002.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	107,86	38,08	4.107,31		-	-	107,86	-	-	-	4.107,31	0,00%
01.002.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	107,86	4,95	533,91		-	-	107,86	-	-	-	533,91	0,00%
01.002.002	DRENAGEM				3.499,41		-	-	-	-	-	-	3.499,41	0,00%
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	32,36	108,14	3.499,41		-	-	32,36	-	-	-	3.499,41	0,00%
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA				258.702,39		-	-	-	182.616,84	73.588,66	256.205,50	2.496,89	99,03%
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO				242.338,64		-	-	-	170.418,65	69.423,11	239.841,76	2.496,89	98,97%
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.128,89	1,34	2.852,71	1.504,00	624,89	2.128,89	-	2.015,36	837,35	2.852,71	0,00	100,00%
01.003.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.128,89	0,82	1.745,69	1.504,00	624,89	2.128,89	-	1.233,28	512,41	1.745,69	0,00	100,00%
01.003.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.956,66	108,14	211.593,21	1.391,20	565,46	1.956,66	-	150.444,37	61.148,84	211.593,21	0,00	100,00%
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	4.151,25	1,07	4.441,84	2.961,83	1.189,42	4.151,25	-	3.169,16	1.272,68	4.441,84	0,00	100,00%
01.003.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	504,42	38,08	19.208,31	356,00	148,42	504,42	-	13.556,48	5.651,83	19.208,31	0,00	100,00%
01.003.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	504,42	4,95	2.496,88		-	-	504,42	-	-	-	2.496,88	0,00%
01.003.002	DRENAGEM				16.363,74		-	-	-	12.198,19	4.165,55	16.363,74	0,00	
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	151,32	108,14	16.363,74	112,80	38,52	151,32	-	12.198,19	4.165,55	16.363,74	0,00	100,00%
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO				305.038,08		-	-	-	-	-	-	305.038,08	
01.004.001	TRECHO 01				97.468,02		-	-	-	-	-	-	97.468,02	
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO				91.513,83		-	-	-	-	-	-	91.513,83	
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	772,75	1,34	1.035,48		-	-	772,75	-	-	-	1.035,48	0,00%
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	772,75	0,82	633,66		-	-	772,75	-	-	-	633,66	0,00%
01.004.002.003	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	26,94	112,74	3.037,22		-	-	26,94	-	-	-	3.037,22	0,00%
01.004.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50/m³)	tkm	296,34	0,72	213,36		-	-	296,34	-	-	-	213,36	0,00%
01.004.002.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	717,69	108,14	77.611,00		-	-	717,69	-	-	-	77.611,00	0,00%
01.004.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50/m³)	tkm	1.506,90	0,72	1.084,97		-	-	1.506,90	-	-	-	1.084,97	0,00%
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	183,55	38,08	6.989,58		-	-	183,55	-	-	-	6.989,58	0,00%
01.004.002.008	Pintura de meio fio (caliação)	m	183,55	4,95	908,57		-	-	183,55	-	-	-	908,57	0,00%
01.004.003	DRENAGEM				5.954,19		-	-	-	-	-	-	5.954,19	
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	55,06	108,14	5.954,19		-	-	55,06	-	-	-	5.954,19	0,00%
01.004.004	TRECHO 02				207.570,06		-	-	-	-	-	-	207.570,06	
01.004.005	PAVIMENTAÇÃO				193.957,40		-	-	-	-	-	-	193.957,40	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	ORDEM DE SERVIÇO	CONTRATO	PERÍODO CONTRATO	BOLETIM Nº	PERÍODO DE MEDIÇÃO	DATA:	10/12/2025								
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).	13/10/2025	280/2025	12 MESES	02	11/11/2025 A 07/12/2025										
	MEDIÇÃO														
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	(%) MEDIDA	
01.004.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.563,80	1,34	2.095,49	-	-	-	1.563,80	-	-	-	-	2.095,49	0,00%
01.004.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.563,80	0,82	1.282,32	-	-	-	1.563,80	-	-	-	-	1.282,32	0,00%
01.004.005.003	Colchão de areia	m3	100,65	118,84	11.961,25	-	-	-	100,65	-	-	-	-	11.961,25	0,00%
01.004.005.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.437,92	108,14	155.496,67	-	-	-	1.437,92	-	-	-	-	155.496,67	0,00%
01.004.005.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.037,10	0,72	5.066,71	-	-	-	7.037,10	-	-	-	-	5.066,71	0,00%
01.004.005.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	419,59	38,08	15.977,99	-	-	-	419,59	-	-	-	-	15.977,99	0,00%
01.004.005.007	Pintura de meio fio (caliação)	m	419,59	4,95	2.076,97	-	-	-	419,59	-	-	-	-	2.076,97	0,00%
01.004.006	DRENAGEM				13.612,66	-	-	-	-	-	-	-	-	13.612,66	
01.004.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	125,88	108,14	13.612,66	-	-	-	125,88	-	-	-	-	13.612,66	0,00%
01.005	TRAVESSA PAULO DIAS DE TRINDADE				54.044,80	-	-	-	-	-	-	-	-	54.044,80	
01.005.001	PAVIMENTAÇÃO				52.033,40	-	-	-	-	-	-	-	-	52.033,40	
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	468,10	1,34	627,25	-	-	-	468,10	-	-	-	-	627,25	0,00%
01.005.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	468,10	0,82	383,83	-	-	-	468,10	-	-	-	-	383,83	0,00%
01.005.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	449,50	108,14	48.608,93	-	-	-	449,50	-	-	-	-	48.608,93	0,00%
01.005.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	912,75	0,72	657,18	-	-	-	912,75	-	-	-	-	657,18	0,00%
01.005.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	30,00	38,08	1.142,40	-	-	-	30,00	-	-	-	-	1.142,40	0,00%
01.005.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	124,00	4,95	613,80	-	-	-	124,00	-	-	-	-	613,80	0,00%
01.005.002	DRENAGEM				2.011,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.011,40	
01.005.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	18,60	108,14	2.011,40	-	-	-	18,60	-	-	-	-	2.011,40	0,00%
01.006	LIMPEZA				2.713,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.713,50	
01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.427,00	0,50	2.713,50	-	-	-	5.427,00	-	-	-	-	2.713,50	0,00%
01.007	ADMINISTRAÇÃO				29.857,72	-	-	-	-	7.818,22	1.678,16	9.496,38	20.361,34		
01.007.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,00	100,51	12.262,22	32,00	7,00	39,00	83,00	3.216,32	703,64	3.919,96	8.342,26	31,97%	
01.007.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00	54,14	17.595,50	85,00	18,00	103,00	222,00	4.601,90	974,52	5.576,42	12.019,08	31,69%	
TOTAIS					712.000,00					192.394,68	75.266,82	267.661,50	444.338,50		
PORCENTAGENS (%):					100,00%					27,02%	10,57%	37,59%	62,41%		
						Valor Contratado				712.000,00					
 DINESH KUMAR Data: 10/12/2025 06:44:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ. 29.889.275/0001-00					Atesto que os serviços acima foram executados, ITABAIANA/SE ____/____/2025					OBSERVAÇÕES					
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - ITABAIANA/SE															

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiara



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 10/12/2025 12:56:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310, CNPJ : 29.889.275/0001-00		MEMORIAL DE CÁLCULO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO									
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).									
ORDEM DE SERVIÇO:		13/10/2025									
CONTRATO:		280/2015									
PERÍODO DE CONTRATO:		12 meses									
BOLETIM DE MEDIÇÃO:		Nº 02									
PERÍODO DE MEDIÇÃO:		11/11/2025 À 07/12/2025									
DATA:		10/12/2025									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	X		Y		Z		TOTAL		UNID	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE										
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	0,00		m	x		m	=	0,00	m2
01.002	RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO SILVA										
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO										
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		m	x		m	=	0,00	m2
01.002.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		m	x		m	=	0,00	m2
01.002.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	m2	0,00		m	x		m	=	0,00	m2
01.002.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	tkm									tkm
01.002.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		m	x		lado	=	0,00	m
01.002.001.006	Pintura de meio fio (calação)	m	0,00		m	x		lado	=	0,00	m
01.002.002	DRENAGEM										
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		m	x		m	=	0,00	m2
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA										
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO										
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		78,11	m	x	8,00	m	=	624,89
01.003.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		78,11	m	x	8,00	m	=	624,89
01.003.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	m2	0,00		76,41	m	x	7,40	m	=	565,46
01.003.001.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	tkm			(142,4956X 50/1000) X 166,4					=	1.189,42
01.003.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		72,21	m	x	2,00	lado	=	144,42
01.003.001.006	Pintura de meio fio (calação)	m	0,00			m	x	0,00	lado	=	0,00
01.003.002	DRENAGEM										
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		64,20	m	x	0,3 x 2	m	=	38,52
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO										
01.004.001	TRECHO 01										
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO										
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.002.003	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.002.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	m2	0,00			m	x		lado	=	0,00
01.004.002.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	tkm	0,00			m	x		lado	=	0,00
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00			m	x		lado	=	0,00
01.004.002.008	Pintura de meio fio (calação)	m	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.003	DRENAGEM										
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.004	TRECHO 02										
01.004.005	PAVIMENTAÇÃO										
01.004.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.005.003	Colchão de areia	m3	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.005.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	m2	0,00			m	x		lado	=	0,00
01.004.005.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	tkm	0,00			m	x		lado	=	0,00
01.004.005.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00			m	x		lado	=	0,00
01.004.005.007	Pintura de meio fio (calação)	m	0,00			m	x		m	=	0,00
01.004.006	DRENAGEM										
01.004.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00			m	x		m	=	0,00
01.005	TRAVESSA PAULINO DIAS DE TRINDADE										

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 27233592-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310, CNPJ : 29.889.275/0001-00												
	MEMORIAL DE CÁLCULO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT.JARDIM SERRANO).												
ORDEM DE SERVIÇO:	13/10/2025												
CONTRATO:	280/2015												
PERÍODO DE CONTRATO:	12 meses												
BOLETIM DE MEDIÇÃO:	Nº 02												
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	11/11/2025 À 07/12/2025												
DATA:	10/12/2025												
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X			Y			Z			TOTAL	UNID
01.005.001	PAVIMENTAÇÃO												
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00			m	x		m	=		0,00	m2
01.005.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00			m	x		m	=		0,00	m2
01.005.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00			m	x		lado	=		0,00	m2
01.005.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00			m	x		lado	=		0,00	tkm
01.005.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00			m	x		lado	=		0,00	m
01.005.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00			m	x		m	=		0,00	m
01.005.002	DRENAGEM												
01.005.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00			m	x		lado	=		0,00	m2
01.006	LIMPEZA												
01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,00			m	x		lado	=		0,00	m2
01.007	ADMINISTRAÇÃO												
01.007.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,00			7,00	x		1,00	un	=	7,00	h
01.007.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00			18,00	x		1,00	un	=	18,00	h
Documento assinado digitalmente  DINESH KUMAR Data: 10/12/2025 06:44:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente  RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 10/12/2025 12:56:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br											
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)		RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)											

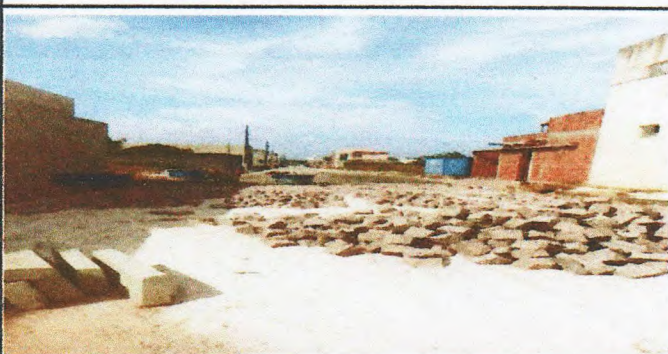
João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itaberna

**SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	
		
		
		

Documento assinado digitalmente
govbr DINESH KUMAR
Data: 10/12/2025 06:44:36-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

Documento assinado digitalmente
govbr RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 10/12/2025 12:56:39-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna

Página 2 de 2

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna

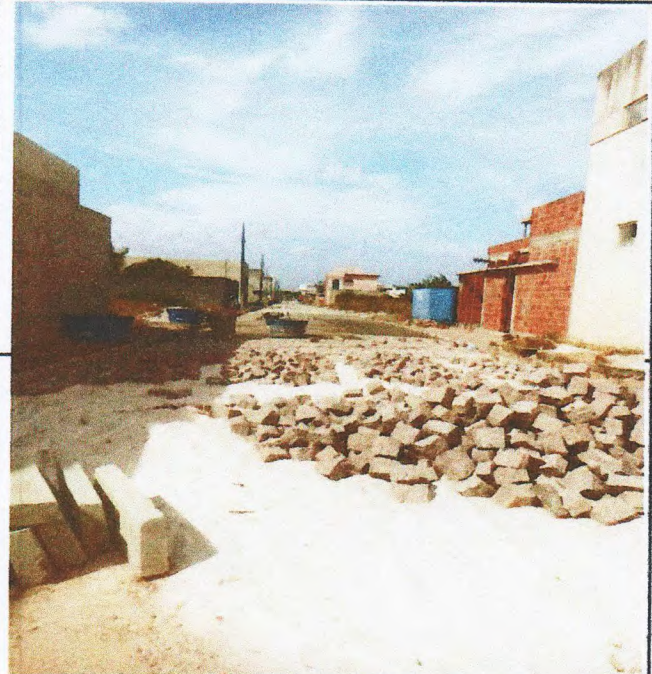
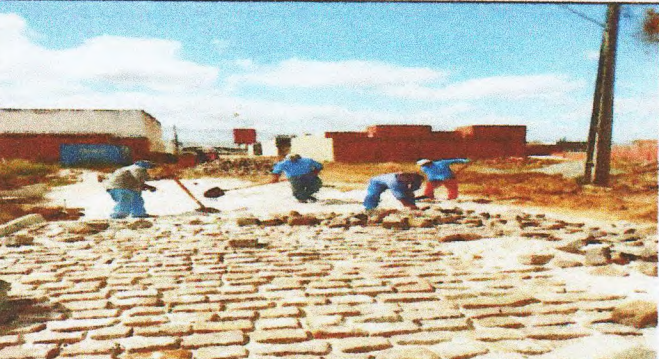


SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	
	
	
	
	
	
 Documento assinado digitalmente DINESH KUMAR Data: 10/12/2025 06:44:36-0300 Verifique em https://validar.itb.gov.br	 Documento assinado digitalmente RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 10/12/2025 12:56:39-0300 Verifique em https://validar.itb.gov.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)	RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna

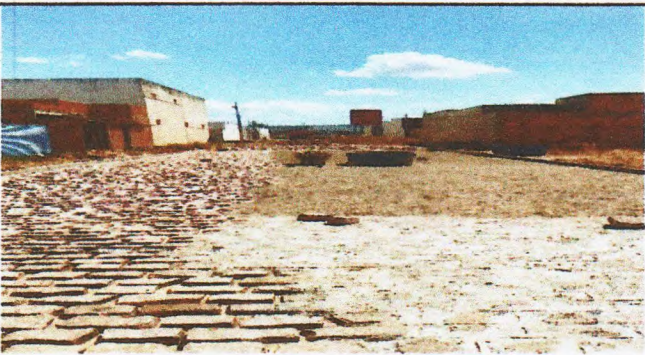
João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna

**SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA
	
	
	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna



SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA
	
	
	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27233592-3
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27233592-3
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaberna
