



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023						
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						55.245,15	53.962,19	0,00	53.962,19	1.282,96	97,68	
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	4,50		4,50	399,12	2.394,72	1.796,04	0,00	1.796,04	598,68	75,00
01.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	267,00	267,00		267,00	6,84	1.826,28	1.826,28	0,00	1.826,28	0,00	100,00
01.003	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	318,00	318,00		318,00	92,60	29.446,80	29.446,80	0,00	29.446,80	0,00	100,00
01.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m2	1.726,00	1.726,00		1.726,00	5,63	9.717,38	9.717,38	0,00	9.717,38	0,00	100,00
01.005	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação).	m2	303,00	303,00		303,00	9,54	2.890,62	2.890,62	0,00	2.890,62	0,00	100,00
01.006	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	1995,63	1.995,63	1.995,63	0,00	1.995,63	0,00	100,00
01.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00			0,00	684,28	684,28	0,00	0,00	0,00	684,28	0,00
01.008	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	24,00	24,00		24,00	262,06	6.289,44	6.289,44	0,00	6.289,44	0,00	100,00
02	FUNDAÇÃO						66.246,55	0,00	61.381,95	61.381,95	4.864,60	92,66	
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	48,50		48,50	48,50	56,02	2.716,97	0,00	2.716,97	2.716,97	0,00	100,00
02.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	4,85		4,85	4,85	481,76	2.336,54	0,00	2.336,54	2.336,54	0,00	100,00
02.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	26,19		26,19	26,19	388,02	10.162,24	0,00	10.162,24	10.162,24	0,00	100,00
02.004	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	22,31		22,31	22,31	31,93	712,36	0,00	712,36	712,36	0,00	100,00
02.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	32,74		32,74	32,74	11,17	365,71	0,00	365,71	365,71	0,00	100,00
02.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	98,21		98,21	98,21	1,58	155,17	0,00	155,17	155,17	0,00	100,00
02.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,32		8,95	8,95	2148,79	20.026,72	0,00	19.231,67	19.231,67	795,05	96,03
02.008	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfatíca, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar	m2	349,20		191,51	191,51	17,87	6.240,20	0,00	3.422,28	3.422,28	2.817,92	54,84
02.009	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	169,20		160,20	160,20	139,07	23.530,64	0,00	22.279,01	22.279,01	1.251,63	94,68
03	ESTRUTURA						82.883,33	-	31.264,89	31.264,89	51.618,44	37,72	

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

José Fabiano Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teófilo Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

Fiscal


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023						
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
03.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	15,75		14,55	14,55	2148,79	33.843,44	0,00	31.264,89	31.264,89	2.578,55	92,38
03.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	267,00			0,00	183,67	49.039,89	0,00	0,00	0,00	49.039,89	0,00
04	ELEVAÇÕES							33.248,09	-	-	-	33.248,09	0,00
04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	765,00			0,00	36,32	27.784,80	0,00	0,00	0,00	27.784,80	0,00
04.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	119,00			0,00	45,91	5.463,29	0,00	0,00	0,00	5.463,29	0,00
05	COBERTURA							61.701,38	0,00	0,00	0,00	61.701,38	0,00
05.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	303,00			0,00	64,60	19.573,80	0,00	0,00	0,00	19.573,80	0,00
05.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	303,00			0,00	46,07	13.959,21	0,00	0,00	0,00	13.959,21	0,00
05.003	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	59,00			0,00	135,40	7.988,60	0,00	0,00	0,00	7.988,60	0,00
05.004	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	95,70			0,00	39,53	3.783,02	0,00	0,00	0,00	3.783,02	0,00
05.005	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	30,45			0,00	23,40	712,53	0,00	0,00	0,00	712,53	0,00
05.006	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	19,00			0,00	91,59	1.740,21	0,00	0,00	0,00	1.740,21	0,00
05.007	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	kg	282,75			0,00	16,31	4.611,65	0,00	0,00	0,00	4.611,65	0,00
05.008	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	29,00			0,00	305,93	8.871,97	0,00	0,00	0,00	8.871,97	0,00
05.009	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	1,60			0,00	159,23	254,77	0,00	0,00	0,00	254,77	0,00
05.010	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	1,60			0,00	128,51	205,62	0,00	0,00	0,00	205,62	0,00
06	REVESTIMENTOS							160.026,12	-	-	-	160.026,12	0,00
06.001	PISO							31.191,49	-	-	-	31.191,49	0,00
06.001.001	Lona plástica preta	m2	267,00			0,00	5,73	1.529,91	0,00	0,00	0,00	1.529,91	0,00

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RU 271002422

José F. Johnson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Yatares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

ciscal


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023						
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06.001.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	267,00			0,00	28,97	7.734,99	0,00	0,00	0,00	7.734,99	0,00
06.001.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	267,00			0,00	28,05	7.489,35	0,00	0,00	0,00	7.489,35	0,00
06.001.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	267,00			0,00	35,38	9.446,46	0,00	0,00	0,00	9.446,46	0,00
06.001.005	Rodapé cerâmico 8,5 x 41 cm, eliane, linha cargo plus bone, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	m	212,00			0,00	17,24	3.654,88	0,00	0,00	0,00	3.654,88	0,00
06.001.006	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	30,00			0,00	44,53	1.335,90	0,00	0,00	0,00	1.335,90	0,00
06.002	PARADE							102.254,78	-	-	-	102.254,78	0,00
06.002.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	1.530,00			0,00	3,74	5.722,20	0,00	0,00	0,00	5.722,20	0,00
06.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	450,00			0,00	27,02	12.159,00	0,00	0,00	0,00	12.159,00	0,00
06.002.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.080,00			0,00	24,13	26.060,40	0,00	0,00	0,00	26.060,40	0,00
06.002.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	203,89			0,00	35,38	7.213,63	0,00	0,00	0,00	7.213,63	0,00
06.002.005	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev_03_04/2022	m2	876,11			0,00	43,20	37.847,95	0,00	0,00	0,00	37.847,95	0,00
06.002.006	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	30,00			0,00	67,32	2.019,60	0,00	0,00	0,00	2.019,60	0,00
06.002.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	450,00			0,00	24,96	11.232,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00
06.003	TETO							26.579,85	-	-	-	26.579,85	0,00
06.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev_06_10/2021	m2	267,00			0,00	61,81	16.503,27	0,00	0,00	0,00	16.503,27	0,00
06.003.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	m2	267,00			0,00	13,61	3.633,87	0,00	0,00	0,00	3.633,87	0,00
06.003.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	267,00			0,00	24,13	6.442,71	0,00	0,00	0,00	6.442,71	0,00
07	ESQUADRIAS							57.545,84	-	-	-	57.545,84	0,00
07.001	MADEIRA							23.140,28	-	-	-	23.140,28	0,00

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil

José Fabson Santos de Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Cavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

fiscal


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 020/2023					
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023					DATA: 29/05/2023					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
07.001.001	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	6,00			0,00	943,80	5.662,80	0,00	0,00	0,00	5.662,80	0,00
07.001.002	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00			0,00	707,56	8.490,72	0,00	0,00	0,00	8.490,72	0,00
07.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m - fornecimento	un	1,00			0,00	962,22	962,22	0,00	0,00	0,00	962,22	0,00
07.001.004	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	1,00			0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	327,72	0,00
07.001.005	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			0,00	1488,45	1.488,45	0,00	0,00	0,00	1.488,45	0,00
07.001.006	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1,00			0,00	1393,86	1.393,86	0,00	0,00	0,00	1.393,86	0,00
07.001.007	Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	2,56			0,00	847,96	2.170,78	0,00	0,00	0,00	2.170,78	0,00
07.001.008	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	122,85			0,00	21,52	2.643,73	0,00	0,00	0,00	2.643,73	0,00
07.002	ALUMÍNIO							21.974,52	-	-	-	21.974,52	0,00
07.002.001	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	30,40			0,00	406,49	12.357,30	0,00	0,00	0,00	12.357,30	0,00
07.002.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	1,60			0,00	475,06	760,10	0,00	0,00	0,00	760,10	0,00
07.002.003	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	10,74			0,00	485,53	5.214,59	0,00	0,00	0,00	5.214,59	0,00
07.002.004	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1,00			0,00	3642,53	3.642,53	0,00	0,00	0,00	3.642,53	0,00
07.003	VIDRO							12.431,04	-	-	-	12.431,04	0,00
07.003.001	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	m2	17,43			0,00	631,33	11.004,08	0,00	0,00	0,00	11.004,08	0,00
07.003.002	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	2,84			0,00	502,45	1.426,96	0,00	0,00	0,00	1.426,96	0,00
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							97.046,85	-	-	-	97.046,85	0,00
08.001	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS							40.573,74	-	-	-	40.573,74	0,00
08.001.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	1,00			0,00	521,59	521,59	0,00	0,00	0,00	521,59	0,00
08.001.002	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00			0,00	734,57	2.938,28	0,00	0,00	0,00	2.938,28	0,00
08.001.003	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	5,00			0,00	84,45	422,25	0,00	0,00	0,00	422,25	0,00

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil

José Johnson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teófilo Santana
Eng. Civil - CREA/SP 2715638353
Coordenador de Núcleo

Riccal


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023						
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.001.004	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	11,00			0,00	273,66	3.010,26	0,00	0,00	0,00	3.010,26	0,00
08.001.005	Tanque de louça (deca refqt 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares	un	1,00			0,00	1394,31	1.394,31	0,00	0,00	0,00	1.394,31	0,00
08.001.006	Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar	un	1,00			0,00	3474,62	3.474,62	0,00	0,00	0,00	3.474,62	0,00
08.001.007	Saboneteira para sabão líquido	un	12,00			0,00	72,75	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00
08.001.008	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	12,00			0,00	131,69	1.580,28	0,00	0,00	0,00	1.580,28	0,00
08.001.009	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00			0,00	844,39	844,39	0,00	0,00	0,00	844,39	0,00
08.001.010	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	10,30			0,00	986,64	10.162,39	0,00	0,00	0,00	10.162,39	0,00
08.001.011	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	10,00			0,00	520,33	5.203,30	0,00	0,00	0,00	5.203,30	0,00
08.001.012	Suporte para auxilio de deficientes fisicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	10,00			0,00	91,40	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00
08.001.013	Pia de Exurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	1,00			0,00	5003,78	5.003,78	0,00	0,00	0,00	5.003,78	0,00
08.001.014	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	4,00			0,00	73,08	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32	0,00
08.001.015	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	2,00			0,00	130,67	261,34	0,00	0,00	0,00	261,34	0,00
08.001.016	Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar	un	1,00			0,00	3677,63	3.677,63	0,00	0,00	0,00	3.677,63	0,00
08.002	PONTOS DE HIDRÁULICA							10.201,34	-	-	-	10.201,34	0,00
08.002.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	39,00			0,00	131,08	5.112,12	0,00	0,00	0,00	5.112,12	0,00
08.002.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00			0,00	148,88	893,28	0,00	0,00	0,00	893,28	0,00
08.002.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	34,00			0,00	123,41	4.195,94	0,00	0,00	0,00	4.195,94	0,00
08.003	METAIS E ACESSÓRIOS							3.973,50	-	-	-	3.973,50	0,00
08.003.001	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	2,00			0,00	78,65	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

José Fabson Santos de Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

fiscal


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023						
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.003.002	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	18,00			0,00	71,92	1.294,56	0,00	0,00	0,00	1.294,56	0,00
08.003.003	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00			0,00	1900,71	1.900,71	0,00	0,00	0,00	1.900,71	0,00
08.003.004	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)	un	1,00			0,00	96,68	96,68	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00
08.003.005	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00			0,00	117,45	117,45	0,00	0,00	0,00	117,45	0,00
08.003.006	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	9,00			0,00	45,20	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80	0,00
08.004	REDE EXTERNA							14.657,50	-	-	-	14.657,50	0,00
08.004.001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00			0,00	660,69	6.606,90	0,00	0,00	0,00	6.606,90	0,00
08.004.002	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm	m	30,00			0,00	42,62	1.278,60	0,00	0,00	0,00	1.278,60	0,00
08.004.003	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	100,00			0,00	67,72	6.772,00	0,00	0,00	0,00	6.772,00	0,00
08.005	REDE DE AR COMPRIMIDO							8.463,15	-	-	-	8.463,15	0,00
08.005.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022	m	30,00			0,00	82,48	2.474,40	0,00	0,00	0,00	2.474,40	0,00
08.005.002	Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)	un	1,00			0,00	41,95	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00
08.005.003	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás	un	10,00			0,00	36,66	366,60	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00
08.005.004	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	10,00			0,00	558,02	5.580,20	0,00	0,00	0,00	5.580,20	0,00
08.006	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS							5.830,94	-	-	-	5.830,94	0,00
08.006.001	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00			0,00	1900,71	1.900,71	0,00	0,00	0,00	1.900,71	0,00
08.006.002	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	1,00			0,00	92,93	92,93	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00
08.006.003	Filtro modelo Hidro Filter Big Poe 10", da Pentair Hidro Filtros ou similar	un	1,00			0,00	883,49	883,49	0,00	0,00	0,00	883,49	0,00
08.006.004	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00			0,00	968,89	968,89	0,00	0,00	0,00	968,89	0,00
08.006.005	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00			0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
08.006.006	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta	un	1,00			0,00	1833,37	1.833,37	0,00	0,00	0,00	1.833,37	0,00
08.006.007	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00			0,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00
08.007	SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO							13.346,68	-	-	-	13.346,68	0,00
08.007.001	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00			0,00	11980,72	11.980,72	0,00	0,00	0,00	11.980,72	0,00
08.007.002	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00			0,00	1365,96	1.365,96	0,00	0,00	0,00	1.365,96	0,00

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil

Página 6 de 9

José Roberto Santos do Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023						
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09	SINALIZAÇÃO						1.389,65	-	-	-	-	1.389,65	0,00
09.001	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	2,50			0,00	511,53	1.278,83	0,00	0,00	0,00	1.278,83	0,00
09.002	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	un	1,00			0,00	110,82	110,82	0,00	0,00	0,00	110,82	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						66.501,99	-	-	-	-	66.501,99	0,00
10.001	PADRÃO DE ENTRADA						9.911,70	-	-	-	-	9.911,70	0,00
10.001.001	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw	un	1,00			0,00	9911,70	9.911,70	0,00	0,00	0,00	9.911,70	0,00
10.002	PONTOS ELÉTRICOS						43.836,21	-	-	-	-	43.836,21	0,00
10.002.001	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar	un	37,00			0,00	354,96	13.133,52	0,00	0,00	0,00	13.133,52	0,00
10.002.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01	un	8,00			0,00	166,52	1.332,16	0,00	0,00	0,00	1.332,16	0,00
10.002.003	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	18,00			0,00	120,39	2.167,02	0,00	0,00	0,00	2.167,02	0,00
10.002.004	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	3,00			0,00	188,57	565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00
10.002.005	Projeto p/ lampada vapor mercúrio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -90 ou similar) - Fornecimento	Un	2,00			0,00	367,11	734,22	0,00	0,00	0,00	734,22	0,00
10.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	2,00			0,00	41,50	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
10.002.007	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	68,00			0,00	154,21	10.486,28	0,00	0,00	0,00	10.486,28	0,00
10.002.008	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	59,00			0,00	209,94	12.386,46	0,00	0,00	0,00	12.386,46	0,00
10.002.009	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00			0,00	274,40	548,80	0,00	0,00	0,00	548,80	0,00
10.002.010	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	7,00			0,00	342,72	2.399,04	0,00	0,00	0,00	2.399,04	0,00
10.003	QDPG						2.252,03	-	-	-	-	2.252,03	0,00
10.003.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00			0,00	802,51	802,51	0,00	0,00	0,00	802,51	0,00
10.003.002	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00			0,00	575,64	1.151,28	0,00	0,00	0,00	1.151,28	0,00
10.003.003	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00			0,00	298,24	298,24	0,00	0,00	0,00	298,24	0,00

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
CNPJ 07.710.024/2023

José Robinson Santos de Paixão
Eng. Civil - CRE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teles Santana
Eng. Civil - CRE 4000715638353
Coordenador de Núcleo



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023					
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		
10.004	QUADROS						4.020,04	-	-	-	4.020,04	0,00
10.004.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00			802,51	802,51	0,00	0,00	0,00	802,51	0,00
10.004.002	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00			575,64	1.151,28	0,00	0,00	0,00	1.151,28	0,00
10.004.003	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	25,00			82,65	2.066,25	0,00	0,00	0,00	2.066,25	0,00
10.005	LÓGICA E TELEFONIA						6.482,01	-	-	-	6.482,01	0,00
10.005.001	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	11,00			188,77	2.076,47	0,00	0,00	0,00	2.076,47	0,00
10.005.002	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	7,00			197,92	1.385,44	0,00	0,00	0,00	1.385,44	0,00
10.005.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	33,00			8,33	274,89	0,00	0,00	0,00	274,89	0,00
10.005.004	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios	un	1,00			1860,66	1.860,66	0,00	0,00	0,00	1.860,66	0,00
10.005.005	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00			636,32	636,32	0,00	0,00	0,00	636,32	0,00
10.005.006	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	2,00			24,11	48,22	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00
10.005.007	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	1,00			200,01	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00
11	ÁREA EXTERNA						131.338,20	-	46.300,42	46.300,42	85.037,78	35,25
11.001	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	m	116,00			117,27	13.603,32	0,00	0,00	0,00	13.603,32	0,00
11.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	27,79			728,86	20.255,02	0,00	0,00	0,00	20.255,02	0,00
11.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	306,00			21,55	6.594,30	0,00	0,00	0,00	6.594,30	0,00
11.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	154,00			72,26	11.128,04	0,00	0,00	0,00	11.128,04	0,00
11.005	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	43,00			87,02	3.741,86	0,00	0,00	0,00	3.741,86	0,00
11.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00			416,79	1.667,16	0,00	0,00	0,00	1.667,16	0,00
11.007	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	282,00			31,52	8.888,64	0,00	0,00	0,00	8.888,64	0,00
11.008	Muro em alvenaria bloco-cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m2	210,00		202,00	229,21	48.134,10	0,00	46.300,42	46.300,42	1.833,68	96,19

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

José Johnson Soares da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 020/2023						
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			B.M.Nº. 02/ 2023				ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023				DATA: 29/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
11.009	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	12,00			0,00	470,06	5.640,72	0,00	0,00	0,00	5.640,72	0,00
11.010	Limpeza geral	m2	1.726,00			0,00	2,53	4.366,78	0,00	0,00	0,00	4.366,78	0,00
11.011	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	39,50			0,00	117,21	4.629,80	0,00	0,00	0,00	4.629,80	0,00
11.012	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00			0,00	824,72	824,72	0,00	0,00	0,00	824,72	0,00
11.013	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1863,74	1.863,74	0,00	0,00	0,00	1.863,74	0,00
12	PAISAGISMO							14.787,85	-	-	-	14.787,85	0,00
12.001	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00			0,00	91,79	91,79	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00
12.002	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	14,00			0,00	85,66	1.199,24	0,00	0,00	0,00	1.199,24	0,00
12.003	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	7,00			0,00	91,77	642,39	0,00	0,00	0,00	642,39	0,00
12.004	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00			0,00	726,74	2.180,22	0,00	0,00	0,00	2.180,22	0,00
12.005	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	9,00			0,00	91,77	825,93	0,00	0,00	0,00	825,93	0,00
12.006	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	3,00			0,00	91,77	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31	0,00
12.007	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	9,00			0,00	37,65	338,85	0,00	0,00	0,00	338,85	0,00
12.008	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	36,00			0,00	43,44	1.563,84	0,00	0,00	0,00	1.563,84	0,00
12.009	Planta - Iresine (iresine herbstii), fornecimento e plantio	un	116,00			0,00	46,65	5.411,40	0,00	0,00	0,00	5.411,40	0,00
12.010	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00			0,00	43,44	2.258,88	0,00	0,00	0,00	2.258,88	0,00
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							52.839,00	3.445,10	8.867,01	12.312,11	40.526,89	23,30
13.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	450,00	29,34	75,51	104,85	55,16	24.822,00	1.618,39	4.165,13	5.783,53	19.038,47	23,30
13.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	225,00	14,67	37,76	52,43	124,52	28.017,00	1.826,71	4.701,88	6.528,58	21.488,42	23,30
Total geral								880.800,00	57.407,29	147.814,27	205.221,56	675.578,44	23,30
 Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						


José Johnson Santos de Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293064
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2713638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 020/2023
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				B.M.Nº. 02 / 2023	ORDEM DE SERVIÇOS = 13/02/2023
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 01/04/2023 a 26/05/2023	DATA: 29/05/2023
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO	
02	FUNDAÇÃO				
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	48,50	-> ALV. PEDRA = $(9,20m+12,60m+17,60m+7,00m+6,00m+8,30m+6,00m+7,00m+11,60m+19,00m+16,70m+7,60m+4,40m+7,20m) = 140,20m$ Volume = $140,20 \times 0,60 \times 0,50 = 42,06m^3$ -> Sapatas = $(1,30 \times 1,35 \times 0,85) \times 51 \text{ und} = 76,08m^3$ $(1,35 \times 1,40 \times 0,85) \times 02 \text{ und} = 3,21 m^3$ $(1,30 \times 1,25 \times 0,85) \times 01 \text{ und} = 1,38m^3$ Volume = $(76,08+3,21+1,38) = 80,67m^3$ -> Muro = Volume = $101,00 \times 0,60 \times 0,50 = 30,30m^3$ Total geral = $(42,06+80,67+30,30) = 153,03m^3$ Valor medido = $48,50m^3$ Valor a aditar = $153,03 - 48,50 = 104,53m^3$	
02.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	4,85	-> Sapatas = $(1,30m \times 1,35m) \times 51 \text{ und} = 89,50m^3$ $(1,35 \times 1,40) \times 02 \text{ und} = 3,78m^3$ $(1,25 \times 1,30) \times 01 \text{ und} = 1,63m^3$ Volume = $94,91 \times 0,05 = 4,75m^3$ -> Vigas $(2,3,4,5,9,10,13,22,24,25,27,28,30,36,38,41,42,43,44) =$ $(3,60m+3,00m+3,60m+3,60m+1,61m+1,21m+10,70m+3,51m+3,51m+3,51m+1,31m+1,36m+0,30m+3,51m+0,8m+3,51m+3,51m+3,51m) = 59,17m$ $59,17 \times 0,4 = 23,67 m^3$ Volume = $23,67m^3 \times 0,05m = 1,18m^3$ Total geral = $(4,75+1,18) = 5,93m^3$ Valor medido = $4,85m^3$ Valor a aditar = $5,93 - 4,85 = 1,08m^3$	
02.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	26,19	-> SEÇÕES= A01 = $(09,20 \times 1,30 \times 0,35) = 4,19m^3$ A02 = $(12,60 \times 1,00 \times 0,35) = 4,41m^3$ A03 = $(17,60 \times 0,90 \times 0,35) = 5,55m^3$ A04 = $(07,00 \times 1,05 \times 0,35) = 2,57m^3$ A05 = $(06,00 \times 1,20 \times 0,35) = 2,52m^3$ A06 = $(08,30 \times 1,35 \times 0,35) = 3,92m^3$ A07 = $(06,00 \times 1,35 \times 0,35) = 2,84m^3$ A08 = $(07,00 \times 1,35 \times 0,35) = 3,31m^3$ A09 = $(11,60 \times 1,00 \times 0,35) = 4,06m^3$ A10 = $(19,00 \times 1,15 \times 0,35) = 7,65m^3$ A11 = $(16,70 \times 1,15 \times 0,35) = 6,72m^3$ A12 = $(07,60 \times 1,30 \times 0,35) = 3,46m^3$ A13 = $(04,40 \times 1,30 \times 0,35) = 2,00m^3$ A14 = $(07,20 \times 1,30 \times 0,35) = 3,28m^3$ Total geral = $56,48m^3$ Valor medido = $26,19m^3$ Valor a aditar = $56,48 - 26,19 = 30,29m^3$	
02.004	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	22,31	-> VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME ALVENARIA DE PEDRA - VOLUME SAPATAS = $153,03 - 56,48 - 21,21 - 13,17 = 62,17m^3$ Total geral = $62,17m^3$ Valor medido = $22,31m^3$ Valor a aditar = $62,17 - 22,31 = 39,86m^3$	


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil

José Johnson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CRE/SE 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO
02.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	32,74	-> VOLUME DE REATERRO X 25% DE EMPOLAMENTO = 39,86 x 1,25= 49,83M³ Total geral = 49,83m³ Valor medido = 32,74m³ Valor a aditar = 49,83 - 32,74 = 17,09m³
02.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	98,21	-> VOLUME DA CARGA X 1,5T X 2KM = 49,83 x 1,5 x 2 = 149,49tkm Total geral = 149,49m³ Valor medido = 98,21m³ Valor a aditar = 149,49 - 98,21 = 51,28m³
02.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,95	-> VIGAS BALDRAME = V01=8,40m V25=3,51M V02=3,60m V26=5,91M V03=3,00m V27=3,51M V04=3,60m V28=1,31M V05=3,60m V29=1,72M V06=3,00m V30=1,36M V07=10,70m V31=5,37M V08=10,05m V32=2,01M V09=1,31m V10 =1,21m V33=8,58M V11=10,70m V34=8,58M V12=11,40m V35=1,41M V13=10,70m V36=0,30M V14=11,40m V37=5,37M V15=10,70m V38=3,51M V16=7,10m V39=4,55M V17=1,51m V40=1,55M V18=4,42m V41=0,80M V19=1,51m V42=3,51M V20=3,51m V43=3,51M V21=3,51m V44=3,51M V22=3,51m V45=2,01M V23=2,01m V46=3,51M V24=3,51m V47=3,51M Total = 213,17m Volume = (213,17 x 0,14 x 0,30) = 8,95m³
02.008	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfatíca, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapoi ou similar	m2	191,51	-> ARRANQUE PILAR= 38,36 x (0,30+0,14+0,30+0,14) = 33,76m² -> VIGA BALDRAME= 213,17 x (0,30+0,14+0,30) = 157,75M² Total = 191,51m²
02.009	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	160,20	-> 267,00 x 0,60 = 160,20


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

José Roberto Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Soares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Fiscal

ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO
03	ESTRUTURA			
03.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	14,55	-> ARRANQUE PILAR = P02=0,80m P37=0,65M P03=0,88m P38=0,77M P04=0,96m P39=0,93M P05=0,94m P40=1,04M P42=0,30M P07=0,80m P43=0,46M P08=0,98m P44=0,48M P09=0,93m P45=0,56M P11=0,70m P46=0,75M P12=0,80m P47=0,70M P14=0,75m P48=0,65M P15=0,83m P49=0,86M P16=0,97m P50=0,90M P22=0,40m P51=0,66M P23=0,65m P52=0,57M P24=0,60m P53=0,70M P25=0,80m P54=0,16M P26=0,80m P55=0,33M P27=0,95m P56=0,55M P29=1,05m P57=0,55M P30=0,55m P58=0,82M P31=0,97m P59=0,77M P32=0,36m P60=0,77M P33=0,35m P65=0,60M P34=0,63m P66=0,74M P35=0,60m P67=0,70M P36=0,80m P68=0,66M VOLUME CONCRETO = 38,36 x 0,30 x 0,12 = 1,38m³ -> SAPATAS SAPATA 0,70 X 0,80 = 0,244M² X 51 UND = 12,444 SAPATA 0,80 X 0,70 = 0,272M² X 02UND = 0,544 SAPATA 0,60 X 0,70 = 0,185M² VOLUME CONCRETO = 12,444 + 0,544 + 0,185 = 13,17M³ -> VOLUME TOTAL CONCRETO = 13,17+1,38 = 14,55M³
11	ÁREA EXTERNA			
11.008	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m2	202,00	-> 101,00 x 2,00 = 202,00M²
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
13.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	75,51	-> 138.947,26/(880.800,00 - 52.839,00) = 0,1678 x 450h = 75,51h
13.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	37,76	-> 138.947,26/(880.800,00 - 52.839,00) = 0,1678 x 225h = 37,76h
Eng.º Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

José Ruben Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Fiscal

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA,
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

PERÍODO: 01/04/2023 A 26/05/2023

CONTRATO Nº 020/2023

ORDEM DE SERVIÇO

INÍCIO - 13/02/2023



MURO EM BLOCO DE CIMENTO



MURO EM BLOCO DE CIMENTO



ESCAVAÇÃO E MURO EM BLOCO DE CIMENTO



ESCAVAÇÃO E MURO EM BLOCO DE CIMENTO




ESCAVAÇÃO, MURO EM BLOCO DE CIMENTO E
CONCRETO MAGRO




CONCRETO MAGRO


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

ELABORADO POR:


José Fabiano Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2715638354
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

FOLHA 1 de 5



SAPATA



CHAPISCO EM MURO



ALV DE PEDRA, ARRANQUES E MURO REBOCADO



ALVENARIA DE PEDRA




MURO REBOCADO




SAPATAS


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

ELABORADO POR:


José Fabiano Santos Pinão
Eng. Civil - CREA 2120293054
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

FOLHA 2 de 5

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

PERÍODO: 01/04/2023 A 26/05/2023

CONTRATO Nº 020/2023

ORDEM DE SERVIÇO

INÍCIO - 13/02/2023



ALVENARIA DE PEDRA E ARRANQUES



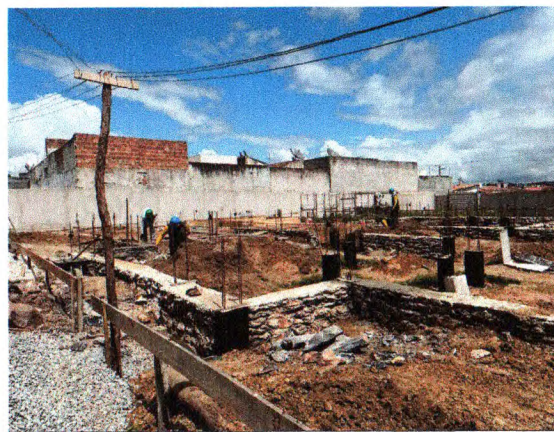
ALVENARIA DE PEDRA E ARRANQUES



ALVENARIA DE PEDRA E ARRANQUES



ALVENARIA DE PEDRA E VIGA BALDRAME





ALVENARIA DE PEDRA, VIGA BALDRAME E PINTURA ASFALTICA




ALVENARIA DE PEDRA, VIGA BALDRAME E PINTURA ASFALTICA

ELABORADO POR:


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232


José Robinson Mendes de Paiva
Eng. Civil - CREA 2720293054
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA RJ 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

FOLHA 3 de 5

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA,
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATORIO FOTOGRAFICO B.M. 02

CONTRATO Nº 020/2023

PERIODO: 01/04/2023 A 26/05/2023

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/02/2023



ALVENARIA DE PEDRA E PINTURA ASFALTICA



ALVENARIA DE PEDRA E VIGA BALDRAME



ALVENARIA DE PEDRA, VIGA BALDRAME E PINTURA
ASFALTICA




ALVENARIA DE PEDRA, VIGA BALDRAME E PINTURA
ASFALTICA




VIGA BALDRAME E PINTURA ASFALTICA




VIGA BALDRAME E PINTURA ASFALTICA


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

ELABORADO POR:


José Roberto de Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gestor


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique dos Santos Santana
Eng. Civil - CREA 2715639353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

FOLHA 4 de 5

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA,
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

PERÍODO: 01/04/2023 A 26/05/2023

CONTRATO Nº 020/2023

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 13/02/2023



VIGA BALDRAME E PINTURA ASFÁLTICA



VIGA BALDRAME E PINTURA ASFÁLTICA



VIGA BALDRAME E PINTURA ASFÁLTICA



ATERRO




ATERRO




ATERRO


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

ELABORADO POR:


Jovã T. Sousa Santos C. Paixão
Eng. Civil - CREA/RN 20293354
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

FOLHA 5 de 5
