

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA - BAIRRO
MIGUEL TELES, NESTE MUNICÍPIO

Bancos
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos
Não
Desonerado:

PERÍODO: 20/04/2026 a 26/06/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Orçamento Sintético						QUANTIDADE			VALOR		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
01	REFORMA DA QUADRA, VESTIÁRIOS E ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA				420.903,48				57.167,67	91.116,57	148.284,24
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				19.498,80				R\$ 2.416,00	R\$ 4.832,00	R\$ 7.248,00
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				19.498,80				R\$ 2.416,00	R\$ 4.832,00	R\$ 7.248,00
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00	158,22	9.493,20	10,00	20,00	30,00	1.582,20	3.164,40	4.746,60
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	83,38	10.005,60	10,00	20,00	30,00	833,80	1.667,60	2.501,40
01.02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.735,44				R\$ 3.735,44	R\$ 0,00	R\$ 3.735,44
01.02.001	PLACA DE OBRA				3.735,44				R\$ 3.735,44	R\$ 0,00	R\$ 3.735,44
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8,00	466,93	3.735,44	8,00		8,00	3.735,44	-	3.735,44
01.03	CANTEIRO DE OBRAS				5.929,92				R\$ 988,32	R\$ 1.976,64	R\$ 2.964,96
01.03.001	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022	mês	6,00	988,32	5.929,92	1,00	2,00	3,00	988,32	1.976,64	2.964,96
01.04	REMOÇÃO E/OU DEMOLIÇÃO INICAL				13.305,11				R\$ 10.803,40	R\$ 227,57	R\$ 11.030,97
01.04.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m³	54,15	129,47	7.010,80	41,56		41,56	5.380,77	-	5.380,77
01.04.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m²	10,71	11,77	126,06		10,35	10,35	-	121,82	121,82
01.04.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	154,90	25,72	3.984,03	154,90		154,90	3.984,03	-	3.984,03


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570


AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

01.04.004	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m²	49,02	11,96	586,28						
01.04.005	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	180,00	1,14	205,20	132,98	132,98	151,60	-	151,60	
01.04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	973,95	1,43	1.392,75	900,00	73,95	973,95	1.287,00	105,75	1.392,75
01.05	QUADRA POLIESPORTIVA				69.154,24			R\$ 39.224,52	R\$ 11.251,66	R\$ 50.476,18	
01.05.001	Restauo - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	11,00	68,11	749,21	6,00	6,00	-	408,66	408,66	
01.05.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	12,70	211,96	2.691,89			-	-	-	
01.05.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m²	3,52	982,02	3.456,71			-	-	-	
01.05.004	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	12,00	25,56	306,72			-	-	-	
01.05.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	154,90	70,00	10.843,00	154,90	154,90	-	10.843,00	10.843,00	
01.05.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma emquadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	676,91	75,50	51.106,71	519,53	519,53	39.224,52	-	39.224,52	
01.06	ÁREAS TOTAIS REMOVIDAS DE REBOCO VESTIÁRIO E/OU QUADRA				3.309,67			R\$ 0,00	R\$ 610,82	R\$ 610,82	
01.06.001	Demolição de reboco	m²	289,56	11,43	3.309,67	53,44	53,44	-	610,82	610,82	
01.07	RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE				15.624,40			R\$ 0,00	R\$ 3.312,79	R\$ 3.312,79	
01.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	289,56	8,33	2.412,03	62,60	62,60	-	521,46	521,46	
01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/ cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	289,56	44,59	12.911,48	62,60	62,60	-	2.791,33	2.791,33	
01.07.003	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silício	m²	21,40	14,06	300,88			-	-	-	
01.08	COBERTURA DA QUADRA				14.855,31			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
01.08.001	Telhamento com telha em aço galvanizado, - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar, simples, ondulada, pré-pintada, OND17	M²	39,21	167,71	6.575,91			-	-	-	


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAD/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400


Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

01.09.008.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	und	1,00	71,05	71,05	1,00	1,00	-	71,05	71,05
01.09.008.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	und	1,00	66,80	66,80	1,00	1,00	-	66,80	66,80
01.09.008.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	m	3,00	13,81	41,43	1,00	1,00	-	13,81	13,81
01.09.008.002	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	442,32	442,32	1,00	1,00	-	442,32	442,32
01.09.008.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	164,20	164,20	-	-	-	-	-
01.09.008.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	1,00	23,57	23,57	-	-	-	-	-
01.09.008.003	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			42.365,70				R\$ 0,00	R\$ 17.906,00	R\$ 17.906,00
01.09.008.003	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLEDC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	und	20,00	745,30	14.906,00	20,00	20,00	-	14.906,00	14.906,00
01.09.008.003	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	und	19,00	129,10	2.452,90	-	-	-	-	-
01.09.008.003	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	und	2,00	32,29	64,58	-	-	-	-	-
01.09.008.003	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	und	2,00	113,72	227,44	-	-	-	-	-
01.09.008.003	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	und	1,00	45,17	45,17	-	-	-	-	-
01.09.008.003	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	und	7,00	34,39	240,73	-	-	-	-	-
01.09.008.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2,00	258,17	516,34	-	-	-	-	-
01.09.008.003	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	und	2,00	56,00	112,00	-	-	-	-	-
01.09.008.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	250,00	12,00	3.000,00	250,00	250,00	-	3.000,00	3.000,00
01.09.008.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	100,00	11,76	1.176,00	-	-	-	-	-


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAUSE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



Mathews dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabiana

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal




		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		R\$ 0,00	R\$ 36.685,63	R\$ 36.685,63
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		-	-	-
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		-	-	-
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		-	-	-
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		-	-	-
		R\$ 0,00	R\$ 36.685,63	R\$ 36.685,63
1.049,36	1.049,36	-	36.685,63	36.685,63
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal




GLOBAL
CONSTRUÇÕES

01.11.007.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.508,10	4.508,10	-	-	-	-	-
01.11.007.002	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.242,99	1.242,99	-	-	-	-	-
01.11.007.003	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af_03/2022	und	1,00	4.064,69	4.064,69	-	-	-	-	-
01.11.008	PAISAGISMO				2.443,60	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.11.008.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	40,00	50,77	2.030,80	-	-	-	-	-
01.11.008.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	80,00	5,16	412,80	-	-	-	-	-
01.11.009	SERVIÇOS DIVERSOS				345,49	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.11.009.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	0,40	38,59	15,44	-	-	-	-	-
01.11.009.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	5,00	66,01	330,05	-	-	-	-	-
01.11.010	SERVIÇOS FINAIS				7.130,42	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.11.010.001	Limpeza geral	m²	1.444,00	3,11	4.490,84	-	-	-	-	-
01.11.010.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	und	1,00	2.639,58	2.639,58	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL					420.903,48	Total Geral	R\$ 57.167,67	R\$ 91.116,57	R\$ 148.284,24	


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400


Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por
CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

ESTADO DE SERGIPE		PERIODO: 20/04/2026 a 26/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO		
OBJ:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA - BAIRRO MIGUEL TELES, NESTE MUNICÍPIO	
CONTRATO: 048/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	ORSE - 11/2025 - Sergipe B.D.I. 23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

20	H
----	---

01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares
---------------	---

20	H
----	---

01.03.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022
-----------	--

2	MÊS
---	-----

01.04.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
-----------	--

PORTA DE MADEIRA (0,9x2,10)		PORTA DE MADEIRA (0,6X2,1)	
COMPRIMENTO (m)	0,90	COMPRIMENTO (m)	0,60
ALTURA (m)	2,10	ALTURA (m)	2,10
QUANTIDADE	3X	TOTAL (m²)	2,52
TOTAL (m²)	5,67		

PORTA DE MADEIRA (0,6X1,6)	
COMPRIMENTO (m)	0,60
ALTURA (m)	1,80
TOTAL (m²)	2,16
TOTAL (m²)	10,35

01.04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
-----------	---

TONELADA DE BOTA FORA (t)	7,50	TONELADA (t)	11,25
DENSIDADE (m³)	1,50	QUILOMETRAGEM (km)	6,50
TOTAL (t)	11,25	TOTAL (tkm)	73,95

01.05.001	Restauero - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com
-----------	---

6	m
---	---


 Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jossivan Costa Leal
 Engenheiro Civil
 CREA-2722949148-SE

01.05.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
-----------	---

ÁREA (m²)	11,06
QUANTIDADE	14,00
ÁREA TOTAL (m²)	154,90

01.06.001	Demolição de reboco
-----------	---------------------

PALCO		ARQUIBANCADA	
COMPRIMENTO (m)	15,60	COMPRIMENTO (m)	51,20
ALTURA (m)	0,80	ALTURA (m)	0,80
TOTAL (m²)	12,48	TOTAL (m²)	40,96
TOTAL (m²)		TOTAL (m²)	53,44

01.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
-----------	--

MURO	
COMPRIMENTO (m)	31,30
ALTURA (m)	2,00
TOTAL (m²)	62,60

01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/ cal / areia), espessura 2,0 cm
-----------	--

MURO	
COMPRIMENTO (m)	31,30
ALTURA (m)	2,00
TOTAL (m²)	62,60

01.09.002.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm
---------------	---

COMPRIMENTO (m)	7,50
LARGURA (m)	2,00
QUANTIDADE	x2
TOTAL (m²)	30,02


01.09.002.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
---------------	---

COMPRIMENTO (m)	7,50
LARGURA (m)	2,00
QUANTIDADE	X2
TOTAL (m²)	30,02

01.09.003.001	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras
---------------	---

VESTIÁRIO		VESTIÁRIO		W.C	
PERÍMETRO (m)	6,70	PERÍMETRO (m)	6,3+6,3+3,00+3,00	PERÍMETRO (m)	3,6
ALTURA (m)	2,00	ALTURA (m)	2,70	ALTURA (m)	2,70
		QUANTIDADE	X2	QUANTIDADE	X2
TOTAL (m²)	13,39	TOTAL (m²)	100,44	TOTAL (m²)	19,44
		ÁREA TOTAL (M²)	133,27		


 Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jossivan Costa Leal
 Engenheiro Civil
 CREA-2722949148-SE

01.09.003.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
---------------	---

VESTIÁRIO		VESTIÁRIO		W.C	
PERÍMETRO (m)	6,70	PERÍMETRO (m)	6,3+6,3+3,00+3,00	PERÍMETRO (m)	3,6
ALTURA (m)	2,00	ALTURA (m)	2,70	ALTURA (m)	2,70
		QUANTIDADE	X2	QUANTIDADE	X2
TOTAL (m²)	13,39	TOTAL (m²)	100,44	TOTAL (m²)	19,44
		ÁREA TOTAL(M²)	133,27		

01.09.008.001.	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03
----------------	---

1	UND
---	-----

01.09.008.001.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025
----------------	---

1	UND
---	-----

01.09.008.001	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C
---------------	---

10	m
----	---

01.09.008.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025
---------------	---

1	UND
---	-----

01.09.008.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025
---------------	---

1	UND
---	-----

01.09.008.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025
---------------	---

1	UND
---	-----

01.09.008.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025
---------------	---

1	UND
---	-----

01.09.008.002	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
---------------	---

1	UND
---	-----

01.09.008.003	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLD-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar
---------------	---

20	UND
----	-----

01.09.008.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c
---------------	--

250	M
-----	---

01.11.005.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
---------------	---

1049,36	m²
---------	----


 Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jossivan Costa Leal
 Engenheiro Civil
 CREA-2722949148-SE

CAMILLA
 RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531
 407504

Assinado de forma
 digital por CAMILLA
 RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407
 504

		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana-SE	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA - BAIRRO MIGUEL TELES, NESTE MUNICÍPIO
CONTRATO: 048/2026	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/04/2026 À 26/06/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA., CNPJ: 23.884.541/0001-02	
BOLETEM DE MEDIÇÃO BM-02	ORSE - 11/2025 - Sergipe	B.D.I. 23,54% NÃO DESONERADO	

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



Imagem 1 - Container

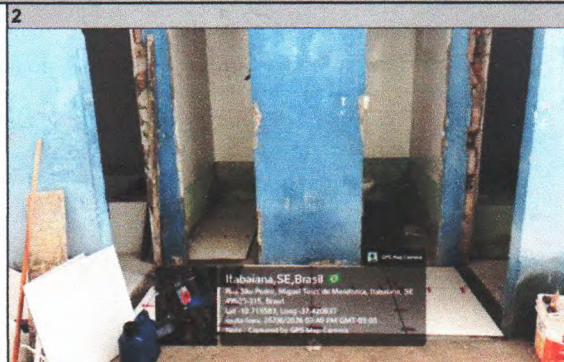


Imagem 2 - Remoção de portas

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

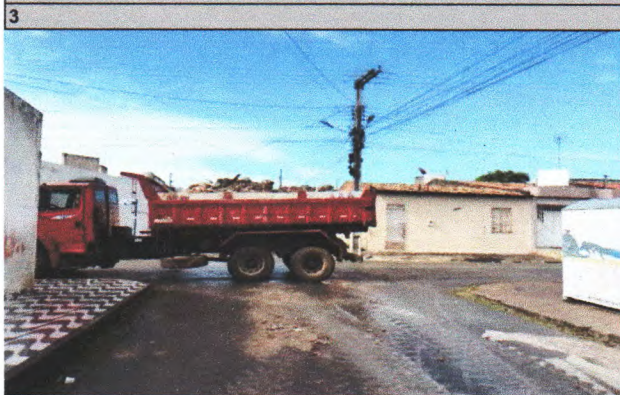


Imagem 3 - Transporte com caminhão basculante



Imagem 4 - Revestimento cerâmico dos pilares da quadra

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

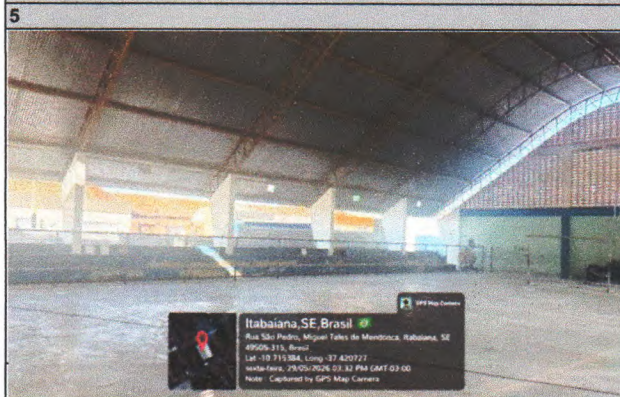


Imagem 5 - Demolição do reboco

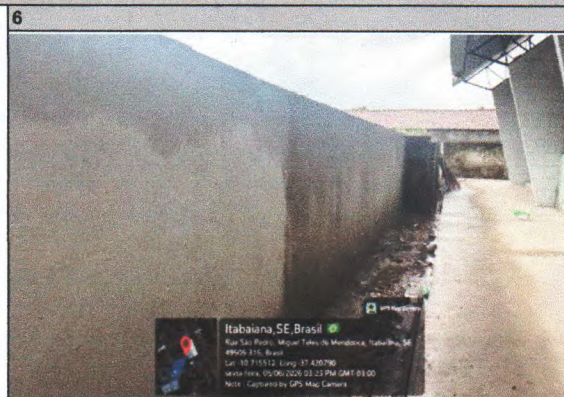


Imagem 6 - Chapisco e reboco do muro

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



Imagem 7 - Regularização da base para revestimento



Imagem 8 - Piso cerâmico 54x54cm dos vestiários e W.C

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



Imagem 9 - Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras

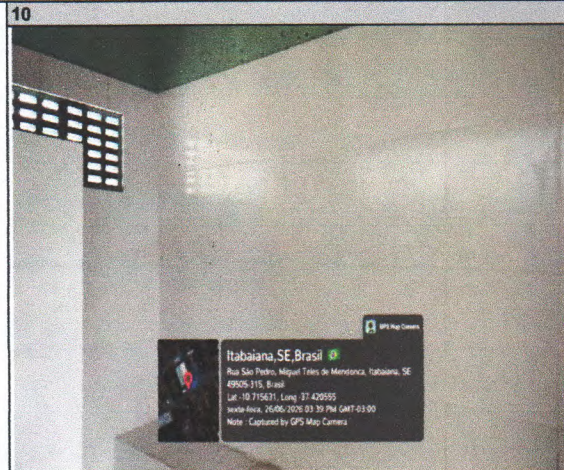


Imagem 10 - Revestimento cerâmico dos vestiários e w.c

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



Imagem 11 - Quadro de medição



Imagem 12 - Disjuntor de 50 A

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Imagem 13 - Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01/03/2022

Imagem 14 - cabo rígido de 10mm

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

17

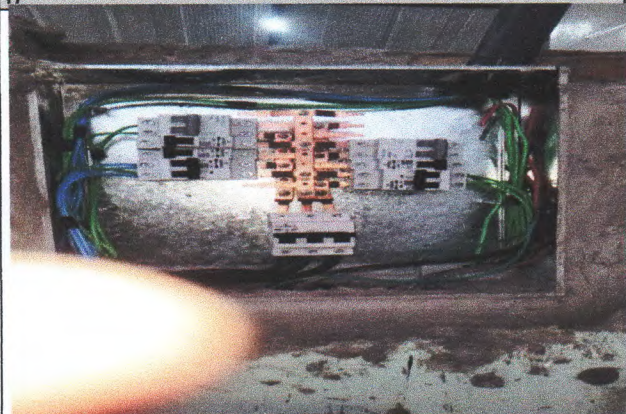


Imagem 17- Diajuntores de 50A, 25A e 16A e os cabos flível de 4,00mm

18

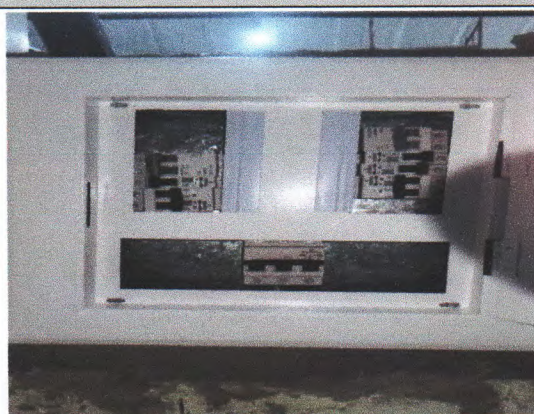


Imagem 18- Quadro de distribuição

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

19

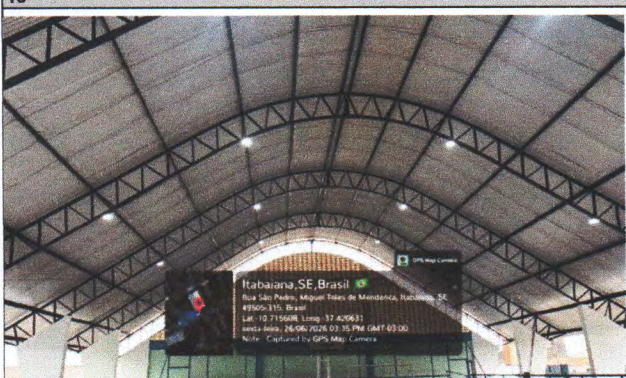


Imagem 19 -Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar

20

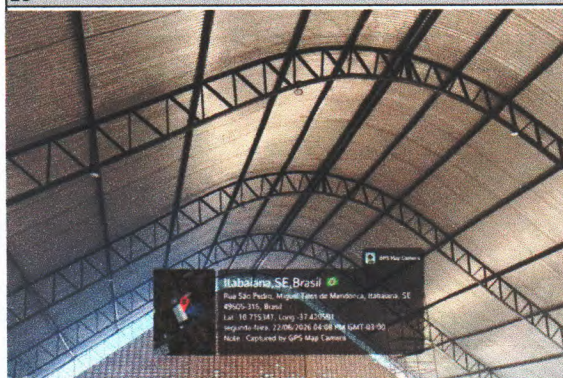


Imagem 20- Pintura da estrutura metalica da cobertura

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Josivaldo Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453
1407504

Assinado de forma
digital por
CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504
