

MODICON		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA										
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM		2		CONTRATO:166/2024			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 10.445,64	R\$ 6.492,36	R\$ 3.953,28	R\$ 10.445,64	R\$ -	100,00%	
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	R\$ 458,67	R\$ 5.504,04	R\$ 5.504,04	R\$ -	R\$ 5.504,04	R\$ -	100,00%	
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	1,00	4,00	5,00	R\$ 988,32	R\$ 4.941,60	R\$ 988,32	R\$ 3.953,28	R\$ 4.941,60	R\$ -	100,00%	
02	CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"							R\$ 79.854,97	R\$ 19.437,11	R\$ -	R\$ 19.437,11	R\$ 60.417,86	24,34%	
02.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 16.871,76	R\$ 16.871,76	R\$ -	R\$ 16.871,76	-R\$ 0,00	100,00%	
02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m2	509,65	509,65		509,65	R\$ 2,41	R\$ 1.228,26	R\$ 1.228,26	R\$ -	R\$ 1.228,26	R\$ 0,00	100,00%	
02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	509,65	509,65		509,65	R\$ 1,14	R\$ 581,00	R\$ 581,00	R\$ -	R\$ 581,00	-R\$ 0,00	100,00%	
02.001.003	Material para sub-base, clu>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	254,82	254,82		254,82	R\$ 14,82	R\$ 3.776,43	R\$ 3.776,43	R\$ -	R\$ 3.776,43	-R\$ 0,00	100,00%	
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.586,85	4.586,85		4.586,85	R\$ 1,07	R\$ 4.907,93	R\$ 4.907,93	R\$ -	R\$ 4.907,93	R\$ 0,00	100,00%	
02.001.005	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	254,82	254,82		254,82	R\$ 25,03	R\$ 6.378,14	R\$ 6.378,14	R\$ -	R\$ 6.378,14	-R\$ 0,00	100,00%	
02.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 9.304,97	R\$ 2.565,35	R\$ -	R\$ 2.565,35	R\$ 6.739,62	27,57%	
02.002.001	Misto-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	62,13	62,13		62,13	R\$ 41,29	R\$ 2.565,35	R\$ 2.565,35	R\$ -	R\$ 2.565,35	R\$ 0,00	100,00%	
02.002.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	69,31			-	R\$ 49,95	R\$ 3.462,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.462,03	0,00%	
02.002.003	Lona plástica preta	m2	69,31			-	R\$ 7,05	R\$ 488,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,64	0,00%	
02.002.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colação de areia	m2	23,22			-	R\$ 120,11	R\$ 2.788,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.788,95	0,00%	
02.003	VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO							R\$ 24.467,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.467,92	0,00%	
02.003.001	TIPO 1 (3X)							R\$ 10.114,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.114,07	0,00%	
02.003.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78			-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.226,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.226,15	0,00%	
02.003.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91			-	R\$ 45,39	R\$ 1.085,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,27	0,00%	
02.003.001.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,91			-	R\$ 23,94	R\$ 572,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,41	0,00%	
02.003.001.004	Pinura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91			-	R\$ 135,10	R\$ 3.230,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,24	0,00%	
02.003.002	TIPO 2 (3X)							R\$ 10.627,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.627,69	0,00%	
02.003.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98			-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.813,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.813,36	0,00%	
02.003.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55			-	R\$ 45,39	R\$ 1.068,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,93	0,00%	
02.003.002.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,55			-	R\$ 23,94	R\$ 563,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,79	0,00%	
02.003.002.004	Pinura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55			-	R\$ 135,10	R\$ 3.181,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.181,61	0,00%	
02.003.003	TIPO 3 (1X)							R\$ 3.726,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.726,16	0,00%	
02.003.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71			-	R\$ 2.936,04	R\$ 2.084,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084,59	0,00%	
02.003.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03			-	R\$ 45,39	R\$ 364,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,48	0,00%	
02.003.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,03			-	R\$ 23,94	R\$ 192,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,24	0,00%	
02.003.003.004	Pinura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03			-	R\$ 135,10	R\$ 1.084,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,85	0,00%	
02.004	MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"							R\$ 11.113,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.113,14	0,00%	
02.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23			-	R\$ 120,18	R\$ 2.190,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.190,88	0,00%	
02.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46			-	R\$ 45,39	R\$ 1.654,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.654,92	0,00%	
02.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,46			-	R\$ 23,94	R\$ 872,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 872,85	0,00%	
02.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,88			-	R\$ 173,82	R\$ 500,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,60	0,00%	

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:26:32 -03'00'

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil-CREA - 27158184-24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Garcez de Oliveira Junior
Eng.º Civil-CREA - 27044575-22
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MOBICON		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA										
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM		2		CONTRATO:166/2024			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Total	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
02.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,60			-	R\$ 1,21	R\$ 4,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,36	0,00%	
02.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82			-	R\$ 1,07	R\$ 69,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	0,00%	
02.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,31			-	R\$ 702,31	R\$ 217,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,72	0,00%	
02.004.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Branco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco	m2	24,40			-	R\$ 172,05	R\$ 4.198,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.198,02	0,00%	
02.004.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25			-	R\$ 624,19	R\$ 1.404,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,43	0,00%	
02.005	MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"							R\$ 3.281,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.281,99	0,00%	
02.005.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (tingela), com argamassa traço 15 - 1 - 2 - 8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00			-	R\$ 120,18	R\$ 480,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,72	0,00%	
02.005.002	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1 - 2 - 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00			-	R\$ 45,39	R\$ 363,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,12	0,00%	
02.005.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1 - 3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,00			-	R\$ 23,94	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,52	0,00%	
02.005.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	8,03			-	R\$ 173,82	R\$ 1.395,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,77	0,00%	
02.005.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	10,04			-	R\$ 1,21	R\$ 12,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,15	0,00%	
02.005.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72			-	R\$ 1,07	R\$ 193,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,37	0,00%	
02.005.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,27			-	R\$ 702,31	R\$ 189,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,62	0,00%	
02.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35			-	R\$ 48,74	R\$ 455,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,72	0,00%	
02.006	DIVERSOS							R\$ 14.815,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.815,19	0,00%	
02.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	417,12			-	R\$ 24,05	R\$ 10.031,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.031,74	0,00%	
02.006.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, inclusive fundo preparador - af 05/2021	m2	18,64			-	R\$ 18,56	R\$ 345,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,96	0,00%	
02.006.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50			-	R\$ 218,09	R\$ 2.944,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,22	0,00%	
02.006.004	Limpeza geral	m2	509,65			-	R\$ 2,93	R\$ 1.493,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,27	0,00%	
03	ROTATORIA 1							R\$ 234.333,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.333,41	0,00%	
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 48.134,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.134,54	0,00%	
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno e/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dist até 1km	m2	1.453,99			-	R\$ 2,41	R\$ 3.504,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.504,12	0,00%	
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.453,99			-	R\$ 1,14	R\$ 1.657,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,55	0,00%	
03.001.003	Material para sub-base, chr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	727,00			-	R\$ 14,82	R\$ 10.774,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.774,14	0,00%	
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	13.085,91			-	R\$ 1,07	R\$ 14.001,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.001,92	0,00%	
03.001.005	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	727,00			-	R\$ 25,03	R\$ 18.196,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.196,81	0,00%	
03.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 100.107,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.107,63	0,00%	
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44			-	R\$ 7,05	R\$ 4.458,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.458,70	0,00%	
03.002.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres tucos	m2	632,44			-	R\$ 49,95	R\$ 31.590,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.590,38	0,00%	
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, inclusive fundo preparador - af 05/2021	m2	188,74			-	R\$ 18,56	R\$ 3.503,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,01	0,00%	
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m³	91,71			-	R\$ 111,19	R\$ 10.197,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.197,23	0,00%	
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 - 3	m	375,95			-	R\$ 41,29	R\$ 15.522,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.522,98	0,00%	
03.002.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78			-	R\$ 120,11	R\$ 4.177,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.177,43	0,00%	
03.002.007	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39uu/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cuxim areia grossa compactada e/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado e/ areia fina	m2	164,11			-	R\$ 103,00	R\$ 16.903,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.903,33	0,00%	

MILTON SALES SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:26:45 -03'00'

Assinado de forma digital por
José Góes de Oliveira Junior
 Eng. Civil CREA - 27044 57522
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MOBICON CONSTRUTORA		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM	2	CONTRATO:166/2024				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
03.002.008	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 1/4mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	135,86		-	R\$ 101,24	R\$ 13.754,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.754,47	0,00%	
03.003	VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO						R\$ 12.453,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.453,31	0,00%	
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76		-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.167,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.167,43	0,00%	
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64		-	R\$ 45,39	R\$ 1.617,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,70	0,00%	
03.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	35,64		-	R\$ 23,94	R\$ 853,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,22	0,00%	
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	35,64		-	R\$ 135,10	R\$ 4.814,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.814,96	0,00%	
03.004	MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"						R\$ 18.881,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.881,81	0,00%	
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (tingela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10		-	R\$ 120,18	R\$ 1.934,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,90	0,00%	
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20		-	R\$ 45,39	R\$ 1.461,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.461,56	0,00%	
03.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	32,20		-	R\$ 23,94	R\$ 770,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,87	0,00%	
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	16,56		-	R\$ 173,82	R\$ 2.878,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.878,46	0,00%	
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70		-	R\$ 1,21	R\$ 25,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,05	0,00%	
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,60		-	R\$ 1,07	R\$ 398,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,68	0,00%	
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05		-	R\$ 702,31	R\$ 1.439,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.439,74	0,00%	
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	m2	41,10		-	R\$ 18,56	R\$ 762,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,82	0,00%	
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	16,10		-	R\$ 135,10	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.175,11	0,00%	
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27		-	R\$ 624,19	R\$ 7.034,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.034,62	0,00%	
03.005	CANTEIRO "PERGOLADOS"						R\$ 29.733,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.733,77	0,00%	
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	24,94		-	R\$ 110,95	R\$ 2.767,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.767,09	0,00%	
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	25,82		-	R\$ 103,00	R\$ 2.659,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,46	0,00%	
03.005.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26		-	R\$ 24,05	R\$ 775,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,85	0,00%	
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em madeira nobre, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo, af_11/2021	m2	56,38		-	R\$ 328,07	R\$ 18.558,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.558,92	0,00%	
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22,80		-	R\$ 218,09	R\$ 4.972,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.972,45	0,00%	
03.006	DIVERSOS						R\$ 25.022,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.022,45	0,00%	
03.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	395,09		-	R\$ 24,05	R\$ 9.501,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.501,91	0,00%	
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	32,89		-	R\$ 218,09	R\$ 7.172,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.172,98	0,00%	
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00		-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%	
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00		-	R\$ 410,89	R\$ 1.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232,67	0,00%	
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	m2	112,79		-	R\$ 18,56	R\$ 2.093,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,38	0,00%	
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.453,99		-	R\$ 2,93	R\$ 4.260,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.260,19	0,00%	
04	ROTATORIA 2						R\$ 280.134,49	R\$ -	R\$ 6.536,21	R\$ 6.536,21	R\$ 273.598,28	2,33%	
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 65.001,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.001,68	0,00%	
04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m2	1.963,50		-	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.732,04	0,00%	

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:26:54 -03'00'


José Carlos de Oliveira Junior
 Eng. Civil CREA - 2704457522
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MOBICON		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM		2		CONTRATO:166/2024				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)							
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido		
04.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50			-	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.238,39	0,00%		
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75			-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%		
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50			-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%		
04.001.005	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75			-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.573,20	0,00%		
04.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 138.300,65	R\$ -	R\$ 6.536,21	R\$ 6.536,21	R\$ 131.764,44	4,73%		
04.002.001	Meso-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), reunito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	580,20		158,30	158,30	R\$ 41,29	R\$ 23.956,46	R\$ -	R\$ 6.536,21	R\$ 6.536,21	R\$ 17.420,25	27,28%		
04.002.002	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00			-	R\$ 14,82	R\$ 1.556,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.556,10	0,00%		
04.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.890,00			-	R\$ 1,07	R\$ 2.022,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.022,30	0,00%		
04.002.004	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00			-	R\$ 25,03	R\$ 2.628,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628,15	0,00%		
04.002.005	Lona plástica preta	m2	957,60			-	R\$ 7,05	R\$ 6.751,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.751,08	0,00%		
04.002.006	Piso em concreto simples desempenado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	957,60			-	R\$ 49,95	R\$ 47.832,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.832,12	0,00%		
04.002.007	Pinura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	957,60			-	R\$ 18,56	R\$ 17.773,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.773,06	0,00%		
04.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, inteirado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cossim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, reunito c/ areia fina	m2	322,50			-	R\$ 110,95	R\$ 35.781,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.781,38	0,00%		
04.003	ALVENARIA DE PEDRA							R\$ 16.971,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.971,42	0,00%		
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,04			-	R\$ 64,72	R\$ 455,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,63	0,00%		
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40			-	R\$ 12,91	R\$ 108,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,44	0,00%		
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,40			-	R\$ 1,07	R\$ 32,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,53	0,00%		
04.003.004	Alvenaria pedra calcírea argamassada c/ cimento e areia traço t=1 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pacotelas areia dim. 0,35φ/ 45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	19,47			-	R\$ 636,19	R\$ 12.386,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.386,62	0,00%		
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisto 08/2015	m2	39,10			-	R\$ 8,12	R\$ 317,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,49	0,00%		
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10			-	R\$ 42,28	R\$ 1.653,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,15	0,00%		
04.003.007	Pinura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta preta latex convencional para exteriores - Rev. 03	m2	39,10			-	R\$ 51,60	R\$ 2.017,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.017,56	0,00%		
04.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO							R\$ 17.900,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.900,25	0,00%		
04.004.001	Chapisco em parede rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,72			-	R\$ 23,94	R\$ 879,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,08	0,00%		
04.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,72			-	R\$ 45,39	R\$ 1.666,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666,72	0,00%		
04.004.003	Pinura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	36,72			-	R\$ 135,10	R\$ 4.960,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.960,87	0,00%		
04.004.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 taros)	m3	3,54			-	R\$ 2.936,04	R\$ 10.393,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.393,58	0,00%		
04.005	DIVERSOS							R\$ 41.960,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.960,49	0,00%		
04.005.001	Grime estendida em placas, formecimento e plantio	m2	608,30			-	R\$ 24,05	R\$ 14.629,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.629,62	0,00%		
04.005.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	73,10			-	R\$ 218,09	R\$ 15.942,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.942,38	0,00%		
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenado, com pintura indicativa em roscador, 02 demãos	un	2,00			-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%		
04.005.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), PROTEGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			-	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,56	0,00%		
04.005.005	Pinura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	174,06			-	R\$ 18,56	R\$ 3.230,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,55	0,00%		
04.005.006	Limpeza geral	m2	1.963,50			-	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,06	0,00%		
05	ROTULA 3							R\$ 312.182,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312.182,52	0,00%		
05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 65.001,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.001,68	0,00%		

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:27:03 -03'00'


Rita Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Carlos de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 27044575/22
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MOBICON		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA										
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM	2	CONTRATO:166/2024					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)							
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno e/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m2	1.963,50			-	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.732,04	0,00%	
05.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50			-	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.238,39	0,00%	
05.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75			-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%	
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50			-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%	
05.001.005	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75			-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.573,20	0,00%	
05.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 136.913,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.913,26	0,00%	
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	365,00			-	R\$ 41,29	R\$ 15.070,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.070,85	0,00%	
05.002.002	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	114,06			-	R\$ 14,82	R\$ 1.690,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690,37	0,00%	
05.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09			-	R\$ 1,07	R\$ 183,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,07	0,00%	
05.002.004	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06			-	R\$ 25,03	R\$ 2.854,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.854,92	0,00%	
05.002.005	Lona plástica preta	m2	858,61			-	R\$ 7,05	R\$ 6.053,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.053,20	0,00%	
05.002.006	Piso em concreto simples desempenado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61			-	R\$ 49,95	R\$ 42.887,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.887,57	0,00%	
05.002.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador - af. 05/2021	m2	858,61			-	R\$ 18,56	R\$ 15.935,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.935,80	0,00%	
05.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada e/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado e/ areia fina	m2	470,82			-	R\$ 110,95	R\$ 52.237,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.237,48	0,00%	
05.003	ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO							R\$ 22.394,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.394,77	0,00%	
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00			-	R\$ 64,72	R\$ 970,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,80	0,00%	
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00			-	R\$ 1,21	R\$ 21,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,78	0,00%	
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00			-	R\$ 1,07	R\$ 57,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,78	0,00%	
05.003.004	Alvenaria pedra calcarea argamassada e/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pacotes areia din. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	15,00			-	R\$ 636,19	R\$ 9.542,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.542,85	0,00%	
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev 06	m2	43,64			-	R\$ 80,17	R\$ 3.498,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,62	0,00%	
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	87,28			-	R\$ 45,39	R\$ 3.961,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.961,64	0,00%	
05.003.007	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	87,28			-	R\$ 23,94	R\$ 2.089,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.089,48	0,00%	
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,64			-	R\$ 51,60	R\$ 2.251,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,82	0,00%	
05.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO							R\$ 28.682,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.682,63	0,00%	
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	64,33			-	R\$ 45,39	R\$ 2.919,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.919,94	0,00%	
05.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	64,33			-	R\$ 23,94	R\$ 1.540,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,06	0,00%	
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,29			-	R\$ 2.936,04	R\$ 15.531,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.531,65	0,00%	
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	64,33			-	R\$ 135,10	R\$ 8.690,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.690,98	0,00%	
05.005	DIVERSOS							R\$ 59.190,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.190,18	0,00%	
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af. 11/2021	m2	58,80			-	R\$ 328,07	R\$ 19.290,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.290,52	0,00%	
05.005.002	Grma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	558,70			-	R\$ 24,05	R\$ 13.436,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.436,74	0,00%	
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00			-	R\$ 218,09	R\$ 11.776,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.776,86	0,00%	
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%	

MILTON SALES SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:27:14 -03'00'


 José Carlos de Oliveira Junior
 Eng. Civil CREA - 2704457522
 Coordenador de Núcleo



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA						BM	2		CONTRATO:166/2024					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana						PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			-	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,56	0,00%	
05.005.006	Mesa banco (padrão embu)	un	4,00			-	R\$ 1.123,95	R\$ 4.495,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.495,80	0,00%	
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	109,50			-	R\$ 18,56	R\$ 2.032,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,32	0,00%	
05.005.008	Limpeza geral	m2	1.963,50			-	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,06	0,00%	
06	CANTEIRO 1							R\$ 134.864,64	R\$ 45.957,82	R\$ 11.064,07	R\$ 57.021,89	R\$ 77.842,75	42,28%	
06.001	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA							R\$ 45.957,82	R\$ 45.957,82	R\$ -	R\$ 45.957,82	R\$ 0,00	100,00%	
06.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1 km	m2	1.388,25	1.388,25		1.388,25	R\$ 2,41	R\$ 3.345,68	R\$ 3.345,68	R\$ -	R\$ 3.345,68	-R\$ 0,00	100,00%	
06.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.388,25	1.388,25		1.388,25	R\$ 1,14	R\$ 1.582,61	R\$ 1.582,61	R\$ -	R\$ 1.582,61	R\$ 0,01	100,00%	
06.001.003	Material para sub-base, cb>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	694,12	694,12		694,12	R\$ 14,82	R\$ 10.286,86	R\$ 10.286,86	R\$ -	R\$ 10.286,86	R\$ 0,00	100,00%	
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12.494,25	12.494,25		12.494,25	R\$ 1,07	R\$ 13.368,85	R\$ 13.368,85	R\$ -	R\$ 13.368,85	R\$ 0,00	100,00%	
06.001.005	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	694,12	694,12		694,12	R\$ 25,03	R\$ 17.373,82	R\$ 17.373,82	R\$ -	R\$ 17.373,82	-R\$ 0,00	100,00%	
06.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 71.164,67	R\$ -	R\$ 11.064,07	R\$ 11.064,07	R\$ 60.100,60	15,55%	
06.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	461,25		267,96	267,96	R\$ 41,29	R\$ 19.045,01	R\$ -	R\$ 11.064,07	R\$ 11.064,07	R\$ 7.980,94	58,09%	
06.002.002	Lona plástica preta	m2	372,47			-	R\$ 7,05	R\$ 2.625,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.625,91	0,00%	
06.002.003	Piso em concreto simples desempenado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	372,47			-	R\$ 49,95	R\$ 18.604,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.604,88	0,00%	
06.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q51, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	214,67			-	R\$ 143,89	R\$ 30.888,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.888,87	0,00%	
06.003	DIVERSOS							R\$ 17.742,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.742,15	0,00%	
06.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47			-	R\$ 24,05	R\$ 3.907,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.907,40	0,00%	
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00			-	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%	
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	464,72			-	R\$ 18,56	R\$ 8.625,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.625,20	0,00%	
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25			-	R\$ 2,93	R\$ 4.067,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.067,57	0,00%	
07	CANTEIRO 2							R\$ 554.117,37	R\$ -	R\$ 213.885,35	R\$ 213.885,35	R\$ 340.232,02	38,60%	
07.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 125.210,21	R\$ -	R\$ 100.165,80	R\$ 100.165,80	R\$ 25.044,41	80,00%	
07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1 km	m2	3.782,13		3.025,70	3.025,70	R\$ 2,41	R\$ 9.114,93	R\$ -	R\$ 7.291,94	R\$ 7.291,94	R\$ 1.822,99	80,00%	
07.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.782,13		3.025,70	3.025,70	R\$ 1,14	R\$ 4.311,63	R\$ -	R\$ 3.449,30	R\$ 3.449,30	R\$ 862,33	80,00%	
07.001.003	Material para sub-base, cb>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.891,06		1.512,85	1.512,85	R\$ 14,82	R\$ 28.025,51	R\$ -	R\$ 22.420,44	R\$ 22.420,44	R\$ 5.605,07	80,00%	
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	34.039,17		27.231,30	27.231,30	R\$ 1,07	R\$ 36.421,91	R\$ -	R\$ 29.137,49	R\$ 29.137,49	R\$ 7.284,42	80,00%	
07.001.005	Execução de aterro compactado sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.891,06		1.512,85	1.512,85	R\$ 25,03	R\$ 47.333,23	R\$ -	R\$ 37.866,64	R\$ 37.866,64	R\$ 9.466,59	80,00%	
07.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 355.309,34	R\$ -	R\$ 113.719,55	R\$ 113.719,55	R\$ 241.589,79	32,01%	
07.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.755,14		930,00	930,00	R\$ 41,29	R\$ 113.759,73	R\$ -	R\$ 38.399,70	R\$ 38.399,70	R\$ 75.360,03	33,76%	
07.002.002	Lona plástica preta	m2	1.718,35		499,01	499,01	R\$ 7,05	R\$ 12.114,37	R\$ -	R\$ 3.518,02	R\$ 3.518,02	R\$ 8.596,35	29,04%	
07.002.003	Piso em concreto simples desempenado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.718,35			-	R\$ 49,95	R\$ 85.831,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.831,58	0,00%	
07.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q51, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	998,01		499,01	499,01	R\$ 143,89	R\$ 143.603,66	R\$ -	R\$ 71.801,83	R\$ 71.801,83	R\$ 71.801,83	50,00%	
07.003	DIVERSOS							R\$ 73.600,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.600,82	0,00%	
07.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	784,90			-	R\$ 24,05	R\$ 18.876,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.876,85	0,00%	
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00			-	R\$ 380,66	R\$ 1.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,64	0,00%	
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	2.269,38			-	R\$ 18,56	R\$ 42.119,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.119,69	0,00%	
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.782,13			-	R\$ 2,93	R\$ 11.081,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.081,64	0,00%	
08	CANTEIRO 3							R\$ 350.960,48	R\$ -	R\$ 54.895,14	R\$ 54.895,14	R\$ 296.065,34	15,64%	
08.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 85.015,75	R\$ -	R\$ 42.508,14	R\$ 42.508,14	R\$ 42.507,61	50,00%	

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:27:25 -03'00'

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.º CIVIL CREA - 2715818424
Coordenadora de Nucleo

Jose Garcez de Oliveira Junior
Eng.º CIVIL CREA - 2704457522
Coordenador de Nucleo

MODICON													
MOBICON CONSTRUTORA LTDA.													
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA													
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM		2		CONTRATO:166/2024		
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
08.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m2	2.568,07		1.284,04	1.284,04	R\$ 2,41	R\$ 6.189,05	R\$ -	R\$ 3.094,54	R\$ 3.094,54	R\$ 3.094,51	50,00%
08.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.568,07		1.284,04	1.284,04	R\$ 1,14	R\$ 2.927,60	R\$ -	R\$ 1.463,81	R\$ 1.463,81	R\$ 1.463,79	50,00%
08.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.284,03		642,02	642,02	R\$ 14,82	R\$ 19.029,32	R\$ -	R\$ 9.514,74	R\$ 9.514,74	R\$ 9.514,58	50,00%
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	23.112,63		11.556,36	11.556,36	R\$ 1,07	R\$ 24.730,51	R\$ -	R\$ 12.365,31	R\$ 12.365,31	R\$ 12.365,20	50,00%
08.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.284,03		642,02	642,02	R\$ 25,03	R\$ 32.139,27	R\$ -	R\$ 16.069,76	R\$ 16.069,76	R\$ 16.069,51	50,00%
08.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 217.628,52	R\$ -	R\$ 12.387,00	R\$ 12.387,00	R\$ 205.241,52	5,69%
08.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.633,71		300,00	300,00	R\$ 41,29	R\$ 67.455,89	R\$ -	R\$ 12.387,00	R\$ 12.387,00	R\$ 55.068,89	18,36%
08.002.002	Lona plástica preta	m2	1.183,54		-	-	R\$ 7,05	R\$ 8.343,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.343,96	0,00%
08.002.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.183,54		-	-	R\$ 49,95	R\$ 59.117,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.117,82	0,00%
08.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compnc. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	574,82		-	-	R\$ 143,89	R\$ 82.710,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.710,85	0,00%
08.003	DIVERSOS							R\$ 48.316,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.316,21	0,00%
08.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	467,29		-	-	R\$ 24,05	R\$ 11.238,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.238,32	0,00%
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00		-	-	R\$ 380,66	R\$ 1.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,64	0,00%
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. at. 05/2021	m2	1.510,28		-	-	R\$ 18,56	R\$ 28.036,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.036,80	0,00%
08.003.004	Limpeza geral	m2	2.568,07		-	-	R\$ 2,93	R\$ 7.524,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.524,45	0,00%
09	CANTEIRO 4							R\$ 166.550,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.550,30	0,00%
09.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 52.977,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.977,26	0,00%
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m2	1.600,28		-	-	R\$ 2,41	R\$ 3.856,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.856,67	0,00%
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.600,28		-	-	R\$ 1,14	R\$ 1.824,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.824,32	0,00%
09.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	800,14		-	-	R\$ 14,82	R\$ 11.858,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.858,07	0,00%
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.402,52		-	-	R\$ 1,07	R\$ 15.410,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.410,70	0,00%
09.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	800,14		-	-	R\$ 25,03	R\$ 20.027,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.027,50	0,00%
09.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 88.915,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.915,12	0,00%
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.523,60		-	-	R\$ 41,29	R\$ 62.909,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.909,44	0,00%
09.002.002	Lona plástica preta	m2	456,24		-	-	R\$ 7,05	R\$ 3.216,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,49	0,00%
09.002.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	456,24		-	-	R\$ 49,95	R\$ 22.789,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.789,19	0,00%
09.003	DIVERSOS							R\$ 24.657,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.657,92	0,00%
09.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	195,58		-	-	R\$ 24,05	R\$ 4.703,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.703,70	0,00%
09.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00		-	-	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%
09.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. at. 05/2021	m2	760,96		-	-	R\$ 18,56	R\$ 14.123,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.123,42	0,00%
09.003.004	Limpeza geral	m2	1.600,28		-	-	R\$ 2,93	R\$ 4.688,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.688,82	0,00%
10	IRRIGAÇÃO							R\$ 418.510,21	R\$ -	R\$ 15.921,10	R\$ 15.921,10	R\$ 402.589,11	3,80%
10.001	POÇOS ARTESIANOS							R\$ 79.681,98	R\$ -	R\$ 15.921,10	R\$ 15.921,10	R\$ 63.760,88	19,98%
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	300,00		60,00	60,00	R\$ 127,25	R\$ 38.175,00	R\$ -	R\$ 7.635,00	R\$ 7.635,00	R\$ 30.540,00	20,00%
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	300,00		60,00	60,00	R\$ 137,01	R\$ 41.103,00	R\$ -	R\$ 8.220,60	R\$ 8.220,60	R\$ 32.882,40	20,00%
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	3,00		1,00	1,00	R\$ 65,50	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ 65,50	R\$ 65,50	R\$ 131,00	33,33%
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00		-	-	R\$ 69,16	R\$ 207,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,48	0,00%
10.002	CASA DE BOMBAS							R\$ 8.143,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.143,73	0,00%
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev 01	un	3,00		-	-	R\$ 523,57	R\$ 1.570,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,71	0,00%
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado revestido 12mm (05 usos)	m3	2,46		-	-	R\$ 2.671,96	R\$ 6.573,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.573,02	0,00%

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:27:35 -03'00'

Assinado de forma digital por José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo



MODICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM	2	CONTRATO:166/2024					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)							
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
10.003	REDE DE IRRIGAÇÃO							R\$ 330.684,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.684,50	0,00%	
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00			-	R\$ 6.939,83	R\$ 20.819,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.819,49	0,00%	
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49			-	R\$ 16,44	R\$ 52.418,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.418,78	0,00%	
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC e/borboleta, d = 1"	un	6,00			-	R\$ 53,68	R\$ 322,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,08	0,00%	
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	1.615,00			-	R\$ 21,71	R\$ 35.061,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.061,65	0,00%	
10.003.005	Adaptador pead d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00			-	R\$ 18,73	R\$ 30.248,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.248,95	0,00%	
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00			-	R\$ 18,62	R\$ 30.071,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.071,30	0,00%	
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00			-	R\$ 100,15	R\$ 161.742,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.742,25	0,00%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 857.132,45	R\$ -	R\$ 431.341,68	R\$ 431.341,68	R\$ 425.890,77	50,32%	
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	6,00			-	R\$ 545,34	R\$ 3.272,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,04	0,00%	
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/50°	m	200,00			-	R\$ 17,04	R\$ 3.408,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.408,00	0,00%	
11.003	Caixa p/ moldura em concreto e/ou para aterramento (20x20x15)cm, padrão Engenharia	un	6,00			-	R\$ 20,90	R\$ 125,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	0,00%	
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	70,00			-	R\$ 148,57	R\$ 10.399,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.399,90	0,00%	
11.005	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00			-	R\$ 64,30	R\$ 643,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,00	0,00%	
11.006	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00			-	R\$ 116,29	R\$ 116,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,29	0,00%	
11.007	Armação secundária, com 3 estrêbos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af. 07/2020	un	3,00			-	R\$ 145,00	R\$ 435,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,00	0,00%	
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00			-	R\$ 457,80	R\$ 2.746,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.746,80	0,00%	
11.009	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11,00			-	R\$ 66,87	R\$ 735,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,57	0,00%	
11.010	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00			-	R\$ 24,77	R\$ 49,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,54	0,00%	
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00			-	R\$ 91,58	R\$ 549,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,48	0,00%	
11.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	2,00			-	R\$ 21,06	R\$ 42,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,12	0,00%	
11.013	Contator tripolar nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	6,00			-	R\$ 363,18	R\$ 2.179,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,08	0,00%	
11.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 08/2020	un	6,00			-	R\$ 38,14	R\$ 228,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,84	0,00%	
11.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	6,00			-	R\$ 9,20	R\$ 55,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,20	0,00%	
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâm. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	64,00		23,00	23,00	R\$ 183,09	R\$ 11.717,76	R\$ -	R\$ 4.211,07	R\$ 4.211,07	R\$ 7.506,69	35,94%	
11.017	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	330,00		330,00	330,00	R\$ 17,39	R\$ 5.738,70	R\$ -	R\$ 5.738,70	R\$ 5.738,70	R\$ -	100,00%	
11.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.083,00		-	-	R\$ 23,29	R\$ 25.223,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.223,07	0,00%	
11.019	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	322,00		-	-	R\$ 14,47	R\$ 4.659,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.659,34	0,00%	
11.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	362,00		-	-	R\$ 4,95	R\$ 1.791,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791,90	0,00%	
11.021	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	121,00		121,00	121,00	R\$ 3,71	R\$ 448,91	R\$ -	R\$ 448,91	R\$ 448,91	R\$ -	100,00%	
11.022	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	126,00		-	-	R\$ 2,29	R\$ 288,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,54	0,00%	
11.023	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sandonado embutido Ø 3/4"	un	64,00		-	-	R\$ 317,29	R\$ 20.306,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.306,56	0,00%	
11.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C	m	2.480,00		-	-	R\$ 9,56	R\$ 23.708,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.708,80	0,00%	
11.025	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branco Ref.: RFLMED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	18,00		-	-	R\$ 1.972,46	R\$ 35.504,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.504,28	0,00%	
11.026	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	30,00		-	-	R\$ 129,17	R\$ 3.875,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.875,10	0,00%	
11.027	Poste aço galv. côncavo ornamental, modelo ref. PORTOPINO, h. total=12m, base flangeada, o/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, o/suporte p/2 luminárias, exceto luminárias e lâmpadas, Comipost ou similar	un	57,00		40,00	40,00	R\$ 8.215,99	R\$ 468.311,43	R\$ -	R\$ 328.639,60	R\$ 328.639,60	R\$ 139.671,83	70,18%	
11.028	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.600 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-light ou similar	un	114,00		60,00	60,00	R\$ 1.538,39	R\$ 1.753.76,46	R\$ -	R\$ 92.303,40	R\$ 92.303,40	R\$ 83.073,06	52,63%	
11.029	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	1.200,00		-	-	R\$ 11,07	R\$ 13.284,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.284,00	0,00%	

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:27:47 -03'00'

Assinado de forma digital por
José Carlos de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 27044/57522
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA		BM		2		CONTRATO:166/2024							
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana		PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
11.030	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	60,00			-	R\$ 18,31	R\$ 1.098,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.098,60	0,00%
11.031	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°c	m	3.600,00			-	R\$ 9,56	R\$ 34.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.416,00	0,00%
11.032	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm	un	14,00			-	R\$ 349,83	R\$ 4.897,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.897,62	0,00%
11.033	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00			-	R\$ 23,71	R\$ 1.422,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.422,60	0,00%
11.034	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente SKA	un	3,00			-	R\$ 58,84	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,52	0,00%
12	ARBORIZAÇÃO							R\$ 129.338,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.338,16	0,00%
12.001	Plantaio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m, af. 05/2018	un	1,00			-	R\$ 522,38	R\$ 522,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,38	0,00%
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00			-	R\$ 72,49	R\$ 26.676,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.676,32	0,00%
12.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00			-	R\$ 26,78	R\$ 9.185,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.185,54	0,00%
12.004	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00			-	R\$ 24,31	R\$ 2.139,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.139,28	0,00%
12.005	Planta - Moreira (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00			-	R\$ 55,20	R\$ 19.651,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.651,20	0,00%
12.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00			-	R\$ 749,70	R\$ 37.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.485,00	0,00%
12.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00			-	R\$ 103,56	R\$ 4.142,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.142,40	0,00%
12.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00			-	R\$ 98,83	R\$ 9.092,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.092,36	0,00%
12.009	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00			-	R\$ 107,27	R\$ 5.578,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.578,04	0,00%
12.010	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00			-	R\$ 101,09	R\$ 4.447,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.447,96	0,00%
12.011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00			-	R\$ 14,10	R\$ 42,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,30	0,00%
12.012	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	63,00			-	R\$ 23,08	R\$ 1.454,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454,04	0,00%
12.013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00			-	R\$ 42,21	R\$ 126,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,63	0,00%
12.014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00			-	R\$ 94,92	R\$ 2.562,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.562,84	0,00%
12.015	Planta - Pata de vaca (bambusa forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00			-	R\$ 230,81	R\$ 6.231,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.231,87	0,00%
13	DIVERSOS							R\$ 3.421,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.421,36	0,00%
13.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00			-	R\$ 868,73	R\$ 868,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,73	0,00%
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			-	R\$ 2.552,63	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552,63	0,00%


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Garcez de Oliveira Junior
 Eng. Civil CREA - 2704457522
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
 SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2025.06.18 13:27:59 -03'00'



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO:166/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

BM

2

PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana


Valor (R\$)

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 156.054,00	R\$ 3.121,08	R\$ 31.741,38	R\$ 34.862,46	R\$ 121.191,54	22,34%	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	600,00	12,00	122,04	134,04	R\$ 146,83	R\$ 88.098,00	R\$ 1.761,96	R\$ 17.919,13	R\$ 19.681,09	R\$ 68.416,91	22,34%
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	24,00	244,08	268,08	R\$ 56,63	R\$ 67.956,00	R\$ 1.359,12	R\$ 13.822,25	R\$ 15.181,37	R\$ 52.774,63	22,34%
TOTAL DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO							R\$ 3.688.000,00	R\$ 75.008,37	R\$ 769.338,21	R\$ 844.346,58	R\$ 2.843.653,42	22,89%	



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:


José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:28:11 -03'00'

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
BM 02

CONTRATO Nº 166/2024



SERVIÇOS		UNIDADE	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	Prazo de execução da obra
04	ROTATORIA 2			
04.002	PAVIMENTAÇÃO			
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	158,30	Perímetro executado = 158,30 m
06	CANTEIRO 1			
06.002	PAVIMENTAÇÃO			
06.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	267,96	Perímetro executado = 267,96 m
07	CANTEIRO 2			
07.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3025,70	Área medida in loco
07.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	3025,70	Área medida in loco
07.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1512,85	3025,70m² x 0,5m
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	27231,30	1512,85m³ x 1,5t/m³ x 12km
07.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1512,85	3782,13m² x 0,5m
07.002	PAVIMENTAÇÃO			
07.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	930,00	Perímetro executado = 930,00 m
07.002.002	Lona plástica preta	m2	499,01	Comprimento de 499,01 metros x largura de 1,00 m = 499,01 m128
07.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	499,01	Comprimento de 499,01 metros x largura de 1,00 m = 499,01 m²
08	CANTEIRO 3			
08.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
08.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1284,04	Área medida in loco
08.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1284,04	Área medida in loco
08.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	642,02	1284,04 m² x 0,5m
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11556,36	642,02m³ x 1,5t/m³ x 12km = 11.556,36
08.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	642,02	1284,04 m² x 0,5m
08.002	PAVIMENTAÇÃO			
08.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	300,00	Perímetro executado = 300 m
10	IRRIGAÇÃO			
10.001	POÇOS ARTESIANOS			
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	60,00	PERFURAÇÃO DE 1 POÇO ARTESIANO
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	60,00	PERFURAÇÃO DE 1 POÇO ARTESIANO
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	1,00	PERFURAÇÃO DE 1 POÇO ARTESIANO
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	23,00	Medidas e Unidades de acordo com o projeto elétrico
11.017	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	330,00	
11.021	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	121,00	
11.027	Poste aço galv. cônico ornamental, modelo ref. PORTOFINO, h total=12m, base flangeada, c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminárias, exceto luminárias e lâmpadas, Conipost ou similar	un	40,00	
11.028	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP68, IRC 70, FP>0,95, 180lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	60,00	
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,04	Administração local corresponde a aproximadamente 20,34% do valor total
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	244,08	

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por
MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:25:47 -03'00'

Jose Garcez de Oliveira Junior
José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL

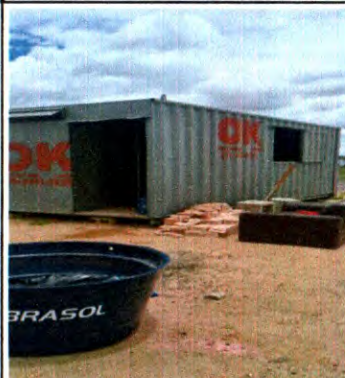

CONTAINER ALMOXARIFADO COM BANHEIRO



CONTAINER ALMOXARIFADO COM BANHEIRO



CONTAINER ALMOXARIFADO COM BANHEIRO



CONTAINER ALMOXARIFADO COM BANHEIRO



MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO



MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO



MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO



MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO



MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO



MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

Jose Garcez de Oliveira Junior
José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:28:38 -03'00'



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA MEIO-FIO PRÉ MOLDADO



ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA MEIO-FIO PRÉ MOLDADO



ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA MEIO-FIO PRÉ MOLDADO



ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA MEIO-FIO PRÉ MOLDADO



ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA MEIO-FIO PRÉ MOLDADO



PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E CIMENTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO




PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E CIMENTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO



PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E CIMENTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO



PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E CIMENTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO

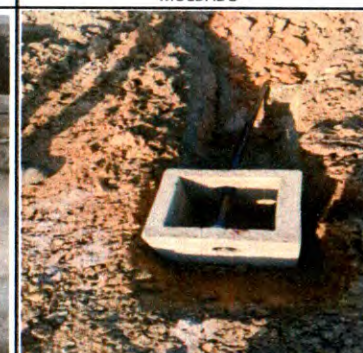

INSTALAÇÕES ELÉTRICA: CAIXA DE PASSAGEM E ELETRODUTO RÍGIDO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

Assinatura digital de José Garcez de Oliveira Junior
José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO

DATA:

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:28:48 -03'00'

Assinatura digital de Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



INSTALAÇÕES ELÉTRICA: CAIXA DE PASSAGEM E ELETRODUTO RÍGIDO



INSTALAÇÕES ELÉTRICA: CAIXA DE PASSAGEM E ELETRODUTO RÍGIDO



INSTALAÇÕES ELÉTRICA: CAIXA DE PASSAGEM E ELETRODUTO RÍGIDO



INSTALAÇÕES ELÉTRICA: CAIXA DE PASSAGEM E ELETRODUTO RÍGIDO



INSTALAÇÃO ELÉTRICA: LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA




INSTALAÇÃO ELÉTRICA: LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA




CICLOVIA



CICLOVIA

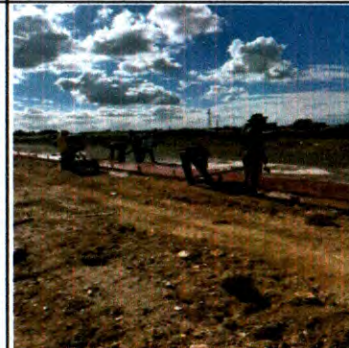

CICLOVIA

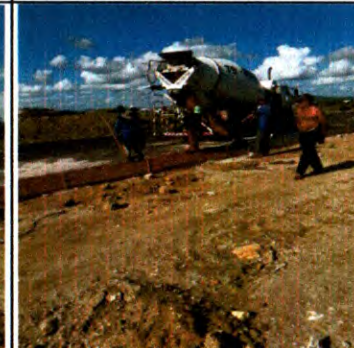

CICLOVIA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

Jose Garcez de Oliveira Junior
José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:28:59 -03'00'



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 19/11/2024 a 31/05/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JÁ COM AS LUMINÁRIAS



POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JÁ COM AS LUMINÁRIAS



POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JÁ COM AS LUMINÁRIAS



POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JÁ COM AS LUMINÁRIAS



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

Jose Gorcez de Oliveira Junior
José Gorcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

MILTON SALES
SANTANA:81309147191

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.06.18 13:29:08 -03'00'

Rozia Milene S. Rodrigues Araújo
Rozia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
