

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS PEDRAS
Bancos: ORSE - 11/2025 - Sergipe
B.D.I.: 23,54%
Encargos: Não Desonerado:

PERÍODO: 20/04/2026 a 25/05/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS PEDRAS				476.261,81
01.01	REFORMA QUADRA DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS PEDRAS				476.261,81
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				47.978,40
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				47.978,40
01.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00	158,22	37.972,80
01.01.003	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	83,38	10.005,60
01.02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.02.001	PLACA DE OBRA				4.669,30
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	10,00	466,93	4.669,30
01.02.003	CANTEIRO DE OBRAS				36.269,97
01.02.003.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10,00	310,88	3.108,80
01.02.003.002	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm - ver 03_10/2022	und	1,00	730,11	730,11
01.02.003.003	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	153,76	210,92	32.431,06
01.02.003	COBERTURA				29.649,60
01.02.003.001	Recuperação de estrutura metálica de cobertura, com substituição de peças metálicas, solda e pintura em pilares, vigas e terças - obra reforma da quadra SEDUC	und	1,00	29.649,60	29.649,60
01.02.004	ARQUIBANCADA				16.346,98
01.02.004.001	Demolição de reboco	m²	43,41	11,43	496,18
01.02.004.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	43,41	8,33	361,61
01.02.004.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:5 (cimento / areia) com rebotec, espessura 2,0cm	m²	43,41	40,89	1.775,03
01.02.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - ver 03	m²	239,80	57,19	13.714,16

QUANTIDADE			VALOR		
ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
			70.351,17	54.268,94	124.620,11
			70.351,17	54.268,94	124.620,11
			R\$ 2.416,00	R\$ 4.832,00	R\$ 7.248,00
			R\$ 2.416,00	R\$ 4.832,00	R\$ 7.248,00
10,00	20,00	30,00	1.582,20	3.164,40	4.746,60
10,00	20,00	30,00	833,80	1.667,60	2.501,40
			R\$ 2.801,58	R\$ 0,00	R\$ 2.801,58
6,00		6,00	2.801,58	-	2.801,58
			R\$ 8.170,88	R\$ 0,00	R\$ 8.170,88
10,00		10,00	3.108,80	-	3.108,80
			-	-	-
24,00		24,00	5.062,08	-	5.062,08
			R\$ 0,00	R\$ 29.649,60	R\$ 29.649,60
	1,00	1,00	-	29.649,60	29.649,60
			R\$ 2.632,82	R\$ 0,00	R\$ 2.632,82
43,41		43,41	496,18	-	496,18
43,41		43,41	361,61	-	361,61
43,41		43,41	1.775,03	-	1.775,03
			-	-	-

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 27210318/99
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PERÍODO: 20/04/2026 a 25/05/2026

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

OBJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA
QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ
THOMAZ- POV. RIO DAS PEDRAS

CONTRATO: 048/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ORSE - 11/2025 - Sergipe
B.D.I. 23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

01.01.002

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

20

H

01.01.003

Mestre de obras com encargos complementares

20

H

01.02.003.001

Recuperação de estrutura metálica de cobertura, com substituição de peças metálicas, solda e pintura em pilares, vigas e terças - obra reforma da quadra SEDUC

1 und

01.02.006.002

Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento; exclusive argamassa de regularização, aplicado

COMPRIMENTO (m)	45,36
LARGURA (m)	1,00
TOTAL (m²)	45,36

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031099
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Andre Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.02.016.003	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca , ref. HBMLD-DC-150-100-50-3C, da Gliight ou similar
---------------	--

20	und
----	-----

01.02.016.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação af. 03/2023
---------------	--

120	m
-----	---

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504


Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
 Arq Urb CAU/SE A195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana- SE	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ, POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO
CONTRATO: 048/2026	PERÍODO DA MEDIÇÃO 20/04/2026 A 25/05/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ: 23.894.941/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-02	ORSE - 11/2025 - Sergipe	B.D.I. 23,54% NÃO DESONERADO	


ANDAMENTO GERAL DA OBRA

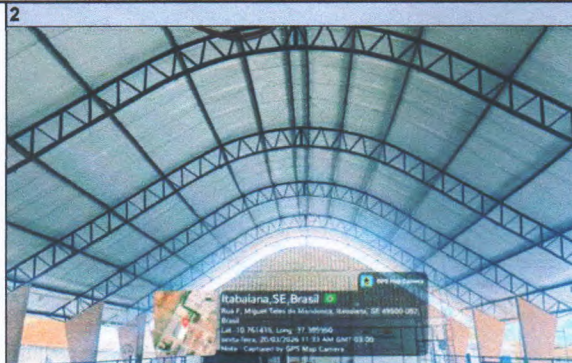

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

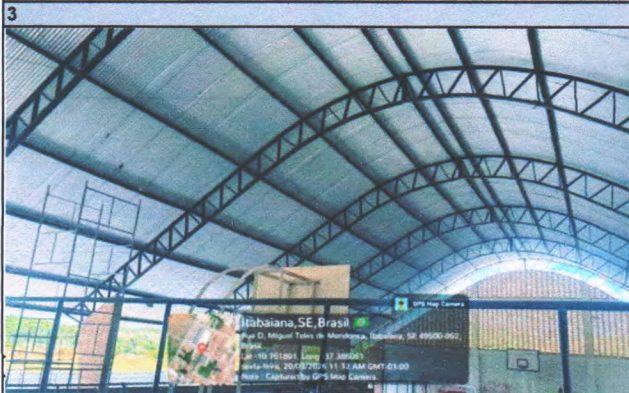

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

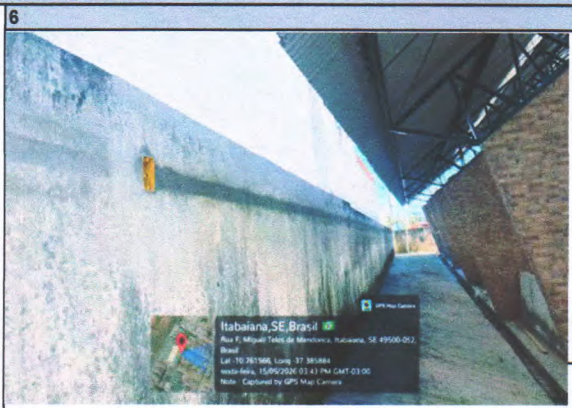

Andre Agassi Reis Lapa
Andre Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Mikaely da Silva Oliveira
 Arq Urb CAU/SE A195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo de N. Pereira Junior
José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 27210316/99
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:045 31407504
 Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531 407504
