

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 027/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA	
			B.M.Nº. 02/2026					ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
			PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026					DATA: 06/04/2026					
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							42.203,73	42.203,73	0,00	42.203,73	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	355,94	4.271,28	4.271,28	0,00	4.271,28	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.207,24	1.207,24	0,00	1.207,24	27,47	33.162,88	33.162,88	0,00	33.162,88	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.043,67	1.043,67	0,00	1.043,67	4,57	4.769,57	4.769,57	0,00	4.769,57	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							16.473,00	0,00	3.604,68	3.604,68	12.868,32	21,88
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_ 08/2023	m3	170,00	0,00	37,20	37,20	96,90	16.473,00	0,00	3.604,68	3.604,68	12.868,32	21,88
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							43.496,21	43.496,21	0,00	43.496,21	0,00	100,00
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	116,79	116,79	0,00	116,79	266,29	31.100,41	31.100,41	0,00	31.100,41	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1.216,24	1.216,24	0,00	1.216,24	10,16	12.357,00	12.357,00	0,00	12.357,00	0,00	100,00
03.017	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00	2,00	0,00	2,00	19,40	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							269.860,16	11.095,00	79.478,67	90.573,67	179.286,50	33,56
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_ 01/2024	m	1.216,24	250,00	966,24	1.216,24	44,38	53.976,73	11.095,00	42.881,73	53.976,73	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_ 08/2022	m3	156,51	0,00	26,04	26,04	774,92	121.281,26	0,00	20.177,45	20.177,45	101.103,81	16,64
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	848,45	0,00	147,26	147,26	111,50	94.602,18	0,00	16.419,49	16.419,49	78.182,69	17,36
05	ACESSIBILIDADE							1.759,76	0,00	832,96	832,96	926,80	47,33
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	0,00	2,00	2,00	416,48	1.665,92	0,00	832,96	832,96	832,96	0,00
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	11,73	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
08	PINTURA							11.072,12	0,00	0,00	0,00	11.072,12	0,00
08.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m	1.556,48	0,00	0,00	0,00	4,74	7.377,72	0,00	0,00	0,00	7.377,72	0,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	80,00	0,00	0,00	0,00	46,18	3.694,40	0,00	0,00	0,00	3.694,40	0,00
13	DIVERSOS							13.158,31	2.172,90	2.463,73	4.636,63	8.521,68	35,24
13.001	Limpeza geral	m2	3.521,34	0,00	0,00	0,00	2,42	8.521,64	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	183,92	90,00	93,92	183,92	10,61	1.988,22	972,90	1.015,28	1.988,18	0,04	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.207,04	1.000,00	1.207,04	2.207,04	1,20	2.648,45	1.200,00	1.448,45	2.648,45	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							9.903,92	3.301,31	3.301,31	6.602,61	3.301,31	66,67
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	31,50	10,50	10,50	21,00	154,93	4.880,30	1.626,77	1.626,77	3.253,53	1.626,77	66,67
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	63,00	21,00	21,00	42,00	79,74	5.023,62	1.674,54	1.674,54	3.349,08	1.674,54	66,67
TOTAL GERAL								407.927,20	102.269,15	89.681,35	191.950,50	215.976,70	47,06
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					

Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 13/04/2026 12:32:11-0300
Verifique em <https://validar.itg.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 13/04/2026 11:56:38-0300
Verifique em <https://validar.itg.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 13/04/2026 12:04:03-0300
Verifique em <https://validar.itg.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BM 02 06/04/2026
		CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
027/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023 - 37,20 M3	
4	PAVIMENTAÇÃO	
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024 - 966,24 M	
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022 - 26,04 M3	
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia - 147,26 M2	
05	ACESSIBILIDADE	
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - 2,00 UND	
13	DIVERSOS	
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria - 93,92 M3	
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 1.207,04 TKM	
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 10,50 h	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 21,00 h	



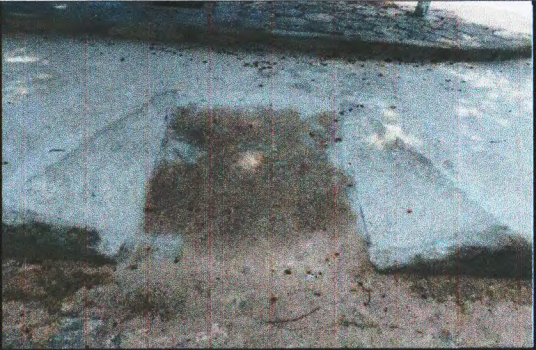
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 13/04/2026 12:33:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 13/04/2026 11:56:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 13/04/2026 12:04:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 027/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 06/04/2026
 ATERRO	 ASSENTAMENTO DE GUIA	 EXECUÇÃO DE PASSEIO
 PISO LAJOTA EXAGONAL	 RAMPA	 CARGA

ELABORADO POR: 	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:
------------------------	-----------------------	----------------------


 Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 13/04/2026 12:33:59-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
 SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 13/04/2026 11:56:38-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
 JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 13/04/2026 12:04:03-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>
