



BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
							002		VALORES		SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 2.173,32			
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES										2.173,32			
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 362,22	2.173,32	0,00	2.173,32	R\$ 2.173,32	0,00	0,00	
2	CASA DOS VIGIAS										R\$ 40.289,12			
02.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										6.178,21			
02.01.001	Demolição de reboco	m2	74,44	0,00	46,12	46,12	R\$ 7,33	0,00	338,06	338,06	R\$ 545,65	28,32	207,59	
02.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	34,35	0,00	20,35	20,35	R\$ 16,98	0,00	345,54	345,54	R\$ 583,26	14,00	237,72	
02.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	34,83	0,00	1,84	1,84	R\$ 11,46	0,00	21,09	21,09	R\$ 399,15	32,99	378,06	
02.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	15,21	0,00	13,81	13,81	R\$ 21,55	0,00	297,61	297,61	R\$ 327,78	1,40	30,17	
02.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,06	0,00	9,06	9,06	R\$ 13,06	0,00	118,32	118,32	R\$ 118,32	0,00	0,00	
02.01.006	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 11,59	0,00	11,59	11,59	R\$ 11,59	0,00	0,00	
02.01.007	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 16,83	0,00	50,49	50,49	R\$ 50,49	0,00	0,00	
02.01.008	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	60,00	0,00	55,60	55,60	R\$ 55,36	0,00	3.078,02	3.078,02	R\$ 3.321,60	4,40	243,58	
02.01.009	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 341,12	32,00	341,12	
02.01.010	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 12,69	0,00	38,07	38,07	R\$ 380,70	27,00	342,63	
02.01.011	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 10,41	0,00	10,41	10,41	R\$ 10,41	0,00	0,00	
02.01.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 14,69	0,00	88,14	88,14	R\$ 88,14	0,00	0,00	
02.02	COBERTURA										5.737,66			
02.02.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	60,00	0,00	33,46	33,46	R\$ 6,48	0,00	216,82	216,82	388,80	26,54	171,98	
02.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 87,75	0,00	263,25	263,25	2632,50	27,00	2.369,25	
02.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	1791,68	32,00	1.791,68	
02.02.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	9,50	0,00	7,11	7,11	R\$ 18,64	0,00	132,53	132,53	177,08	2,39	44,55	
02.02.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	60,00	0,00	60,00	60,00	R\$ 12,46	0,00	747,60	747,60	747,60	0,00	0,00	
02.03	REVESTIMENTO										3.589,90			
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	74,44	0,00	46,62	46,62	5,93	0,00	276,46	276,46	441,43	27,82	164,97	
02.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	46,32	0,00	35,55	35,55	25,85	0,00	918,97	918,97	1.197,37	10,77	278,40	
02.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	28,12	0,00	28,12	28,12	28,57	0,00	803,39	803,39	803,39	0,00	0,00	
02.03.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	34,35	0,00	31,67	31,67	32,83	0,00	1.039,73	1.039,73	1.127,71	2,68	87,98	
02.04	FORRO										782,53			
02.04.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	31,49	0,00	31,49	31,49	24,85	0,00	782,53	782,53	782,53	0,00	0,00	
02.05	PILARES										1.457,04			
02.05.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	2,19	2,19	7,33	0,00	16,05	16,05	48,38	4,41	32,33	

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

At: BEIRIZ PINTO
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Outra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
									002	Valor de Contrato: R\$ 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$			
02.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	2,19	2,19	5,93	0,00	12,99	12,99	39,14	4,41	26,15
02.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	2,19	0,00	28,57	0,00	62,57	62,57	188,56	6,60	125,99
02.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	35,20	0,00	2,19	0,00	33,55	0,00	73,47	73,47	1.180,96	35,20	1.107,49
02.06	PAVIMENTAÇÃO										2.109,31		
02.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	34,83	0,00	1,84	0,00	23,19	0,00	42,67	42,67	807,71	34,83	765,04
02.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	34,83	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	1.301,60	34,83	1.301,60
02.07	PASSEIO										563,38		
02.07.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	15,21	0,00	13,81	13,81	37,04	0,00	511,52	511,52	563,38	1,40	51,86
02.08	ESQUADRIAS												
02.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										8.220,32		
02.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	2,00	2,00	1.405,58	0,00	2.811,16	2.811,16	2.811,16	0,00	0,00
02.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	2,00	2,00	1.298,95	0,00	2.597,90	2.597,90	2.597,90	0,00	0,00
02.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	1,50	0,00	1,50	1,50	666,88	0,00	1.000,32	1.000,32	1.000,32	0,00	0,00
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	2,00	0,00	2,00	2,00	160,82	0,00	321,64	321,64	321,64	0,00	0,00
02.08.001.006	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	1,50	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	271,95	1,50	271,95
02.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										658,07		
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3,00	0,00	3,00	3,00	101,70	0,00	305,10	305,10	305,10	0,00	0,00
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	1,00	1,00	134,41	0,00	134,41	134,41	134,41	0,00	0,00
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	0,00	2,00	2,00	77,36	0,00	154,72	154,72	154,72	0,00	0,00
02.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	0,00	4,00	4,00	15,96	0,00	63,84	63,84	63,84	0,00	0,00
02.10	METAIS E LOUÇAS										1.431,46		
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	824,10	2,00	824,10
02.10.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11
02.10.004	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25	1,00	42,25

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391/991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663/99SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA	
							067/2023		19.06.2023 a 18.07.2023		MEDIÇÃO Nº		19.07.2023	
											002		Valor do Contrato: R\$: 998.260,28	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
02.11	PINTURAS													
02.11.001	PINTURA INTERNA											5.771,24		
02.11.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	132,59	0,00	131,77	131,77	7,73	0,00	1.018,58	1.018,58	1.024,92	0,82	6,34	
02.11.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	132,59	0,00	131,77	131,77	17,68	0,00	2.329,69	2.329,69	2.344,19	0,82	14,50	
02.11.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	164,08	0,00	131,77	131,77	14,64	0,00	1.929,11	1.929,11	2.402,13	32,31	473,02	
02.11.002	PINTURA EXTERNA											2.878,59		
02.11.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	85,80	0,00	85,80	85,80	33,55	0,00	2.878,59	2.878,59	2.878,59	0,00	0,00	
02.11.004	ESQUADRIAS											791,61		
02.11.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	22,65	0,00	22,65	0,00	16,62	0,00	376,44	376,44	376,44	22,65	0,00	
02.11.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	22,65	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	415,17	22,65	415,17	
02.12	DIVERSOS											139,80		
02.12.001	Limpeza geral	m2	60,00	0,00	60,00	60,00	2,33	0,00	139,80	139,80	139,80	0,00	0,00	
3	ADMINISTRAÇÃO											R\$ 117.590,98		
03.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											22.713,34		
03.01.001	Demolição de reboco	m2	194,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.427,88	194,80	1.427,88	
03.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	46,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 789,57	46,50	789,57	
03.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	14,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 167,32	14,60	167,32	
03.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	63,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.358,94	63,06	1.358,94	
03.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	88,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 428,75	88,04	428,75	
03.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	42,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 561,19	42,97	561,19	
03.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	9,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 140,80	9,30	140,80	
03.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,77	3,00	34,77	
03.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,23	3,00	31,23	
03.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	295,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.332,31	295,02	16.332,31	
03.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	44,47	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 474,05	44,47	474,05	
03.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	29,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 374,36	29,50	374,36	
03.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,47	9,00	151,47	
03.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 440,70	30,00	440,70	
03.02	ELEVAÇÃO											396,19		
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	59,17	1,60	59,17	
03.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	9,49	1,60	9,49	
03.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	45,71	1,60	45,71	

Thaísa Lima Santos
Eng.º Civil - CREA 271739199
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil - CREA 271610492
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng.º Breno de Assis Pinto
CAB/SE A/1823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$		VALORES		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	002	19.07.2023	Valor do Contrato: R\$: 993.260,28	
03.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	6,00	281,82
03.03	COBERTURA											9.820,36
03.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	79,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	79,20	513,22
03.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	29,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	29,50	2.588,63
03.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	44,47	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	44,47	2.489,88
03.03.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	29,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	29,65	552,68
03.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	295,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	295,02	3.675,95
03.04	REVESTIMENTO											9.571,33
03.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	198,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	198,00	1.174,14
03.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	128,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	128,00	3.308,80
03.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	70,00	1.999,90
03.04.004	Aplicamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	46,50	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	46,50	127,88
03.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	90,18	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	90,18	2.960,61
03.05	FORRO											3.955,62
03.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	159,18	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	159,18	3.955,62
03.06	PILARES											1.457,04
03.06.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	6,60	48,38
03.06.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	6,60	39,14
03.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	6,60	188,56
03.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	35,20	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	35,20	1.180,96
03.07	PAVIMENTAÇÃO											4.608,22
03.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	199,28	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	199,28	3.716,57
03.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,80	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	14,80	553,08
03.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	14,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	14,60	338,57
03.08	PASSEIO											2.335,74
03.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	63,06	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	63,06	2.335,74
03.09	ESQUADRIAS											17.143,77
03.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA											17.143,77
03.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	5,00	7.027,90
03.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	4,00	5.195,80

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CREA/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES

R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Obras: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									002		Valor do Contrato: R\$: 993.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL								
03.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	1.217,35	1,00	1.217,35	
03.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	609,64	4,00	609,64	
03.09.001.005	Porta em madeira de lei mulracatiara com almofadas	M2	4,32	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	1.621,08	4,32	1.621,08	
03.09.001.006	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	1.083,32	4,00	1.083,32	
03.09.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	12,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	388,68	12,00	388,68	
03.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										10.403,72			
03.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	27,49	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	7.690,88	27,49	7.690,88	
03.09.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	5,20	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	1.876,84	5,20	1.876,84	
03.09.002.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,74	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	836,00	3,74	836,00	
03.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.862,49			
03.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	9,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	915,30	9,00	915,30	
03.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	464,16	6,00	464,16	
03.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	403,23	3,00	403,23	
03.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	5,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	79,80	5,00	79,80	
03.11	METAIS E LOUÇAS										3.963,84			
03.11.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	762,84	3,00	762,84	
03.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	1.236,15	3,00	1.236,15	
03.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	3,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	875,16	3,00	875,16	
03.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	57,33	3,00	57,33	
03.11.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 01/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	126,75	3,00	126,75	
03.11.006	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	265,47	3,00	265,47	
03.11.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	3,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	317,49	3,00	317,49	
03.11.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	3,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	322,65	3,00	322,65	
03.12	PINTURAS													
03.12.001	PINTURA INTERNA										16.039,11			
03.12.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	342,29	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	2.645,90	342,29	2.645,90	
03.12.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	342,29	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	6.051,69	342,29	6.051,69	

Thaísa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 271739199-4
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 271610492-8
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 CREA 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE								
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO		PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023		19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									062	VALORES		Valor do Contrato: R\$: 993.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNT.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	501,47	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	7.341,52	501,47	7.341,52		
03.12.002	PINTURA EXTERNA										8.793,46				
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	262,10	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	8.793,46	262,10	8.793,46		
03.12.003	ESQUADRIAS										3.839,38				
03.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R 1	m2	27,83	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	510,12	27,83	510,12		
03.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	49,65	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	825,18	49,65	825,18		
03.12.003.002.001	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demãos	m2	77,96	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	1.291,80	77,96	1.291,80		
03.12.003.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	77,96	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	1.212,28	77,96	1.212,28		
03.13	DIVERSOS										687,37				
03.13.001	Limpeza geral	m2	295,01	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	687,37	295,01	687,37		
4	LABORATÓRIO										R\$ 115.231,01				
04.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										22.254,02				
04.01.001	Demolição de reboco	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	R\$ 7,33	1.272,71	0,00	1.272,71	R\$ 1.272,71	0,00	0,00		
04.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	R\$ 16,98	402,43	0,00	402,43	R\$ 402,43	0,00	0,00		
04.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	R\$ 11,46	73,11	0,00	73,11	R\$ 73,11	0,00	0,00		
04.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	R\$ 21,55	1.333,73	0,00	1.333,73	R\$ 1.333,73	0,00	0,00		
04.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	82,50	82,50	0,00	82,50	R\$ 4,87	401,78	0,00	401,78	R\$ 401,78	0,00	0,00		
04.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	63,91	63,91	0,00	63,91	R\$ 13,06	834,66	0,00	834,66	R\$ 834,66	0,00	0,00		
04.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,24	3,24	0,00	3,24	R\$ 15,14	49,05	0,00	49,05	R\$ 49,05	0,00	0,00		
04.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 11,59	23,18	0,00	23,18	R\$ 23,18	0,00	0,00		
04.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,41	31,23	0,00	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00		
04.01.010	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 16,83	16,83	0,00	16,83	R\$ 16,83	0,00	0,00		
04.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 55,36	16.709,31	0,00	16.709,31	R\$ 16.709,31	0,00	0,00		
04.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 10,66	428,96	0,00	428,96	R\$ 428,96	0,00	0,00		
04.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 12,69	383,24	0,00	383,24	R\$ 383,24	0,00	0,00		
04.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 14,69	293,80	0,00	293,80	R\$ 293,80	0,00	0,00		
04.02	ELEVAÇÃO										316,95				
04.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 36,98	47,33	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00		
04.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 5,93	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00		
04.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 28,57	36,57	0,00	36,57	36,57	0,00	0,00		
04.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,80	4,80	0,00	4,80	R\$ 46,97	225,46	0,00	225,46	225,46	0,00	0,00		

Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 271610492

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
Coordenadora de Núcleo
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							002		Valor do Contrato: R\$ 998.260,28					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNT.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)			
04.03	COBERTURA										9.657,52			
04.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	76,16	76,16	0,00	76,16	R\$ 6,48	493,52	0,00	493,52	493,52	0,00	0,00	
04.03.002	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af 07/2019	m	26,83	26,83	0,00	26,83	R\$ 18,64	500,11	0,00	500,11	500,11	0,00	0,00	
04.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 87,75	2.650,05	0,00	2.650,05	2.650,05	0,00	0,00	
04.03.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 55,99	2.253,04	0,00	2.253,04	2.253,04	0,00	0,00	
04.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 12,46	3.760,80	0,00	3.760,80	3.760,80	0,00	0,00	
04.04	REVESTIMENTO										7.326,32			
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	5,93	1.029,63	0,00	1.029,63	1.029,63	0,00	0,00	
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	108,97	108,97	0,00	108,97	25,85	2.816,87	0,00	2.816,87	2.816,87	0,00	0,00	
04.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	64,66	64,66	0,00	64,66	28,57	1.847,34	0,00	1.847,34	1.847,34	0,00	0,00	
04.04.004	Apicamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	2,75	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00	
04.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusive emboço	m2	47,74	47,74	0,00	47,74	32,83	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	0,00	
04.05	FORRO										4.355,46			
04.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af 05/2017 ps	m2	175,27	175,27	0,00	175,27	24,85	4.355,46	0,00	4.355,46	4.355,46	0,00	0,00	
04.06	PILARES										1.005,09			
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	5,93	32,62	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00	
04.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	28,57	157,14	0,00	157,14	157,14	0,00	0,00	
04.06.003	Demolição de reboco	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	7,33	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	
04.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,10	23,10	0,00	23,10	33,55	775,01	0,00	775,01	775,01	0,00	0,00	
04.07	PAVIMENTAÇÃO										4.167,66			
04.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	202,75	202,75	0,00	202,75	18,65	3.781,29	0,00	3.781,29	3.781,29	0,00	0,00	
04.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	37,37	238,42	0,00	238,42	238,42	0,00	0,00	
04.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	23,19	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00	0,00	
04.08	PASSEIO										2.292,41			
04.08.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	37,04	2.292,41	0,00	2.292,41	2.292,41	0,00	0,00	
04.09	ESQUADRIAS													
04.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										28.116,27			
04.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.405,58	5.622,32	0,00	5.622,32	5.622,32	0,00	0,00	
04.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	1.298,95	0,00	0,00	
04.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.217,35	4.869,40	0,00	4.869,40	4.869,40	0,00	0,00	



Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104927
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO		BOLETIM DE		DATA			
							06/2023		PERÍODO		19.06.2023 a 18.07.2023		MEDIÇÃO Nº	
							002		VALORES		VALOR DO CONTRATO: R\$ 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
04.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	152,41	304,82	0,00	304,82	304,82	0,00	0,00	
04.09.001.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	49,00	49,00	0,00	49,00	279,77	13.708,73	0,00	13.708,73	13.708,73	0,00	0,00	
04.09.001.006	Porta em madeira de lei mairacatiara com almofadas	M2	4,20	4,20	0,00	4,20	375,25	1.576,05	0,00	1.576,05	1.576,05	0,00	0,00	
04.09.001.007	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	270,83	541,66	0,00	541,66	541,66	0,00	0,00	
04.09.001.008	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	6,00	6,00	0,00	6,00	32,39	194,34	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00	
04.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										9.176,46			
04.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	279,77	9.176,46	0,00	9.176,46	9.176,46	0,00	0,00	
04.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										894,18			
04.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	101,70	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00	0,00	
04.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictrios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	77,36	154,72	0,00	154,72	154,72	0,00	0,00	
04.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	2,00	0,00	2,00	134,41	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	0,00	
04.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,96	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00	
04.11	METAIS E LOUÇAS										1.655,41			
04.11.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	2,00	0,00	2,00	254,28	508,56	0,00	508,56	508,56	0,00	0,00	
04.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	824,10	2,00	824,10	
04.11.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	38,22	2,00	38,22	
04.11.004	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	176,98	2,00	176,98	
04.11.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	107,55	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00	
04.12	PINTURAS													
04.12.001	PINTURA INTERNA										10.764,91			
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	323,43	323,43	0,00	323,43	10,71	3.463,94	0,00	3.463,94	3.463,94	0,00	0,00	
04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	498,70	450,00	0,00	450,00	14,64	6.588,00	0,00	6.588,00	7.300,97	48,70	712,97	
04.12.002	PINTURA EXTERNA										8.516,67			
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	253,85	150,00	60,00	210,00	33,55	5.032,50	2.013,00	7.045,50	8.516,67	43,85	1.471,17	
04.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS										4.028,42			
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	99,95	0,00	99,95	0,00	16,62	0,00	1.661,17	1.661,17	1.661,17	99,95	0,00	

Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDIÇÃO Nº	19.07.2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prof. João Alves dos Santos	
										002	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			SALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	16,57	1.221,21	0,00	1.221,21	1.221,21	73,70	0,00
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	15,55	1.146,04	0,00	1.146,04	1.146,04	73,70	0,00
04.13	DIVERSOS										703,26		
04.13.001	Limpeza geral	m2	301,83	0,00	301,83	301,83	2,33	0,00	703,26	703,26	703,26	0,00	0,00
5	SALAS DE AULAS										R\$ 134.836,86		
05.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										36.109,59		
05.01.001	Demolição de reboco	m2	238,87	0,00	93,43	93,43	R\$ 7,33	0,00	684,84	684,84	R\$ 1.750,92	145,44	1.066,08
05.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	196,50	0,00	196,50	196,50	R\$ 16,98	0,00	3.336,57	3.336,57	R\$ 3.336,57	0,00	0,00
05.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	101,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.177,41	101,04	2.177,41
05.01.004	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento, af 12/2017	m2	225,00	0,00	225,00	225,00	R\$ 1,72	0,00	387,00	387,00	R\$ 387,00	0,00	0,00
05.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,60	0,00	9,60	9,60	R\$ 13,06	0,00	125,38	125,38	R\$ 125,38	0,00	0,00
05.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	484,50	0,00	178,93	178,93	R\$ 55,36	0,00	9.905,56	9.905,56	R\$ 26.821,92	305,57	16.916,36
05.01.007	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 454,86	42,67	454,86
05.01.008	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	48,45	0,00	48,42	48,42	R\$ 12,69	0,00	614,45	614,45	R\$ 614,83	0,03	0,38
05.01.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	0,00	30,00	30,00	R\$ 14,69	0,00	440,70	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00
05.02	ELEVAÇÃO										396,19		
05.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 5,93	0,00	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00
05.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 36,98	0,00	59,17	59,17	59,17	0,00	0,00
05.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 28,57	0,00	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00
05.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 46,97	0,00	281,82	281,82	281,82	0,00	0,00
05.03	COBERTURA										13.699,33		
05.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,45	0,00	48,45	48,45	R\$ 87,75	0,00	4.251,49	4.251,49	4251,49	0,00	0,00
05.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2389,09	42,67	2.389,09
05.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31
05.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	491,57	75,86	491,57
05.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	484,50	0,00	484,50	484,50	R\$ 12,46	0,00	6.036,87	6.036,87	6036,87	0,00	0,00
05.04	REVESTIMENTO										19.799,15		
05.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	238,87	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	1.416,50	238,87	1.416,50
05.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	238,87	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	6.824,52	238,87	6.824,52
05.04.003	Apicoamento total de reboco com pontadeiras/talhadeiras	m2	196,50	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	540,38	196,50	540,38
05.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	335,60	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	11.017,75	335,60	11.017,75
05.05	FORRO										5.699,25		



Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA	
							067/2023		19.06.2023 a 18.07.2023		MEDIÇÃO Nº		19.07.2023	
											002		Valor do Contrato: R\$: 993.260,28	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL								
05.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af 05/2017 ps	m2	225,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	5.591,25	225,00	5.591,25	
05.06	PILARES										975,70			
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	21,35	3,60	21,35	
05.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	102,85	3,60	102,85	
05.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,38	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	851,50	25,38	851,50	
05.07	PASSEIO										3.742,52			
05.07.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	101,04	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	3.742,52	101,04	3.742,52	
05.08	ESQUADRIAS													
05.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										7.027,90			
05.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	7.027,90	5,00	7.027,90	
05.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										3.985,48			
05.08.002.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	34,00	0,00	0,00	0,00	117,22	0,00	0,00	0,00	3.985,48	34,00	3.985,48	
05.09	PINTURAS													
05.09.001	PINTURA EXTERNA										36.994,09			
05.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	8,40	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	119,62	8,40	119,62	
05.09.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1099,09	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	36.874,47	1.099,09	36.874,47	
05.09.002	ESQUADRIAS										349,02			
05.09.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	21,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	349,02	21,00	349,02	
05.09.003	PINTURA DE FORRO										5.037,75			
05.09.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	225,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	5.037,75	225,00	5.037,75	
05.10	DIVERSOS										1.128,89			
05.10.001	Limpeza geral	m2	484,50	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	1.128,89	484,50	1.128,89	
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO										R\$ 133.734,74			
06.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										24.518,67			
06.01.001	Demolição de reboco	m2	87,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 642,84	87,70	642,84	
06.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	286,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.861,71	286,32	4.861,71	
06.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.705,02	148,78	1.705,02	
06.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	70,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.523,59	70,70	1.523,59	
06.01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,39	0,40	12,39	
06.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	28,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 376,91	28,86	376,91	
06.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento, af 12/2017	m2	132,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 227,81	132,45	227,81	
06.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 115,90	10,00	115,90	
06.01.009	Remoção de lavatório	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,05	5,00	52,05	

Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 27173919/91
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399/SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 271610492/CAU/SE A71823-8
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Beiriz Pinto
Engª Civil - CREA 271610492/CAU/SE A71823-8
Coordenadora de Núcleo
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contrato: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDIÇÃO Nº	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									002		Valor do Contrato: R\$: 993.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL								
06.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,551,02	244,78	13,551,02	
06.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 434,93	40,80	434,93	
06.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	24,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 310,65	24,48	310,65	
06.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 336,60	20,00	336,60	
06.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 367,25	25,00	367,25	
06.02	ELEVAÇÃO										396,19			
06.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	59,17	1,60	59,17	
06.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	9,49	1,60	9,49	
06.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	45,71	1,60	45,71	
06.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	281,82	6,00	281,82	
06.03	COBERTURA										9.638,76			
06.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2148,12	24,48	2.148,12	
06.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2284,39	40,80	2.284,39	
06.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	27,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	507,01	27,20	507,01	
06.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	73,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	474,34	73,20	474,34	
06.03.005	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,26	0,00	0,00	0,00	4224,90	244,78	4.224,90	
06.04	REVESTIMENTO										19.245,81			
06.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	87,70	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	520,06	87,70	520,06	
06.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	20,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	300,12	20,50	300,12	
06.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,20	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.919,90	67,20	1.919,90	
06.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	286,32	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	787,38	286,32	787,38	
06.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	478,78	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	15.718,35	478,78	15.718,35	
06.05	FORRO										3.697,18			
06.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	3.697,18	148,78	3.697,18	
06.06	PILARES										1.220,85			
06.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14	
06.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56	
06.06.003	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38	



Thaisa Lima Santos
Eng. Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			VALORES						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	SALDO		
											VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							Contrato: Prefeitura de Itabaiana/SE CONTRATO PERÍODO BOLETIM DE DATA 06/2023 19.06.2023 a 18.07.2023 MEDIÇÃO Nº 19.07.2023 002 Valor do Contrato: R\$: 993.260,26 Obra: Reforma da Escola Técnica Agripino Friteto João Alves dos Santos						
06.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	28,16	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	944,77	28,16	944,77
06.07 PAVIMENTAÇÃO							9.785,96						
06.07.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.450,21	148,78	3.450,21
06.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	5.559,91	34,83	5.559,91
06.07.003	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	41,60	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	775,84	41,60	775,84
06.08 PASSEIO							2.618,73						
06.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	70,70	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	2.618,73	70,70	2.618,73
06.09 ESQUADRIAS							28.624,55						
06.09.001 ESQUADRIAS MADEIRA							28.624,55						
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	5.622,32	4,00	5.622,32
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	3.896,85	3,00	3.896,85
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 1,60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	21,00	0,00	0,00	0,00	852,26	0,00	0,00	0,00	17.897,46	21,00	17.897,46
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	21,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	1.207,92	21,00	1.207,92
06.09.002 ESQUADRIAS METÁLICAS							4.784,07						
06.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	17,10	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	4.784,07	17,10	4.784,07
06.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO							5.250,98						
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	24,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	2.440,80	24,00	2.440,80
06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	1.083,04	14,00	1.083,04
06.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	1.344,10	10,00	1.344,10
06.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	24,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	383,04	24,00	383,04
06.11 METAIS E LOUÇAS							9.409,90						
06.11.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	5,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	2.060,25	5,00	2.060,25
06.11.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	10,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	2.542,80	10,00	2.542,80
06.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Decca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	2.625,48	9,00	2.625,48
06.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	10,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	191,10	10,00	191,10
06.11.005	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	442,45	5,00	442,45

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDIÇÃO Nº	19.07.2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									002		Valor do Contrato: R\$: 993.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
06.11.006	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	9,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	380,25	9,00	380,25	
06.11.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10	
06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	952,47	9,00	952,47	
06.12	PINTURAS													
06.12.001	PINTURA DE FORRO										3.331,18			
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	3.331,18	148,78	3.331,18	
06.12.002	PINTURA EXTERNA										9.222,22			
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	274,88	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.222,22	274,88	9.222,22	
06.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS										1.419,35			
06.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	119,33	6,51	119,33	
06.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	78,22	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.300,02	78,22	1.300,02	
06.13	DIVERSOS										570,34			
06.13.001	Limpeza geral	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	570,34	244,78	570,34	
7	REFEITÓRIO/COZINHA										R\$ 97.374,35			
07.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										24.665,04			
07.01.001	Demolição de reboco	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 491,11	67,00	491,11	
07.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.636,15	155,25	2.636,15	
07.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	23,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 266,56	23,26	266,56	
07.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	178,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.679,15	178,34	3.679,15	
07.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.099,70	51,03	1.099,70	
07.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 172,78	13,23	172,78	
07.01.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,56	14,90	72,56	
07.01.008	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	12,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 186,52	12,32	186,52	
07.01.009	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59	
07.01.010	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41	
07.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.937,79	269,83	14.937,79	
07.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 454,86	42,67	454,86	
07.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 341,36	26,90	341,36	
07.01.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,15	5,00	84,15	
07.01.015	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,35	15,00	220,35	
07.02	ELEVAÇÃO										128,25			
07.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	2,85	0,48	2,85	




Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							06/7203	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO N°	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									002	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	SALDO			
07.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	17,75	0,48	17,75	
07.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	13,71	0,48	13,71	
07.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	93,94	2,00	93,94	
07.03	COBERTURA										9.132,50			
07.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2360,48	26,90	2.360,48	
07.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2389,09	42,67	2.389,09	
07.03.003	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	490,54	75,70	490,54	
07.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31	
07.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3362,08	269,83	3.362,08	
07.04	REVESTIMENTO										14.184,95			
07.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	397,31	67,00	397,31	
07.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.914,19	67,00	1.914,19	
07.04.003	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	426,94	155,25	426,94	
07.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	348,66	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	11.446,51	348,66	11.446,51	
07.05	FORRO										1.006,05			
07.05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev.06 10/2021	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	1.006,05	14,90	1.006,05	
07.06	PAVIMENTAÇÃO										12.208,89			
07.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	4.675,10	201,60	4.675,10	
07.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	7.533,79	201,60	7.533,79	
07.07	PASSEIO										2.009,88			
07.07.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	1.605,40	51,03	1.605,40	
07.07.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	10,92	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	404,48	34,83	404,48	
07.08	ESQUADRIAS													
07.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										11.160,33			
07.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.346,58	0,00	0,00	0,00	2.693,16	2,00	2.693,16	
07.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.633,74	0,00	0,00	0,00	3.267,48	2,00	3.267,48	
07.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	1.298,95	1,00	1.298,95	
07.08.001.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	2.434,70	2,00	2.434,70	
07.08.001.005	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	M2	2,52	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	945,63	2,52	945,63	


Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prof. João Alves dos Santos			
									002		Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL								
07.08.001.006	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41	1,00	152,41	
07.08.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	3,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	97,17	3,00	97,17	
07.08.001.008	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83	1,00	270,83	
07.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										6.602,04			
07.08.002.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	16,80	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	1.601,21	17,10	1.601,21	
07.08.002.002	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	782,36	17,10	782,36	
07.08.002.003	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	3,36	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	609,17	17,10	609,17	
07.08.002.004	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	3.609,30	10,00	3.609,30	
07.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.195,25			
07.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	610,20	6,00	610,20	
07.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	386,80	5,00	386,80	
07.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	1,00	134,41	
07.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	un	4,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	63,84	4,00	63,84	
07.10	METAIS E LOUÇAS										3.004,43			
07.10.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28	
07.10.002	Chuveiro em aço antivandalismo Decca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72	
07.10.003	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação, af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	1,00	412,05	
07.10.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11	
07.10.005	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	88,49	1,00	88,49	
07.10.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	0,00	0,00	0,00	1.617,85	1,00	1.617,85	
07.10.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, af 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	105,83	1,00	105,83	
07.10.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10	
07.11	PINTURAS										218,14			
07.11.001	PINTURA DE FORRO										218,14			
07.11.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	218,14	14,90	218,14	
07.11.002	ESQUADRIAS										1.580,42			
07.11.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	419,85	27,00	419,85	



Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana




Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 27214663999SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obras: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
					06/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Valor do Contrato: R\$: 993.260,28					
					QUANTIDADES		VALORES		SALDO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
07.11.002.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	69,83	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.160,57	69,83	1.160,57	
07.11.003	PINTURA EXTERNA										9.610,73			
07.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.610,73	286,46	9.610,73	
07.12	DIVERSOS										667,45			
07.12.001	Limpeza geral	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	667,45	286,46	667,45	
8	RAMPAS/CIRCULAÇÕES/CANTEIROS/CAIXA D'ÁGUA/CASA DE BOMBA										R\$ 27.149,03			
08.01	RAMPAS DAS CIRCULAÇÕES										958,40			
08.01.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 439,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 878,50	2,00	878,50	
08.01.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,90	2,00	79,90	
08.02	CIRCULAÇÕES										2.094,00			
08.02.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	412,60	20,00	412,60	
08.02.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,93	0,00	0,00	0,00	418,60	20,00	418,60	
08.02.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,19	0,00	0,00	0,00	463,80	20,00	463,80	
08.02.004	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	799,00	20,00	799,00	
08.03	PASSEIO ENTRE ADM. E VEST.										2.481,90			
08.03.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 439,25	0,00	0,00	0,00	1300,18	2,96	1.300,18	
08.03.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	29,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	1181,72	29,58	1.181,72	
08.04	RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL										12.039,46			
08.04.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,06	0,00	0,00	0,00	457,66	0,00	0,00	0,00	942,78	2,06	942,78	
08.04.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	10,32	0,00	0,00	0,00	439,25	0,00	0,00	0,00	4.533,06	10,32	4.533,06	
08.04.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00	3.564,12	14,00	3.564,12	
08.04.004	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00	2.999,50	14,00	2.999,50	
08.05	CANTEIROS										2.725,64			
08.05.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.271,37	44,50	1.271,37	
08.05.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	343,99	44,50	343,99	
08.05.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	476,60	44,50	476,60	
08.05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	633,68	44,50	633,68	
08.06	CAIXA D'ÁGUA										3.647,09			



Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabarana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
								067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prof. João Alves dos Santos	
										002	Valor do Contrato: R\$: 993.260,25		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
08.06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	111,60	0,00	87,48	87,48	7,73	0,00	676,22	676,22	862,67	24,12	186,45
08.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	111,60	0,00	87,48	87,48	10,71	0,00	936,91	936,91	1.195,24	24,12	258,33
08.06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	111,60	0,00	87,48	87,48	14,24	0,00	1.245,72	1.245,72	1.589,18	24,12	343,47
08.07	CASA DE BOMBA												
08.07.001	PINTURA EXTERNA										1.636,26		
08.07.001.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	7,00	0,00	7,00	7,00	28,57	0,00	199,99	199,99	199,99	0,00	0,00
08.07.001.002	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m2	27,00	0,00	26,26	26,26	11,37	0,00	298,58	298,58	306,99	0,74	8,41
08.07.001.003	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	27,00	0,00	26,26	26,26	7,73	0,00	202,99	202,99	208,71	0,74	5,72
08.07.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	27,00	0,00	26,26	26,26	10,71	0,00	281,24	281,24	289,17	0,74	7,93
08.07.001.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	44,34	0,00	26,26	26,26	14,24	0,00	373,94	373,94	631,40	18,08	257,46
08.07.002	PINTURA INTERNA										1.176,95		
08.07.002.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço f6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,30	0,00	3,30	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	85,31	17,10	85,31
08.07.002.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	33,00	0,00	32,80	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	255,09	17,10	255,09
08.07.002.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	33,00	0,00	32,80	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	353,43	17,10	353,43
08.07.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	33,00	0,00	32,80	32,80	14,64	0,00	480,19	480,19	483,12	0,20	2,93
08.07.003	PINTURA DE LAJE										330,80		
08.07.003.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	10,00	0,00	8,20	8,20	7,73	0,00	63,39	63,39	77,30	1,80	13,91
08.07.003.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	10,00	0,00	8,20	8,20	10,71	0,00	87,82	87,82	107,10	1,80	19,28
08.07.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	10,00	0,00	8,20	8,20	14,64	0,00	120,05	120,05	146,40	1,80	26,35
08.07.004	ESQUADRIA										58,53		
08.07.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	3,15	0,00	3,15	3,15	18,58	0,00	58,53	58,53	58,53	0,00	0,00
9	ABRIGO/OFICINA/DEPOSITO										R\$ 97.954,81		
09.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										31.412,31		
09.01.001	Demolição de reboco	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.162,17	158,55	1.162,17
09.01.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	74,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.602,03	74,34	1.602,03
09.01.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.506,48	169,97	3.506,48
09.01.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	5,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,01	5,98	116,01
09.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	4,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,56	4,79	62,56
09.01.006	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	28,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 434,52	28,70	434,52
09.01.007	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59
09.01.008	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41
09.01.009	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,32	4,00	67,32
09.01.010	Coleta e carga manuais de entulho	m3	150,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.203,50	150,00	2.203,50


Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


At: Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA	
							067/2023		19.06.2023 a 18.07.2023		MEDIÇÃO Nº		19.07.2023	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM RS	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM RS	DO PERÍODO EM RS	ACUMULADO ATUAL EM RS	VALOR CONTRATO (RS)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM RS	
09.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.074,44	380,68	21.074,44	
09.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 678,30	63,63	678,30	
09.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 482,98	38,06	482,98	
09.02	COBERTURA										12.776,51			
09.02.001	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	4743,27	380,68	4.743,27	
09.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	3339,77	38,06	3.339,77	
09.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	3562,64	63,63	3.562,64	
09.02.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	30,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	572,25	30,70	572,25	
09.02.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	86,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	558,58	86,20	558,58	
09.03	REVESTIMENTO										5.932,22			
09.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	940,20	158,55	940,20	
09.03.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	4.529,77	158,55	4.529,77	
09.03.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,50	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	462,25	12,50	462,25	
09.04	PILARES										1.161,80			
09.04.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38	
09.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14	
09.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56	
09.04.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	26,40	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	885,72	26,40	885,72	
09.05	PAVIMENTAÇÃO										13.296,75			
09.05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.941,60	169,97	3.941,60	
09.05.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	9.355,15	169,97	9.355,15	
09.06	PASSEIO										5.938,70			
09.06.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	130,09	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	4.092,63	130,09	4.092,63	
09.06.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	49,84	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	1.846,07	34,83	1.846,07	
09.07	ESQUADRIAS METÁLICAS										8.462,50			
09.08	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	1,98	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	442,59	1,98	442,59	
09.08.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,80	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	223,82	0,80	223,82	
09.08.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	21,60	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	7.796,09	21,60	7.796,09	


Thaísa Lima Santos
 Eng.º Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Eng. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes
 Eng.º Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabarana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prof. João Alves dos Santos			
									002	Valor do Contrato: R\$: 993.260,28				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE
09.09	PINTURAS													
09.09.001	PINTURA INTERNA											9.519,43		
09.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	5.497,61	375,52	5.497,61	
09.09.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	4.021,82	375,52	4.021,82	
09.09.002	PINTURA EXTERNA											6.617,40		
09.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	197,24	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	6.617,40	197,24	6.617,40	
09.09.004	ESQUADRIAS											1.850,11		
09.09.005	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	954,43	57,60	954,43	
09.09.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	895,68	57,60	895,68	
09.10	DIVERSOS											987,08		
09.10.001	Limpeza geral	m2	423,64	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	987,08	423,64	987,08	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 130.222,80		
10.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.01.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO											2.879,62		
10.01.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 414,30	15,00	414,30	
10.01.001.002	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,75	5,00	52,75	
10.01.001.004	Cabeçote de alumínio de 2"	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	2,00	37,06	
10.01.001.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	1,00	413,84	
10.01.001.006	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.001.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,60	60,00	1.374,60	
10.01.001.009	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	1,00	487,78	
10.01.002	QD1 - ADMINISTRATIVO											22.984,62		
10.01.002.001	RAMAL DE ENTRADA											2.574,48		
10.01.002.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	156,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.575,60	156,00	1.575,60	
10.01.002.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af 12/2015	m	39,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 816,66	39,00	816,66	
10.01.002.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.002.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,85	13,00	57,85	
10.01.002.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.002.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.002.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.002.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											1.574,48		




Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 271739/1991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Atq. Breno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 27161049/21
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabarana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDIÇÃO Nº	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prof. João Alves dos Santos			
									002		Valor do Contrato: R\$: 993.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.002.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.002.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.002.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.002.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação, af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,94	1,00	88,94	
10.01.002.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.002.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af 10/2020	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 253,30	5,00	253,30	
10.01.002.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af 10/2020	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,25	5,00	61,25	
10.01.002.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.002.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										18.832,13			
10.01.002.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af 01/2016	un	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.706,91	23,00	3.706,91	
10.01.002.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af 01/2016	un	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.334,16	8,00	1.334,16	
10.01.002.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada), af 01/2016	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.204,20	10,00	1.204,20	
10.01.002.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	36,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.632,04	36,00	3.632,04	
10.01.002.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.273,32	12,00	1.273,32	
10.01.002.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 411,60	4,00	411,60	
10.01.002.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	33,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.269,90	33,00	7.269,90	
10.01.003	QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO										21.197,79			
10.01.003.001	RAMAL DE ENTRADA										3.012,76			
10.01.003.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	184,00	184,00	0,00	184,00	R\$ 10,10	1.858,40	0,00	1.858,40	R\$ 1.858,40	0,00	0,00	
10.01.003.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af 12/2015	m	46,00	46,00	0,00	46,00	R\$ 20,94	963,24	0,00	963,24	R\$ 963,24	0,00	0,00	
10.01.003.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00	
10.01.003.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 4,45	66,75	0,00	66,75	R\$ 66,75	0,00	0,00	
10.01.003.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00	
10.01.003.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00	
10.01.003.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00	
10.01.003.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.455,38			
10.01.003.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00	
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 27,12	0,00	27,12	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00	




Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 271139159/1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 271610492/1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			CONTRATANTE: Prefeitura de Itabarana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO N°	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							002		Valor do Contrato: R\$: 998.260,28					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				VALORES		SALDO								
10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 137,16	0,00	137,16	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00	
10.01.003.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00	
10.01.003.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00	
10.01.003.002.006	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 47,64	95,28	0,00	95,28	R\$ 95,28	0,00	0,00	
10.01.003.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 47,64	47,64	0,00	47,64	R\$ 47,64	0,00	0,00	
10.01.003.002.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,25	49,00	0,00	49,00	R\$ 49,00	0,00	0,00	
10.01.003.002.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
10.01.003.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										16.729,65			
10.01.003.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 161,17	805,85	0,00	805,85	R\$ 805,85	0,00	0,00	
10.01.003.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 166,77	3.001,86	0,00	3.001,86	R\$ 3.001,86	0,00	0,00	
10.01.003.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 120,42	1.083,78	0,00	1.083,78	R\$ 1.083,78	0,00	0,00	
10.01.003.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 106,11	954,99	0,00	954,99	R\$ 954,99	0,00	0,00	
10.01.003.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 100,89	2.320,47	0,00	2.320,47	R\$ 2.320,47	0,00	0,00	
10.01.003.003.006	Refetor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00	
10.01.003.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	37,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 220,30	8.151,10	0,00	8.151,10	R\$ 8.151,10	0,00	0,00	
10.01.004	QD3 - SALAS DE AULA										29.932,54			
10.01.004.001	RAMAL DE ENTRADA										3.585,51			
10.01.004.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	208,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.292,16	208,00	2.292,16	
10.01.004.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	52,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.088,88	52,00	1.088,88	
10.01.004.001.003	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.004.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 80,10	18,00	80,10	
10.01.004.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.004.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.004.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.004.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.321,14			
10.01.004.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.004.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.004.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.004.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12	




Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 271739199-1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Eng. Breno de Assis Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 271610492-1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Obras: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									002		Valor de Contrato: R\$: 993.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNT.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	VALOR RESTANTE EM R\$		
10.01.004.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.004.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,50	6,00	73,50	
10.01.004.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.004.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										25.025,89			
10.01.004.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.669,56	28,00	4.669,56	
10.01.004.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94	
10.01.004.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	61,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.438,30	61,00	13.438,30	
10.01.004.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	54,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.448,06	54,00	5.448,06	
10.01.004.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 318,33	3,00	318,33	
10.01.004.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 308,70	3,00	308,70	
10.01.005	QD4 - REFEITÓRIO										18.125,48			
10.01.005.001	RAMAL DE ENTRADA										2.054,45			
10.01.005.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	116,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.278,32	116,00	1.278,32	
10.01.005.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,26	29,00	607,26	
10.01.005.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.005.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,50	10,00	44,50	
10.01.005.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.005.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.005.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.005.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.529,97			
10.01.005.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.005.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.005.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.005.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12	
10.01.005.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.005.002.006	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	1,00	233,33	
10.01.005.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00	
10.01.005.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.005.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										14.584,86			




Thaisa Lima Santos
Eng.º Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N.º 29.553.812/0001-46

Arquiteto Beiriz Pinto
CAU/SE A7/1823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 271610492
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabarana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46								CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
								067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO N°	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		
										002	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
					DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL								
10.01.005.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.502,17	21,00	3.502,17	
10.01.005.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.445,04	12,00	1.445,04	
10.01.005.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.609,00	30,00	6.609,00	
10.01.005.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.412,46	14,00	1.412,46	
10.01.005.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 954,99	9,00	954,99	
10.01.005.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40	
10.01.006	QD5 - VESTIÁRIO										13.666,14			
10.01.006.001	RAMAL DE ENTRADA										2.852,49			
10.01.006.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6.0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	164,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.807,28	164,00	1.807,28	
10.01.006.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	41,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 858,54	41,00	858,54	
10.01.006.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,30	14,00	62,30	
10.01.006.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.006.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.006.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.006.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.167,48			
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 499,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 499,96	1,00	499,96	
10.01.006.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.006.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	1,00	68,59	
10.01.006.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.006.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,75	3,00	36,75	
10.01.006.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.006.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										9.646,17			
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,52	6,00	722,52	
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 644,68	4,00	644,68	
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	26,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.727,80	26,00	5.727,80	



Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana





Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46





Eng. Breno de Assis Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabarana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA	
						067/2023		19.06.2023 a 18.07.2023		MEDIÇÃO Nº		19.07.2023	
										002		Outra Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
												Valor do Contrato: R\$: 998.260,28	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)		
10.01.006.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.715,13	17,00	1.715,13
10.01.006.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 424,44	4,00	424,44
10.01.006.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 411,60	4,00	411,60
10.01.007	QD6 - ABRIGO										14.827,57		
10.01.007.001	RAMAL DE ENTRADA										1.646,53		
10.01.007.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,84	92,00	1.013,84
10.01.007.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 481,62	23,00	481,62
10.01.007.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,70	6,00	26,70
10.01.007.001.004	Fita em aço inox, fusímeo ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.007.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96
10.01.007.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24
10.01.007.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.007.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.496,12		
10.01.007.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34
10.01.007.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.007.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16
10.01.007.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	1,00	79,97
10.01.007.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.007.002.006	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,63	3,00	192,63
10.01.007.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00
10.01.007.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.007.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										11.684,92		
10.01.007.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.901,06	18,00	2.901,06
10.01.007.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94
10.01.007.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.507,50	25,00	5.507,50
10.01.007.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.816,02	18,00	1.816,02
10.01.007.003.005	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40
10.01.008	QD7 - CASA DE APOIO										6.609,04		
10.01.008.001	RAMAL DE ENTRADA										926,01		
10.01.008.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	56,00	0,00	56,00	56,00	R\$ 11,02	0,00	617,12	617,12	R\$ 6.171,20	0,00	0,00



Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDICÃO Nº	19.07.2023	Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
									002		VALORES		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.008.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 13,23	0,00	185,22	185,22	R\$ 185,22	0,00	0,00	
10.01.008.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 3,12	0,00	15,60	15,60	R\$ 15,60	0,00	0,00	
10.01.008.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 4,69	0,00	23,45	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00	
10.01.008.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 14,96	0,00	14,96	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00	
10.01.008.001.006	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 10,47	0,00	20,94	20,94	R\$ 20,94	0,00	0,00	
10.01.008.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 12,18	0,00	48,72	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00	
10.01.008.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										398,06			
10.01.008.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 143,09	0,00	143,09	143,09	R\$ 143,09	0,00	0,00	
10.01.008.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 27,12	0,00	27,12	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00	
10.01.008.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 137,16	0,00	137,16	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00	
10.01.008.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,49	0,00	13,49	13,49	R\$ 13,49	0,00	0,00	
10.01.008.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 12,25	0,00	36,75	36,75	R\$ 36,75	0,00	0,00	
10.01.008.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 40,45	0,00	40,45	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
10.01.008.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										5.284,97			
10.01.008.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 161,17	0,00	1.289,36	1.289,36	R\$ 1.289,36	0,00	0,00	
10.01.008.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 120,42	0,00	602,10	602,10	R\$ 602,10	0,00	0,00	
10.01.008.003.003	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 237,23	0,00	237,23	237,23	R\$ 237,23	0,00	0,00	
10.01.008.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 220,30	0,00	2.203,00	2.203,00	R\$ 2.203,00	0,00	0,00	
10.01.008.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 106,11	0,00	742,77	742,77	R\$ 742,77	0,00	0,00	
10.01.008.003.006	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 70,17	0,00	210,51	210,51	R\$ 210,51	0,00	0,00	
11	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO/CAIXAS										54.131,26			
11.01	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO										50.140,16			
11.01.001	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.180,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.180,40	1,00	23.180,40	
11.01.002	Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x h=1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes). af 12/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.675,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.675,09	1,00	12.675,09	
11.01.003	Sumidouro paredes com tijolo maciço (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h=3,55m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.284,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.284,67	1,00	14.284,67	
11.02	CAIXAS										3.991,10			
11.02.001	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,65m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 392,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.178,70	3,00	1.178,70	
11.02.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 281,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.812,40	10,00	2.812,40	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										47.572,00			
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										47.572,00			
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	350,00	48,29	29,87	78,16	R\$ 88,60	4.278,49	2.646,48	6.924,98	R\$ 31.010,00	271,84	24.085,02	



Thaisa Lima Santos
 Eng.º Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabiana



Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


ALVARO BENIZ PINTO
 CREA 2716123-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
 Eng.º Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.06.2023 a 18.07.2023	MEDIÇÃO Nº	19.07.2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									002		Valor do Contrato: R\$: 998.260,28			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	350,00	48,29	29,87	78,16	R\$ 47,32	2.285,08	1.413,45	3.698,53	R\$ 16.562,00	271,84	12.863,47	
TOTAL DO ITEM								137.400,50		211.392,33			786.867,95	
TOTAL DA MEDIÇÃO									73.991,83		998.260,28			

81130,4


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46




Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46



Tháisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana




Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

SBP CONSTRUÇÕES

RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532 - GRAGERU - ARACAJU-SE


REFORMA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA PREFEITO JOÃO ALVES DOS SANTOS


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
2	CASA DOS VIGIAS		
02.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
02.01.001	Demolição de reboco	m2	Quarto 1 (10,24 x 0,44) + Quarto 2 (10,56 x 0,45) + Hall (2,00 x 0,40 + 1,50 x 1,00 + 1,30 x 1,30) + Sala (11,89 x 0,40) + Externo (12,27 x 0,45 + 0,67 x 1,90 + 3,50 x 1,30 + 30,49 x 0,55) = 46,12m²
02.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	Cozinha (6,28 x 1,55 + 0,53 x 0,83 x 4 + 0,53 x 1,15 + 0,16 x 0,83 x 2 + 1,15 x 0,16) + WC (5,03 x 1,55) = 20,35m²
02.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	WC (1,80 x 1,02) = 1,84m²
02.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	6,90 x 0,53 + 3,10 x 0,55 + 2,80 x 0,55 + 2,58 x 0,53 + 6,56 x 0,55 + 3,65 x 0,53 = 13,81m²
02.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	(0,80m x 2,10m x 2un) + (0,70m x 2,10m x 2un) + (0,60m x 2,10m) + (0,50m x 1,50m x 2un) = 9,06m²
02.01.006	Remoção de vaso sanitário	un	1,00
02.01.007	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00
02.01.008	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	55,60m²
02.01.009	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	
02.01.010	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	9,00/3,33 = 3m²
02.01.011	Remoção de lavatório	un	1,00
02.01.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,00M³
02.02	COBERTURA		
02.02.001	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	3,53 + 2,34 + 3,58 + 4,22 + 5,39 + 7,11 + 5,39 + 1,90 = 33,46m
02.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	9,00/3,33 = 3m²
02.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	
02.02.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	7,11M


 Elaine da Cunha Menezes
 Eng^a Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Thaísa Lima Santos
 Eng^a Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


 Arq. Breno de Assis Pinto
 CAU/SP 171.923-B
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46

02.02.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	$5,39 \times 7,10 + 4,22 \times 3,58 + 1,88 \times 3,52 = 60,00m^2$
02.03	REVESTIMENTO		
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	Quarto 1 (10,24 x 0,49) + Quarto 2 (10,56 x 0,45) + Hall (2,00 x 0,40 + 1,50 x 1,00 + 1,30 x 1,30) + Sala (11,89 x 0,40) + Externo (12,27 x 0,45 + 0,67 x 1,90 + 3,50 x 1,30 + 30,49 x 0,55) = 46,62m²
02.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	Quarto 1 (10,24 x 0,44) + Quarto 2 (10,56 x 0,45) + Hall (2,00 x 0,40 + 1,50 x 1,00 + 1,30 x 1,30) + Sala (11,89 x 0,40) + Cozinha (6,28 x 1,55) + WC (5,04 x 1,55) = 35,55m²
02.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	$12,27 \times 0,45 + 0,67 \times 1,90 + 3,50 \times 1,30 + 30,49 \times 0,55 = 28,12m^2$
02.03.004	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	$6,28 \times 2,80 + 5,03 \times 2,80 = 31,67m^2$
02.04	FORRO		
02.04.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	$2,90 \times 3,40 + 3,15 \times 2,32 + 3,18 \times 2,32 + 2,63 \times 0,80 + 1,30 \times 2,40 + 1,00 \times 1,72 = 31,49m^2$
02.05	PILARES		
02.05.001	Demolição de reboco	m2	$2,67 \times 0,82 = 2,19M^2$
02.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	$2,67 \times 0,82 = 2,19M^2$
02.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	$2,67 \times 0,82 = 2,19M^2$
02.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	$2,67 \times 0,82 = 2,19M^2$
02.06	PAVIMENTAÇÃO		
02.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	WC (1,80 x 1,02) = 1,84m²
02.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	
02.07	PASSEIO		
02.07.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	$6,90 \times 0,53 + 3,10 \times 0,55 + 2,80 \times 0,55 + 2,58 \times 0,53 + 6,56 \times 0,55 + 3,65 \times 0,53 = 13,81m^2$
02.08	ESQUADRIAS		

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Thaísa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE 71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


02.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA		
02.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
02.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
02.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	0,50 x 1,50 x 2 = 1,50m ²
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	2,00
02.08.001.006	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	
02.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO		
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3,00
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
02.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00
02.10	METAIS E LOUÇAS		
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	
02.10.002	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	
02.10.004	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	
02.11	PINTURAS		
02.11.001	PINTURA INTERNA		
02.11.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	Paredes (35,64 x 2,80) + Forro (31,96) = 131,77M ²


Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N^o 29.553.812/0001-46



Eng. Bruno Beziriz Pinto
CREA 271823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N^o 29.553.812/0001-46

02.11.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	Paredes (35,64 x 2,80) + Forro (31,96) = 131,77M²
02.11.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	Paredes (35,64 x 2,80) + Forro (31,96) = 131,77M²
02.11.002	PINTURA EXTERNA		
02.11.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	Paredes (30,52 x 3,00) + Forro (1,00 x 0,65) - Esquadrias (0,80 x 2,10 + 0,70 x 2,10 + 0,50 x 1,50 x 2 + 1,00 x 1,10 x 2) = 85,80M²
02.11.004	ESQUADRIAS		
02.11.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	(0,80m x 2,10m x 2un) + (0,70m x 2,10m x 2un) + (0,60m x 2,10m) + (0,50m x 1,50m x 2un)= 9,06m ² x 2,5= 22,65m²
02.11.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	
02.12	DIVERSOS		
02.12.001	Limpeza geral	m2	60M²
4	LABORATÓRIO		
04.12	PINTURAS		
04.12.001	PINTURA INTERNA		
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	
04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	
04.12.002	PINTURA EXTERNA		
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	60M²
04.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS		
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	99,95M²
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	m2	
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	
04.13	DIVERSOS		
04.13.001	Limpeza geral	m2	301,83M²
5	SALAS DE AULAS		
05.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		



Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Tháisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Bruno de Assis Pinto
CREA 27214563045E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N^o 29.553.812/0001-46



Eng. Bruno de Assis Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46


05.01.001	Demolição de reboco	m2	$20,70 \times 0,60 + 13,85 \times 0,60 + 63,25 \times 1,00 + 31,50 \times 0,30 =$ 93,43m²
05.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	$(7,50 \times 1,50 + 6,70 \times 1,50 + 6,00 \times 1,50 + 6,00 \times 1,50) \times 5 =$ 196,50m²
05.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	
05.01.004	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	$45,00m^2 \times 5 \text{ salas} =$ 225,00m²
05.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	$0,80m \times 2,40m \times 5 \text{ salas} =$ 9,60m²
05.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	$7,15m \times 25,00m =$ 178,93m²
05.01.007	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	
05.01.008	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	$161,40m \div 3,333m/m^2 =$ 48,42m²
05.01.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30M³
05.02	ELEVAÇÃO		
05.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60M²
05.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60M²
05.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60M²
05.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00M
05.03	COBERTURA		
05.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,45M²
05.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	
05.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	
05.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	
05.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	484,50M²
05.04	REVESTIMENTO		
05.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 272146399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-47



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 272146399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-40

05.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	
05.04.003	Apicoamento total de reboco com pontadeiras/talhadeiras	m2	
05.04.004	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	
05.05	FORRO		
05.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	
05.06	PILARES		
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	
05.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	
05.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	
05.07	PASSEIO		
05.07.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	
05.08	ESQUADRIAS		
05.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA		
05.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	
05.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS		
05.08.002.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	
05.09	PINTURAS		
05.09.001	PINTURA EXTERNA		
05.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	
05.09.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	
05.09.002	ESQUADRIAS		
05.09.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	
05.09.003	PINTURA DE FORRO		



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Eng. Breno de Azevedo Pinto
 CREA 2716104921
 SBP CONS.
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46

05.09.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	
05.10	DIVERSOS		
05.10.001	Limpeza geral	m2	
08.06	CAIXA D'ÁGUA		
08.06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	Paredes (3 x 9,60m) + Fundo (2,40 x 2,40m) + Pilares (9 x 0,9m x 4) + Vigas (2,05 x 0,90m x 6) + Vigas menores (1,75 x 0,90m x 6) = 87,48M²
08.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	Paredes (3 x 9,60m) + Fundo (2,40 x 2,40m) + Pilares (9 x 0,9m x 4) + Vigas (2,05 x 0,90m x 6) + Vigas menores (1,75 x 0,90m x 6) = 87,48M²
08.06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	Paredes (3 x 9,60m) + Fundo (2,40 x 2,40m) + Pilares (9 x 0,9m x 4) + Vigas (2,05 x 0,90m x 6) + Vigas menores (1,75 x 0,90m x 6) = 87,48M²
08.07	CASA DE BOMBA		
08.07.001	PINTURA EXTERNA		
08.07.001.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	7,00M²
08.07.001.002	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m2	2,45 x 13,20 = 26,26M²
08.07.001.003	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	2,45 x 13,20 = 26,26M²
08.07.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2,45 x 13,20 = 26,26M²
08.07.001.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	2,45 x 13,20 = 26,26M²
08.07.002	PINTURA INTERNA		
08.07.002.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,30M²
08.07.002.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	2,17 x 12,10m = 32,8M²
08.07.002.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2,17 x 12,10m = 32,8M²
08.07.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	2,17 x 12,10m = 32,8M²
08.07.003	PINTURA DE LAJE		



Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thaísa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Bruno de Assis
CREA 27214663-5E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N^o 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno de Assis
CAU/SE 71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

08.07.003.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	4 x 2,05m = 8,2M²
08.07.003.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	4 x 2,05m = 8,2M²
08.07.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	4 x 2,05m = 8,2M²
08.07.004	ESQUADRIA		
08.07.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	3,15M²
10.01.003	QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO		
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00
10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00
10.01.008	QD7 - CASA DE APOIO		
10.01.008.001	RAMAL DE ENTRADA		
10.01.008.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	28m x 2 cabos = 56m
10.01.008.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	14,00
10.01.008.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00
10.01.008.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00
10.01.008.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00
10.01.008.001.006	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00
10.01.008.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00
10.01.008.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
10.01.008.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
10.01.008.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00
10.01.008.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Tháisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-45


Arq. Bruno Beziriz Pinto
 CREA 2723-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-45

10.01.008.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00
10.01.008.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00
10.01.008.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00
10.01.008.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA		
10.01.008.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00
10.01.008.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	5,00
10.01.008.003.003	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	1,00
10.01.008.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00
10.01.008.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	7,00
10.01.008.003.006	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	29,87
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	29,87


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Brito
CREA 272146639-7
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Medição nº 2


19.06.2023 a 18.07.2023

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo servir de memória para os pagamentos efetuados por conta da referida medição, como também informar o andamento de serviços. Ele não substitui a medição efetuada considerando-se a planilha orçamentária, servindo de resumo para suporte à mesma.

FOTOS




Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Tháisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOTOS 01. Remoção de telhamento e troca de algumas peças do madeiramento da casa do vigia


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beliz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46



FOTOS 2. Pintura das esquadrias de madeira do Bloco Laboratório e pintura externa


Thaisa Lima Santos
 Eng^a Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



FOTOS 3. Demolição de revestimento, demolição de reboco e destelhamento da casa do vigia


Elaine da Cunha Menezes
 Eng^a Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 27214663995E
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N^o 29.553.812/0001-4

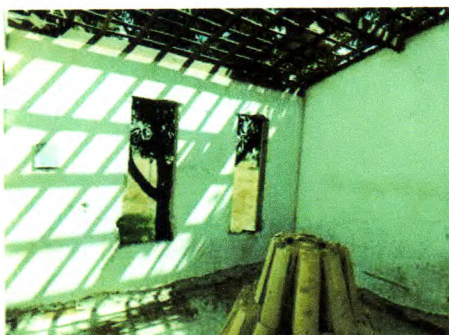

Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-4

FOTOS 4. Destelhamento para lavagem de telhas, remoção de esquadrias, instalação de novos caixões de porta, novas instalações elétricas

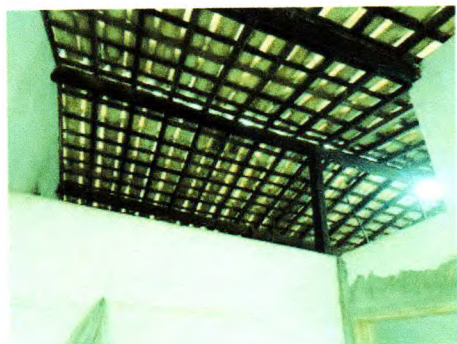

FOTOS 5. Retelhamento após a lavagem das telhas, instalação de caixões e reboco, instalação de revestimento na cozinha e pontos de energia



FOTOS 6. Instalação de esquadrias de madeira, retelhamento, rebocos internos, passeio externo

[Handwritten signature]
 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

[Handwritten signature]
 Thaisa Lima Santos
 Eng° Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana

[Handwritten signature]
 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46

[Handwritten signature]
 Elaine da Cunha Menezes
 Eng° Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana




FOTOS 7. Fotos externas da casa do vigia com rebocos, recuperação de passeio, emassamentos dos beirais do telhado, instalação de esquadrias de madeira





FOTOS 8. Remoção do passeio, execução de chapisco com reboco, instalação de caixões




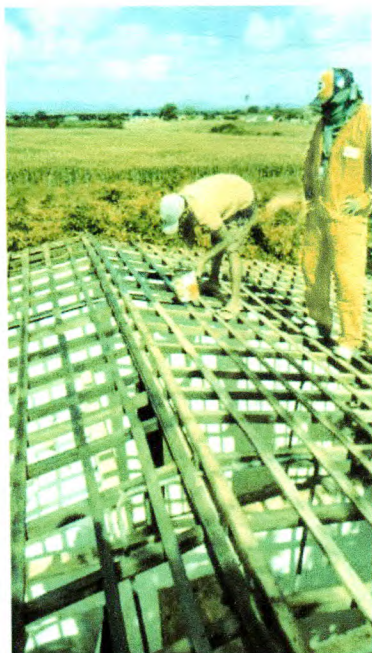
FOTOS 9. Aplicação de imunizante no madeiramento do telhado


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes
Eng° Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46



Thaisa Lima Santos
Eng° Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




FOTOS 10. Aplicação do imunizante no madeiramento e foto da parte externa da casa do vigia após finalização dos serviços



FOTOS 11. Foto da área externa após pintura de parede e fotos da parte interna finalizada, inclusive com instalação de luminárias e pintura de esquadrias



Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46




Elaine da Cunha Menezes
 Eng° Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana




Thaisa Lima Santos
 Eng° Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46

FOTOS 12. Área interna com pintura de parede, esquadrias, instalação de quadro de energia e novos disjuntores




Thaisa Lima Santos
 Eng.º Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana

FOTOS 13. Novo ramal de entrada da casa do vigia e foto externa e interna





FOTOS 14. Pintura interna e externa da casa do vigia. Emassamentos dos beirais do telhado


Elaine da Cunha Menezes
 Eng.º Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana



FOTOS 15. Instalação de arandelas externas e pintura externa da casa do vigia.


Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N.º 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ 29.553.812/0001-46



FOTOS 16. Emassamento e pintura da Casa de Bombas e Caixa d'água

Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



FOTOS 17. Emassamento e pintura da Casa de Bombas e Caixa d'água . Remoção de revestimento na sala de aula

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N^o 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46



FOTOS 18. Remoção de telhado, revestimento, limpeza de telhas, troca de madeiramento danificado, execução de chapisco e reboco no bloco das salas de aula



FOTOS 19. Remoção de telhado, revestimento, limpeza de telhas, troca de madeiramento danificado, execução de chapisco e reboco no bloco das salas de aula

A handwritten signature in blue ink, belonging to Thaisa Lima Santos.

Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

A handwritten signature in blue ink, belonging to Eng. Breno de Assis Pinto.

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

A handwritten signature in blue ink, belonging to Elaine da Cunha Menezes.

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


A handwritten signature in blue ink, belonging to Arq. Bruno Beiriz Pinto.

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46



Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 271739199-1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

FOTOS 20. Execução de chapisco e reboco no bloco das salas de aula, após demolição do antigo

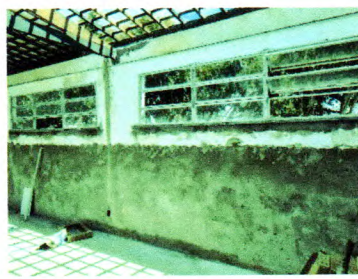

FOTOS 21. Demolição e execução de chapisco e reboco nas salas de aula. Instalação de novos caixões de porta



FOTOS 22. Retelamento após a lavagem das telhas e Demolição e execução de chapisco e reboco nas salas de aula.

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabarana

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ 29.553.812/0001-46
