




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 18/05/2023 A 25/05/2023				DATA: 31/05/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	106.622,74	53.640,47	160.263,21	2.121.969,29	7,02	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	2.346,28	1.181,59	3.527,87	44,52	2.226.000,00	104.456,39	52.604,39	157.060,78	2.068.939,22	7,06	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	2,30	1,10	3,40	941,89	47.094,50	2.166,35	1.036,08	3.202,43	43.892,07	6,80	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	5.483,60	2.868,27	8.351,87	110.868,13	7,01	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	23,05	12,25	35,30	123,60	61.800,00	2.848,98	1.514,11	4.363,09	57.436,91	7,06	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	55,06	28,3	83,36	47,85	57.420,00	2.634,62	1.354,16	3.988,78	53.431,22	6,95	
Total geral								2.401.452,50	112.106,34	56.508,74	168.615,08	2.232.837,42	7,02	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.05.31 09:11:14 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____							


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715633353
Coordenador de Núcleo

Gestor


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 18/05/2023 A 25/05/2023	DATA: 31/05/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	18/05/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	5,35	19,80	105,93
2	18/05/2023	RUA M	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	2,60	4,50	11,70
3	18/05/2023	RUA M	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	1,75	6,45	11,29
4	19/05/2023	RUA M	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,10	24,00	146,40
5	19/05/2023	RUA C	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	4,00	10,40	41,60
6	19/05/2023	RUA C	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	2,60	3,10	8,06
7	22/05/2023	RUA C	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,50	6,70	43,55
8	22/05/2023	RUA C	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	2,95	8,00	23,60
9	22/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	3,10	36,40	112,84
10	22/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	2,30	12,80	29,44
11	23/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	1,80	13,60	24,48
12	23/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	3,70	4,30	15,91
13	23/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	3,20	3,30	10,56
14	23/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	1,50	16,10	24,15
15	23/05/2023	RUA VERA CANDIDA DE SANTANA	ROTARY CLUB	4,20	8,00	33,60
16	23/05/2023	RUA VERA CANDIDA DE SANTANA	ROTARY CLUB	3,40	13,00	44,20
17	23/05/2023	RUA ISAAC ANTÔNIO DE JESUS	ROTARY CLUB	2,50	6,80	17,00
18	23/05/2023	RUA VERA CANDIDA DE SANTANA	ROTARY CLUB	1,60	3,10	4,96
19	23/05/2023	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR	ROTARY CLUB	2,00	2,50	5,00
20	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	1,10	1,50	1,65
21	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	1,20	4,90	5,88
22	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	1,50	4,30	6,45
23	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	2,30	2,50	5,75
24	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	3,00	4,60	13,80
25	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	1,40	3,20	4,48
26	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	3,80	7,20	27,36
27	24/05/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	5,70	17,00	96,90
28	24/05/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	5,00	17,30	86,50
29	25/05/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,30	9,50	31,35
30	25/05/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,20	26,00	187,20
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.181,59

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.05.31
09:11:47 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gen. Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CRCA/SE 715638353
Coordenador de Núcleo

Gestor

Jenê Ruyana Santos da Paixão
Eng. Civil - CRCA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2023**



RUA O



RUA M



RUA M



RUA M



RUA C



RUA C

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santane
Eng. Civil - CREA/SE 715838353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos de Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 20293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.05.31
09:12:12 -03'00'



RUA C



RUA C



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA




RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Favas Santana
 Eng. Civil - CREA/MS 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/MS 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:0664
 1211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:066412115
 25
 Dados: 2023.05.31
 09:12:27 -03'00'



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA VERA CANDIDA DE SANTANA



RUA VERA CANDIDA DE SANTANA



RUA ISAAC ANTÔNIO DE JESUS



RUA VERA CANDIDA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Zattos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Rayson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.05.31
09:12:43 -03'00'



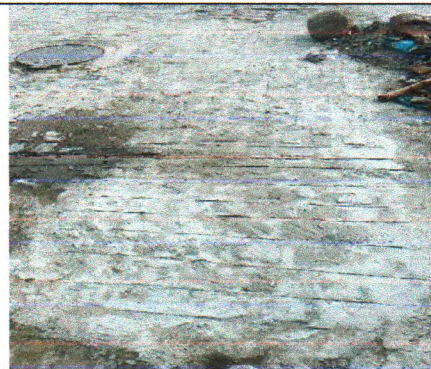
RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA




RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA




RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Yavaros Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.05.31
09:13:00 -03'00'



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA O



RUA O



RUA O

~~Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 552715630353
Coordenador de Núcleo~~

~~José Roberto Gomes de Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.05.31
09:13:17 -03'00'
