

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								28.539,31	12.744,02	0,00	12.744,02	15.795,29	44,65
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	6,00		6,00	6,00	460,29	5.523,48	2.761,74	0,00	2.761,74	2.761,74	50,00
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	-		-	5,00	926,55	4.632,75	0,00	0,00	0,00	4.632,75	0,00
01.003	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	98,00	98,00		98,00	-	101,86	9.982,28	9.982,28	0,00	9.982,28	0,00	100,00
01.004	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	20,00	-		-	20,00	420,04	8.400,80	0,00	0,00	0,00	8.400,80	0,00
02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS								53.021,53	5.689,39	18.844,07	24.533,46	28.488,07	46,27
02.001	Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada	m²	663,29	-		-	663,29	17,30	11.474,92	0,00	0,00	0,00	11.474,92	0,00
02.002	Projeto de Fundações - Fundações rasas	m²	663,29	-	663,29	663,29	-	3,71	2.460,81	0,00	2.460,81	2.460,81	0,00	100,00
02.003	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	m²	663,29	-	663,29	663,29	-	14,82	9.829,96	0,00	9.829,96	9.829,96	0,00	100,00
02.004	Projeto Hidráulico - Edifícios Hospitalares e de Saúde	m²	663,29	-	663,29	663,29	-	4,94	3.276,65	0,00	3.276,65	3.276,65	0,00	100,00
02.005	Projeto Esgoto Sanitário - Edifícios Hospitalares e de	m²	663,29	-	663,29	663,29	-	4,94	3.276,65	0,00	3.276,65	3.276,65	0,00	100,00
02.006	Projeto de Climatização - Edifícios Hospitalares e de	m²	663,29	-		-	663,29	7,41	4.914,98	0,00	0,00	0,00	4.914,98	0,00
02.007	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Edifícios Hospitalares e de Saúde	m²	663,29	-		-	663,29	6,18	4.099,13	0,00	0,00	0,00	4.099,13	0,00
02.008	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 31 a 60 Km de Aracaju	Un	1,00	1,00		1,00	-	4.570,98	4.570,98	4.570,98	0,00	4.570,98	0,00	100,00
02.009	Sondagem a percussão	m	45,00	5,52		5,52	39,48	202,61	9.117,45	1.118,41	0,00	1.118,41	7.999,04	12,27
03	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES								99.547,08	30.647,35	16.039,32	46.686,67	52.860,41	46,90
03.001	ÁREA EXTERNA								28.297,45	0,00	674,20	674,20	27.623,25	2,38
03.001.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	47,70	-		-	47,70	12,89	614,85	0,00	0,00	0,00	614,85	0,00
03.001.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	3,19	-	3,19	3,19	-	32,34	103,16	0,00	103,16	103,16	0,00	100,00
03.001.003	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	5,00	-		-	5,00	100,50	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00
03.001.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	39,89	-		-	39,89	25,81	1.029,56	0,00	0,00	0,00	1.029,56	0,00
03.001.005	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	20,84	-		-	20,84	243,95	5.083,92	0,00	0,00	0,00	5.083,92	0,00
03.001.006	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	43,88	-		-	43,88	103,43	4.538,51	0,00	0,00	0,00	4.538,51	0,00
03.001.007	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	24,40	-		-	24,40	68,59	1.673,60	0,00	0,00	0,00	1.673,60	0,00
03.001.008	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	24,40	-		-	24,40	12,09	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
03.001.009	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	5,42	-		-	5,42	68,59	371,76	0,00	0,00	0,00	371,76	0,00
03.001.010	Coleta e carga manuais de entulho	m3	74,33	-	4,15	4,15	70,18	22,85	1.698,44	0,00	94,83	94,83	1.603,61	5,58
03.001.011	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.574,75	-	311,25	311,25	5.263,50	1,53	8.529,37	0,00	476,21	476,21	8.053,16	5,58
03.001.012	Descarte de resíduos da construção civil em área	t	111,50	-		-	111,50	34,59	3.856,78	0,00	0,00	0,00	3.856,78	0,00
03.002	CASA DE LIXO								694,41	0,00	0,00	0,00	694,41	0,00
03.002.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,53	-		-	1,53	38,79	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
03.002.002	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m2	3,10	-		-	3,10	23,63	73,25	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00
03.002.003	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,31	-		-	0,31	243,95	75,62	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
03.002.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	2,15	-		-	2,15	22,85	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00
03.002.005	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	6,72	-		-	6,72	11,70	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	161,25	-		-	161,25	1,53	246,71	0,00	0,00	0,00	246,71	0,00
03.002.007	Descarte de resíduos da construção civil em área	t	3,23	-		-	3,23	34,59	111,73	0,00	0,00	0,00	111,73	0,00
03.003	PAVIMENTO TÉRREO								33.383,29	8.200,71	11.834,64	20.035,35	13.347,94	60,02
03.003.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,01	-	20,01	20,01	-	38,79	776,19	0,00	776,19	776,19	0,00	100,00
03.003.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	351,21	245,85	70,24	316,09	35,12	21,29	7.477,26	5.234,15	1.495,41	6.729,56	747,70	90,00
03.003.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	301,70	-	30,17	30,17	271,53	25,81	7.786,88	0,00	778,69	778,69	7.008,19	10,00
03.003.004	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	19,67	15,74	1,96	17,70	1,97	20,73	407,76	326,29	40,63	366,92	40,84	89,98
03.003.005	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	45,36	36,29	4,53	40,82	4,54	11,70	530,71	424,59	53,00	477,59	53,12	89,99
03.003.006	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	10,80	-		-	10,80	68,59	740,77	0,00	0,00	0,00	740,77	0,00
03.003.007	Remoção de pia	m2	2,00	-	2,00	2,00	-	27,36	54,72	0,00	54,72	54,72	0,00	100,00
03.003.008	Remoção de lavatório	un	8,00	8,00		8,00	-	16,68	133,44	133,44	0,00	133,44	0,00	100,00
03.003.009	Remoção de vaso sanitário	un	8,00	8,00		8,00	-	16,68	133,44	133,44	0,00	133,44	0,00	100,00
03.003.010	Remoção de interruptores e tomadas	un	150,00	120,00		120,00	30,00	5,98	897,00	717,60	0,00	717,60	179,40	80,00
03.003.011	Remoção de calha de zinco	m	90,00	90,00		90,00	-	13,68	1.231,20	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	100,00
03.003.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	69,74	-	62,77	62,77	6,97	22,85	1.593,56	0,00	1.434,29	1.434,29	159,27	90,01
03.003.013	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.230,00	-	4.707,00	4.707,00	523,00	1,53	8.001,90	0,00	7.201,71	7.201,71	800,19	90,00
03.003.014	Descarte de resíduos da construção civil em área	t	104,61	-		-	104,61	34,59	3.618,46	0,00	0,00	0,00	3.618,46	0,00
03.004	PAVIMENTO SUPERIOR								37.171,93	22.446,64	3.530,48	25.977,12	11.194,81	69,88
03.004.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	10,03	-	10,03	10,03	-	38,79	389,06	0,00	389,06	389,06	0,00	100,00
03.004.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (PAREDE DE GESSO)	m3	9,94	9,94		9,94	-	38,79	385,57	385,57	0,00	385,57	0,00	100,00
03.004.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	245,71	196,57	49,14	245,71	-	21,29	5.231,17	4.184,98	1.046,19	5.231,17	0,00	100,00
03.004.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	259,91	-		-	259,91	25,81	6.708,28	0,00	0,00	0,00	6.708,28	0,00
03.004.005	Demolição de forros	m2	288,79	288,79		288,79	-	10,34	2.986,09	2.986,09	0,00	2.986,09	0,00	100,00
03.004.006	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	303,07	303,07		303,07	-	26,75	8.107,12	8.107,12	0,00	8.107,12	0,00	100,00
03.004.007	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	303,07	303,07		303,07	-	15,50	4.697,59	4.697,59	0,00	4.697,59	0,00	100,00
03.004.008	Demolição de concreto manualmente	m3	26,87	2,61	7,83	10,44	16,43	267,59	7.190,14	698,41	2.095,23	2.793,64	4.396,50	38,85
03.004.009	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m2	3,81	-		-	3,81	23,63	90,03	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00
03.004.010	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	2,40	2,40		2,40	-	17,39	41,74	41,74	0,00	41,74	0,00	100,00
03.004.011	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	3,00		3,00	-	16,68	50,04	50,04	0,00	50,04	0,00	100,00
03.004.012	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00		3,00	-	16,68	50,04	50,04	0,00	50,04	0,00	100,00
03.004.013	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l	un	2,00	2,00		2,00	-	52,88	105,76	105,76	0,00	105,76	0,00	100,00
03.004.014	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	38,84	38,84		38,84	-	20,73	805,15	805,15	0,00	805,15	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362440

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. CIVIL - CREA - 272.103.1895
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
03.004.015	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	28,56	28,56		28,56	-	11,70	334,15	334,15	0,00	334,15	0,00	100,00
04	ELEVAÇÕES								376.592,76	0,00	85.057,33	85.057,33	291.535,43	22,59
04.001	TÉRREO								83.593,38	0,00	59.634,10	59.634,10	23.959,28	71,34
04.001.001	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25	m	63,78	-		-	63,78	41,09	2.620,72	0,00	0,00	0,00	2.620,72	0,00
04.001.002	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	24,87	-	24,87	24,87	-	125,49	3.120,94	0,00	3.120,94	3.120,94	0,00	100,00
04.001.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	204,01	-	142,81	142,81	61,20	79,94	16.308,56	0,00	11.416,23	11.416,23	4.892,33	70,00
04.001.004	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024	m	63,78	-		-	63,78	30,82	1.965,70	0,00	0,00	0,00	1.965,70	0,00
04.001.005	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	408,02	-	285,62	285,62	122,40	17,90	7.303,56	0,00	5.112,60	5.112,60	2.190,96	70,00
04.001.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	408,02	-	285,62	285,62	122,40	42,81	17.467,34	0,00	12.227,39	12.227,39	5.239,95	70,00
04.001.007	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	351,21	-	105,36	105,36	245,85	12,42	4.362,03	0,00	1.308,57	1.308,57	3.053,46	30,00
04.001.008	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	110,65	-	33,19	33,19	77,46	51,59	5.708,43	0,00	1.712,27	1.712,27	3.996,16	30,00
04.001.009	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	709,00	-	709,00	709,00	-	13,77	9.762,93	0,00	9.762,93	9.762,93	0,00	100,00
04.001.010	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	66,15	-	66,15	66,15	-	114,81	7.594,68	0,00	7.594,68	7.594,68	0,00	100,00
04.001.011	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	m3	7,09	-	7,09	7,09	-	1.040,69	7.378,49	0,00	7.378,49	7.378,49	0,00	100,00
04.002	SUPERIOR								205.583,49	0,00	0,00	0,00	205.583,49	0,00
04.002.001	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (AMARRAÇÃO DAS PAREDES)	kg	362,25	-		-	362,25	13,77	4.988,18	0,00	0,00	0,00	4.988,18	0,00
04.002.002	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (AMARRAÇÃO DAS PAREDES)	m2	72,45	-		-	72,45	114,81	8.317,98	0,00	0,00	0,00	8.317,98	0,00
04.002.003	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (AMARRAÇÃO DAS PAREDES)	m3	3,62	-		-	3,62	1.040,69	3.767,30	0,00	0,00	0,00	3.767,30	0,00
04.002.004	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m2	126,26	-		-	126,26	114,81	14.495,91	0,00	0,00	0,00	14.495,91	0,00
04.002.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	kg	946,93	-		-	946,93	13,77	13.039,23	0,00	0,00	0,00	13.039,23	0,00


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freira
 Engª Civil - CREA/SE 2709362449

José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031895
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:			
								Data de medição: 26/05/2026							
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
04.002.006	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m3	9,47	-		-	9,47	1.040,69	9.855,33	0,00	0,00	0,00	9.855,33	0,00	
04.002.007	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e	M2	288,79	-		-	288,79	234,21	67.637,51	0,00	0,00	0,00	67.637,51	0,00	
04.002.008	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	m²	10,41	-		-	10,41	224,11	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	0,00	
04.002.009	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	350,40	-		-	350,40	79,94	28.010,98	0,00	0,00	0,00	28.010,98	0,00	
04.002.010	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024	m	69,38	-		-	69,38	30,82	2.138,29	0,00	0,00	0,00	2.138,29	0,00	
04.002.011	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	700,80	-		-	700,80	17,90	12.544,32	0,00	0,00	0,00	12.544,32	0,00	
04.002.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	700,80	-		-	700,80	42,81	30.001,25	0,00	0,00	0,00	30.001,25	0,00	
04.002.013	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	245,71	-		-	245,71	12,42	3.051,72	0,00	0,00	0,00	3.051,72	0,00	
04.002.014	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	104,72	-		-	104,72	51,59	5.402,50	0,00	0,00	0,00	5.402,50	0,00	
04.003	ÁREA EXTERNA								5.381,68	0,00	0,00	0,00	5.381,68	0,00	
04.003.001	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	4,98	-		-	4,98	645,68	3.215,49	0,00	0,00	0,00	3.215,49	0,00	
04.003.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	13,34	-		-	13,34	51,59	688,21	0,00	0,00	0,00	688,21	0,00	
04.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	7,34	-		-	7,34	79,94	586,76	0,00	0,00	0,00	586,76	0,00	
04.003.004	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	14,68	-		-	14,68	17,90	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77	0,00	
04.003.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	14,68	-		-	14,68	42,81	628,45	0,00	0,00	0,00	628,45	0,00	
04.004	AMPLIAÇÃO								82.034,21	0,00	25.423,23	25.423,23	56.610,98	30,99	
04.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,00	-	14,00	14,00	-	64,02	896,28	0,00	896,28	896,28	0,00	100,00	
04.004.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	14,00	-	14,00	14,00	-	5,89	82,46	0,00	82,46	82,46	0,00	100,00	
04.004.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	9,52	-	9,52	9,52	-	18,90	179,93	0,00	179,93	179,93	0,00	100,00	
04.004.004	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m2	156,05	-	78,03	78,03	78,02	114,81	17.916,10	0,00	8.958,62	8.958,62	8.957,48	50,00	
04.004.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	kg	2.284,25	-	680,00	680,00	1.604,25	13,77	31.454,12	0,00	9.363,60	9.363,60	22.090,52	29,77	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Jose Arnaldo do M. Pereira Junior
 Eng. CIVIL CREA - 2721051035
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.004.006	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m3	22,84	-	5,71	5,71	17,13	1.040,69	23.769,36	0,00	5.942,34	5.942,34	17.827,02	25,00
04.004.007	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e	M2	33,03	-		-	33,03	234,21	7.735,96	0,00	0,00	0,00	7.735,96	0,00
05	REVESTIMENTOS/PAVIMENTAÇÃO/ACABAMENTOS								403.741,30	0,00	0,00	0,00	403.741,30	0,00
05.001	REVESTIMENTOS - TÉRREO								110.523,27	0,00	0,00	0,00	110.523,27	0,00
05.001.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	939,20	-		-	939,20	113,09	106.214,13	0,00	0,00	0,00	106.214,13	0,00
05.001.002	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	m	110,18	-		-	110,18	39,11	4.309,14	0,00	0,00	0,00	4.309,14	0,00
05.002	REVESTIMENTOS - SUPERIOR								93.187,30	0,00	0,00	0,00	93.187,30	0,00
05.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	797,35	-		-	797,35	113,09	90.172,31	0,00	0,00	0,00	90.172,31	0,00
05.002.002	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	m	77,09	-		-	77,09	39,11	3.014,99	0,00	0,00	0,00	3.014,99	0,00
05.003	REVESTIMENTO - VENTILAÇÕES								25.353,73	0,00	0,00	0,00	25.353,73	0,00
05.003.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço)	m2	249,52	-		-	249,52	101,61	25.353,73	0,00	0,00	0,00	25.353,73	0,00
05.004	PAVIMENTAÇÃO - TÉRREO								66.361,75	0,00	0,00	0,00	66.361,75	0,00
05.004.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	356,33	-		-	356,33	32,70	11.651,99	0,00	0,00	0,00	11.651,99	0,00
05.004.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	73,42	-		-	73,42	145,62	10.691,42	0,00	0,00	0,00	10.691,42	0,00
05.004.003	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	282,91	-		-	282,91	82,41	23.314,61	0,00	0,00	0,00	23.314,61	0,00
05.004.004	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	282,91	-		-	282,91	43,65	12.349,02	0,00	0,00	0,00	12.349,02	0,00
05.004.005	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m2	282,91	-		-	282,91	11,12	3.145,96	0,00	0,00	0,00	3.145,96	0,00
05.004.006	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	110,18	-		-	110,18	39,47	4.348,80	0,00	0,00	0,00	4.348,80	0,00
05.004.007	Filete em granito preto, L=3 cm e esp= 2 cm	m	15,00	-		-	15,00	57,33	859,95	0,00	0,00	0,00	859,95	0,00
05.005	PAVIMENTAÇÃO - ESCADA								1.471,94	0,00	0,00	0,00	1.471,94	0,00
05.005.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	10,73	-		-	10,73	82,41	884,26	0,00	0,00	0,00	884,26	0,00
05.005.002	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	10,73	-		-	10,73	43,65	468,36	0,00	0,00	0,00	468,36	0,00
05.005.003	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m2	10,73	-		-	10,73	11,12	119,32	0,00	0,00	0,00	119,32	0,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Jose Arnaldo da M. Pereira Junior
 Engº Civil CREA - 272105100
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
05.006	PAVIMENTAÇÃO - SUPERIOR								56.709,35	0,00	0,00	0,00	56.709,35	0,00
05.006.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	310,12	-		-	310,12	32,70	10.140,92	0,00	0,00	0,00	10.140,92	0,00
05.006.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	41,80	-		-	41,80	145,62	6.086,92	0,00	0,00	0,00	6.086,92	0,00
05.006.003	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	268,32	-		-	268,32	82,41	22.112,25	0,00	0,00	0,00	22.112,25	0,00
05.006.004	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	268,32	-		-	268,32	43,65	11.712,17	0,00	0,00	0,00	11.712,17	0,00
05.006.005	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m2	268,32	-		-	268,32	11,12	2.983,72	0,00	0,00	0,00	2.983,72	0,00
05.006.006	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	77,09	-		-	77,09	39,47	3.042,74	0,00	0,00	0,00	3.042,74	0,00
05.006.007	Filete em granito preto, L=3 cm e esp= 2 cm	m	11,00	-		-	11,00	57,33	630,63	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00
05.007	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - LAJES								17.838,56	0,00	0,00	0,00	17.838,56	0,00
05.007.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	288,79	-		-	288,79	16,08	4.643,74	0,00	0,00	0,00	4.643,74	0,00
05.007.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	288,79	-		-	288,79	45,69	13.194,82	0,00	0,00	0,00	13.194,82	0,00
05.008	ACABAMENTOS - TERRÇO								5.425,55	0,00	0,00	0,00	5.425,55	0,00
05.008.001	BALCÕES								5.149,79	0,00	0,00	0,00	5.149,79	0,00
05.008.001.00	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	4,88	-		-	4,88	173,20	845,22	0,00	0,00	0,00	845,22	0,00
05.008.001.00	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m2	9,76	-		-	9,76	17,90	174,70	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00
05.008.001.00	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	9,76	-		-	9,76	42,81	417,83	0,00	0,00	0,00	417,83	0,00
05.008.001.00	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m2	3,55	-		-	3,55	889,54	3.157,87	0,00	0,00	0,00	3.157,87	0,00
05.008.001.00	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	9,76	-		-	9,76	26,33	256,98	0,00	0,00	0,00	256,98	0,00
05.008.001.00	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024	m2	9,76	-		-	9,76	30,45	297,19	0,00	0,00	0,00	297,19	0,00
05.008.002	DIVERSOS								275,76	0,00	0,00	0,00	275,76	0,00
05.008.002.00	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m2	0,31	-		-	0,31	889,54	275,76	0,00	0,00	0,00	275,76	0,00
05.009	ACABAMENTOS - SUPERIOR								13.855,77	0,00	0,00	0,00	13.855,77	0,00
05.009.001	BALCÕES								4.951,47	0,00	0,00	0,00	4.951,47	0,00
05.009.001.00	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	4,83	-		-	4,83	173,20	836,56	0,00	0,00	0,00	836,56	0,00
05.009.001.00	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m2	9,66	-		-	9,66	17,90	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00
05.009.001.00	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	9,66	-		-	9,66	42,81	413,54	0,00	0,00	0,00	413,54	0,00
05.009.001.00	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m2	3,35	-		-	3,35	889,54	2.979,96	0,00	0,00	0,00	2.979,96	0,00
05.009.001.00	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	9,66	-		-	9,66	26,33	254,35	0,00	0,00	0,00	254,35	0,00
05.009.001.00	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024	m2	9,66	-		-	9,66	30,45	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
05.009.002	DIVERSOS							8.904,30	0,00	0,00	0,00	8.904,30	0,00	
05.009.002.00	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m2	10,01	-	-	10,01	889,54	8.904,30	0,00	0,00	0,00	8.904,30	0,00	
05.010	ACABAMENTOS - PEITORIS							13.014,08	0,00	0,00	0,00	13.014,08	0,00	
05.010.001	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m2	12,76	-	-	12,76	889,54	11.350,53	0,00	0,00	0,00	11.350,53	0,00	
05.010.002	Assentamento de peitoril	m	75,07	-	-	75,07	22,16	1.663,55	0,00	0,00	0,00	1.663,55	0,00	
06	FORROS							38.023,84	0,00	0,00	0,00	38.023,84	0,00	
06.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	542,81	-	-	542,81	70,05	38.023,84	0,00	0,00	0,00	38.023,84	0,00	
07	PINTURAS INTERNAS							63.331,41	0,00	0,00	0,00	63.331,41	0,00	
07.001	PAVIMENTO TERREO							7.907,74	0,00	0,00	0,00	7.907,74	0,00	
07.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	150,94	-	-	150,94	9,77	1.474,68	0,00	0,00	0,00	1.474,68	0,00	
07.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	150,94	-	-	150,94	26,33	3.974,25	0,00	0,00	0,00	3.974,25	0,00	
07.001.003	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	150,94	-	-	150,94	16,29	2.458,81	0,00	0,00	0,00	2.458,81	0,00	
07.002	PAVIMENTO SUPERIOR							6.340,76	0,00	0,00	0,00	6.340,76	0,00	
07.002.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	121,03	-	-	121,03	9,77	1.182,46	0,00	0,00	0,00	1.182,46	0,00	
07.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	121,03	-	-	121,03	26,33	3.186,72	0,00	0,00	0,00	3.186,72	0,00	
07.002.003	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	121,03	-	-	121,03	16,29	1.971,58	0,00	0,00	0,00	1.971,58	0,00	
07.003	PINTURA DE FORRO E TETOS							42.872,56	0,00	0,00	0,00	42.872,56	0,00	
07.003.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	646,45	-	-	646,45	9,77	6.315,82	0,00	0,00	0,00	6.315,82	0,00	
07.003.002	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	646,45	-	-	646,45	37,41	24.183,69	0,00	0,00	0,00	24.183,69	0,00	
07.003.003	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	m2	646,45	-	-	646,45	19,14	12.373,05	0,00	0,00	0,00	12.373,05	0,00	
07.004	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA							6.210,35	0,00	0,00	0,00	6.210,35	0,00	
07.004.001	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	170,10	-	-	170,10	36,51	6.210,35	0,00	0,00	0,00	6.210,35	0,00	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							648.951,12	0,00	0,00	0,00	648.951,12	0,00	
08.001	PADRÃO DE ENTRADA E QD 01 - QGBT - PAV. TERRÉO							36.778,74	0,00	0,00	0,00	36.778,74	0,00	
08.001.001	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-	-	1,00	1.308,73	1.308,73	0,00	0,00	0,00	1.308,73	0,00	
08.001.002	Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	1,00	-	-	1,00	179,49	179,49	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	
08.001.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	12,00	-	-	12,00	52,99	635,88	0,00	0,00	0,00	635,88	0,00	
08.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	2,00	-	-	2,00	60,78	121,56	0,00	0,00	0,00	121,56	0,00	
08.001.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	4,00	-	-	4,00	20,42	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	
08.001.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	20,00	-	-	20,00	52,99	1.059,80	0,00	0,00	0,00	1.059,80	0,00	

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031695
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.001.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	7,00	-		-	7,00	20,42	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94	0,00
08.001.008	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	150,00	-		-	150,00	143,74	21.561,00	0,00	0,00	0,00	21.561,00	0,00
08.001.009	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	40,00	-		-	40,00	76,82	3.072,80	0,00	0,00	0,00	3.072,80	0,00
08.001.010	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	1,00	-		-	1,00	3.114,37	3.114,37	0,00	0,00	0,00	3.114,37	0,00
08.001.011	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	-		-	2,00	714,84	1.429,68	0,00	0,00	0,00	1.429,68	0,00
08.001.012	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	-		-	3,00	23,15	69,45	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00
08.001.013	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	-		-	3,00	156,56	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00
08.001.014	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1,00	1.442,42	1.442,42	0,00	0,00	0,00	1.442,42	0,00
08.001.015	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	-		-	4,00	13,05	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
08.001.016	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	7,00	-		-	7,00	21,99	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93	0,00
08.001.017	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	8,00	-		-	8,00	63,81	510,48	0,00	0,00	0,00	510,48	0,00
08.001.018	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	-		-	1,00	896,42	896,42	0,00	0,00	0,00	896,42	0,00
08.001.019	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	-		-	1,00	476,23	476,23	0,00	0,00	0,00	476,23	0,00
08.002	QD 02 - PAV. TERREO								18.644,42	0,00	0,00	0,00	18.644,42	0,00
08.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1,00	2.882,35	2.882,35	0,00	0,00	0,00	2.882,35	0,00
08.002.002	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	-		-	1,00	896,42	896,42	0,00	0,00	0,00	896,42	0,00
08.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	30,00	-		-	30,00	37,41	1.122,30	0,00	0,00	0,00	1.122,30	0,00
08.002.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	10,00	-		-	10,00	8,97	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
08.002.005	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00	-		-	120,00	76,82	9.218,40	0,00	0,00	0,00	9.218,40	0,00
08.002.006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	m	40,00	-		-	40,00	54,64	2.185,60	0,00	0,00	0,00	2.185,60	0,00
08.002.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-		-	1,00	23,15	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00
08.002.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	-		-	1,00	156,56	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	0,00
08.002.009	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	26,00	-		-	26,00	63,81	1.659,06	0,00	0,00	0,00	1.659,06	0,00

José Arnaldo de M. Pereira Junior
 Eng. Civil - CREA - 2721031855
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Página 8 de 21

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Eng. Civil - CREA/SE 2709362440

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					CONTRATO Nº: 004/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026					CONTRATO DE REPASSE:	
								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.002.010	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	-		-	2,00	66,23	132,46	0,00	0,00	0,00	132,46	0,00
08.002.011	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	-		-	1,00	120,74	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00
08.002.012	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	61,91	0,00
08.002.013	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00
08.003	QD 03 - PAVIMENTO SUPERIOR								17.833,60	0,00	0,00	0,00	17.833,60	0,00
08.003.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1,00	2.882,35	2.882,35	0,00	0,00	0,00	2.882,35	0,00
08.003.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	-		-	1,00	476,23	476,23	0,00	0,00	0,00	476,23	0,00
08.003.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	50,00	-		-	50,00	28,78	1.439,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00
08.003.004	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	220,00	-		-	220,00	55,15	12.133,00	0,00	0,00	0,00	12.133,00	0,00
08.003.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-		-	1,00	23,15	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00
08.003.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	-		-	1,00	156,56	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	0,00
08.003.007	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	61,91	0,00
08.003.008	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	-		-	2,00	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00
08.003.009	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	9,00	-		-	9,00	24,46	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14	0,00
08.003.010	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	4,00	-		-	4,00	58,82	235,28	0,00	0,00	0,00	235,28	0,00
08.003.011	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00
08.003.012	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	-		-	1,00	66,23	66,23	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00
08.004	PONTOS DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTOR, TOMADAS 10 A, TOMADAS 20A, LUMINÁRIAS								201.459,09	0,00	0,00	0,00	201.459,09	0,00
08.004.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	197,00	-		-	197,00	299,37	58.975,89	0,00	0,00	0,00	58.975,89	0,00
08.004.002	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	2,00	-		-	2,00	79,97	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94	0,00
08.004.003	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	83,00	-		-	83,00	96,03	7.970,49	0,00	0,00	0,00	7.970,49	0,00
08.004.004	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	84,00	-		-	84,00	30,48	2.560,32	0,00	0,00	0,00	2.560,32	0,00
08.004.005	Arandela de parede 1 facho, para Lâmpada palito de led, estrutura em alumínio, branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ou similar	un	18,00	-		-	18,00	286,51	5.157,18	0,00	0,00	0,00	5.157,18	0,00

Jose Arnaldo de M. Perreira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031895
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.004.006	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	-		-	8,00	91,48	731,84	0,00	0,00	0,00	731,84	0,00
08.004.007	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	259,00	-		-	259,00	306,75	79.448,25	0,00	0,00	0,00	79.448,25	0,00
08.004.008	Tomada 2p+t 20a 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	36,00	-		-	36,00	12,35	444,60	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00
08.004.009	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	31,00	-		-	31,00	401,08	12.433,48	0,00	0,00	0,00	12.433,48	0,00
08.004.010	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00	-		-	2,00	315,82	631,64	0,00	0,00	0,00	631,64	0,00
08.004.011	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01	m	3,00	-		-	3,00	711,96	2.135,88	0,00	0,00	0,00	2.135,88	0,00
08.004.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	250,00	-		-	250,00	11,88	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
08.004.013	Tomada 2p+t 20a 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	3,00	-		-	3,00	12,35	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00
08.004.014	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6,00	-		-	6,00	351,42	2.108,52	0,00	0,00	0,00	2.108,52	0,00
08.004.015	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	400,00	-		-	400,00	11,88	4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00
08.004.016	Tomada 2p+t 20a 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	6,00	-		-	6,00	12,35	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00
08.004.017	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar	un	3,00	-		-	3,00	31,23	93,69	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00
08.004.018	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	1,00	-		-	1,00	60,82	60,82	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00
08.004.019	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	34,00	-		-	34,00	253,92	8.633,28	0,00	0,00	0,00	8.633,28	0,00
08.004.020	Ponto de interruptor 03 seções (3 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	pt	31,00	-		-	31,00	334,37	10.365,47	0,00	0,00	0,00	10.365,47	0,00
08.004.021	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00	-		-	5,00	258,87	1.294,35	0,00	0,00	0,00	1.294,35	0,00
08.004.022	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	9,00	-		-	9,00	38,05	342,45	0,00	0,00	0,00	342,45	0,00
08.004.023	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	9,00	-		-	9,00	8,65	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00
08.005	GRUPO GERADOR								55.593,01	0,00	0,00	0,00	55.593,01	0,00
08.005.001	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55kVA com quadro automático, banco de baterias, tanque de óleo diesel - completo	un	1,00	-		-	1,00	55.593,01	55.593,01	0,00	0,00	0,00	55.593,01	0,00
08.006	LÓGICA								25.911,36	0,00	0,00	0,00	25.911,36	0,00
08.006.001	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	2,00	-		-	2,00	554,04	1.108,08	0,00	0,00	0,00	1.108,08	0,00
08.006.002	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	29,00	-		-	29,00	216,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.006.003	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	43,00	-		-	43,00	226,45	9.737,35	0,00	0,00	0,00	9.737,35	0,00
08.006.004	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	37,00	-		-	37,00	237,89	8.801,93	0,00	0,00	0,00	8.801,93	0,00
08.007	AR-CONDICIONADOS								171.661,70	0,00	0,00	0,00	171.661,70	0,00
08.007.001	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	m	310,00	-		-	310,00	7,81	2.421,10	0,00	0,00	0,00	2.421,10	0,00
08.007.002	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	310,00	-		-	310,00	7,55	2.340,50	0,00	0,00	0,00	2.340,50	0,00
08.007.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	m	310,00	-		-	310,00	31,73	9.836,30	0,00	0,00	0,00	9.836,30	0,00
08.007.004	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	310,00	-		-	310,00	58,83	18.237,30	0,00	0,00	0,00	18.237,30	0,00
08.007.005	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	620,00	-		-	620,00	8,71	5.400,20	0,00	0,00	0,00	5.400,20	0,00
08.007.006	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	620,00	-		-	620,00	6,20	3.844,00	0,00	0,00	0,00	3.844,00	0,00
08.007.007	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	4,00	-		-	4,00	2.874,13	11.496,52	0,00	0,00	0,00	11.496,52	0,00
08.007.008	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	1,00	-		-	1,00	5.722,87	5.722,87	0,00	0,00	0,00	5.722,87	0,00
08.007.009	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	21,00	-		-	21,00	2.410,86	50.628,06	0,00	0,00	0,00	50.628,06	0,00
08.007.010	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 36000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	1,00	-		-	1,00	11.937,09	11.937,09	0,00	0,00	0,00	11.937,09	0,00
08.007.011	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 18000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	2,00	-		-	2,00	6.600,16	13.200,32	0,00	0,00	0,00	13.200,32	0,00
08.007.012	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 60000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	2,00	-		-	2,00	14.238,87	28.477,74	0,00	0,00	0,00	28.477,74	0,00
08.007.013	Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 24000 btu/h - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	1,00	-		-	1,00	8.119,70	8.119,70	0,00	0,00	0,00	8.119,70	0,00
08.008	ENERGIA SOLAR								121.069,20	0,00	0,00	0,00	121.069,20	0,00
08.008.001	Fornecimento e Instalação de Energia Solar Fotovoltaica, com 73 módulos de pot. 600wp, inversor com pot. 36.000w, 2 stringbox de proteção.Pot. total min do sistema = 43,80 kw - vida útil min 25 anos - (Souto Diniz -	und	1,00	-		-	1,00	121.069,20	121.069,20	0,00	0,00	0,00	121.069,20	0,00
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM								152.741,94	0,00	0,00	0,00	152.741,94	0,00
09.001	SISTEMA DE TRATAMENTO								8.567,18	0,00	0,00	0,00	8.567,18	0,00
09.001.001	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	-		-	1,00	3.010,20	3.010,20	0,00	0,00	0,00	3.010,20	0,00
09.001.002	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	-		-	1,00	5.556,98	5.556,98	0,00	0,00	0,00	5.556,98	0,00
09.002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								21.525,84	0,00	0,00	0,00	21.525,84	0,00
09.002.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	75,00	-		-	75,00	147,59	11.069,25	0,00	0,00	0,00	11.069,25	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.002.002	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	497,00	-	-	497,00	8,71	4.328,87	0,00	0,00	0,00	4.328,87	0,00	
09.002.003	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00	-	-	2,00	1.523,16	3.046,32	0,00	0,00	0,00	3.046,32	0,00	
09.002.004	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	497,00	-	-	497,00	6,20	3.081,40	0,00	0,00	0,00	3.081,40	0,00	
09.003	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							22.113,45	0,00	0,00	0,00	22.113,45	0,00	
09.003.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	65,00	-	-	65,00	93,22	6.059,30	0,00	0,00	0,00	6.059,30	0,00	
09.003.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	17,00	-	-	17,00	132,58	2.253,86	0,00	0,00	0,00	2.253,86	0,00	
09.003.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	17,00	-	-	17,00	128,37	2.182,29	0,00	0,00	0,00	2.182,29	0,00	
09.003.004	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	-	-	1,00	508,91	508,91	0,00	0,00	0,00	508,91	0,00	
09.003.005	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	5,00	-	-	5,00	410,08	2.050,40	0,00	0,00	0,00	2.050,40	0,00	
09.003.006	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	31,00	-	-	31,00	63,49	1.968,19	0,00	0,00	0,00	1.968,19	0,00	
09.003.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	150,00	-	-	150,00	47,27	7.090,50	0,00	0,00	0,00	7.090,50	0,00	
09.004	DRENAGEM							18.600,34	0,00	0,00	0,00	18.600,34	0,00	
09.004.001	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	5,00	-	-	5,00	410,08	2.050,40	0,00	0,00	0,00	2.050,40	0,00	
09.004.002	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	55,00	-	-	55,00	60,15	3.308,25	0,00	0,00	0,00	3.308,25	0,00	
09.004.003	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm	m	30,00	-	-	30,00	32,43	972,90	0,00	0,00	0,00	972,90	0,00	
09.004.004	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	12,00	-	-	12,00	23,88	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	0,00	
09.004.005	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	7,00	-	-	7,00	22,64	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48	0,00	
09.004.006	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	5,00	-	-	5,00	16,73	83,65	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	
09.004.007	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	10,00	-	-	10,00	35,48	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80	0,00	
09.004.008	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	m	310,00	-	-	310,00	20,42	6.330,20	0,00	0,00	0,00	6.330,20	0,00	
09.004.009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	25,00	-	-	25,00	8,41	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25	0,00	
09.004.010	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	25,00	-	-	25,00	8,91	222,75	0,00	0,00	0,00	222,75	0,00	
09.004.011	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	310,00	-	-	310,00	8,71	2.700,10	0,00	0,00	0,00	2.700,10	0,00	
09.004.012	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	310,00	-	-	310,00	6,20	1.922,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	
09.005	INSTALAÇÃO DE GÁS							5.297,61	0,00	0,00	0,00	5.297,61	0,00	

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.005.001	Tubo, pex, multicamada, dn 16, instalado em ramal interno de instalações de gás - fornecimento e instalação. af_01/2020	m	30,00	-		-	30,00	18,25	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50	0,00
09.005.002	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	-		-	1,00	43,76	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00
09.005.003	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	un	1,00	-		-	1,00	84,25	84,25	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00
09.005.004	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	310,00	-		-	310,00	8,71	2.700,10	0,00	0,00	0,00	2.700,10	0,00
09.005.005	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	310,00	-		-	310,00	6,20	1.922,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00
09.006	INSTALAÇÕES COMBATE E INCÊNCIO E PÂNICO								20.137,20	0,00	0,00	0,00	20.137,20	0,00
09.006.001	Placa de sinalizacao de segurancra contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	20,00	-		-	20,00	14,82	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00
09.006.002	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	10,00	-		-	10,00	286,38	2.863,80	0,00	0,00	0,00	2.863,80	0,00
09.006.003	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	30,00	-		-	30,00	17,41	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30	0,00
09.006.004	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30,00	-		-	30,00	280,11	8.403,30	0,00	0,00	0,00	8.403,30	0,00
09.006.005	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	540,00	-		-	540,00	8,71	4.703,40	0,00	0,00	0,00	4.703,40	0,00
09.006.006	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	540,00	-		-	540,00	6,20	3.348,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00
09.007	LOUÇAS E METAIS								56.500,32	0,00	0,00	0,00	56.500,32	0,00
09.007.001	WC PNE								21.798,51	0,00	0,00	0,00	21.798,51	0,00
09.007.001.00 1	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e	un	7,00	-		-	7,00	884,09	6.188,63	0,00	0,00	0,00	6.188,63	0,00
09.007.001.00 2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	7,00	-		-	7,00	26,94	188,58	0,00	0,00	0,00	188,58	0,00
09.007.001.00 3	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	7,00	-		-	7,00	166,09	1.162,63	0,00	0,00	0,00	1.162,63	0,00
09.007.001.00 4	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	7,00	-		-	7,00	512,22	3.585,54	0,00	0,00	0,00	3.585,54	0,00
09.007.001.00 5	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	-		-	4,00	867,20	3.468,80	0,00	0,00	0,00	3.468,80	0,00
09.007.001.00 6	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	-		-	7,00	270,91	1.896,37	0,00	0,00	0,00	1.896,37	0,00
09.007.001.00 7	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	-		-	7,00	270,91	1.896,37	0,00	0,00	0,00	1.896,37	0,00
09.007.001.00 8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	-		-	7,00	132,55	927,85	0,00	0,00	0,00	927,85	0,00

Assinatura
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA 2721031695
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.007.001.009	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar	un	7,00	-		-	7,00	157,25	1.100,75	0,00	0,00	0,00	1.100,75	0,00
09.007.001.010	Dispenser para sabonete líquido	un	7,00	-		-	7,00	45,28	316,96	0,00	0,00	0,00	316,96	0,00
09.007.001.011	Dispenser para toalha interfolhada	un	7,00	-		-	7,00	66,28	463,96	0,00	0,00	0,00	463,96	0,00
09.007.001.012	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	7,00	-		-	7,00	86,01	602,07	0,00	0,00	0,00	602,07	0,00
09.007.002	SANITÁRIOS								2.910,18	0,00	0,00	0,00	2.910,18	0,00
09.007.002.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	552,27	1.104,54	0,00	0,00	0,00	1.104,54	0,00
09.007.002.002	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2,00	-		-	2,00	26,94	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88	0,00
09.007.002.003	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	166,09	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00
09.007.002.004	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	2,00	-		-	2,00	512,22	1.024,44	0,00	0,00	0,00	1.024,44	0,00
09.007.002.005	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00	-		-	2,00	45,28	90,56	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00
09.007.002.006	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00	-		-	2,00	66,28	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56	0,00
09.007.002.007	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2,00	-		-	2,00	86,01	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
09.007.003	VESTIÁRIOS								4.032,02	0,00	0,00	0,00	4.032,02	0,00
09.007.003.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	552,27	1.104,54	0,00	0,00	0,00	1.104,54	0,00
09.007.003.002	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2,00	-		-	2,00	26,94	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88	0,00
09.007.003.003	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	166,09	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00
09.007.003.004	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	2,00	-		-	2,00	512,22	1.024,44	0,00	0,00	0,00	1.024,44	0,00
09.007.003.005	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	-		-	1,00	867,20	867,20	0,00	0,00	0,00	867,20	0,00
09.007.003.006	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00	-		-	2,00	45,28	90,56	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00
09.007.003.007	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00	-		-	2,00	66,28	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56	0,00
09.007.003.008	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2,00	-		-	2,00	86,01	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
09.007.003.009	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	127,32	254,64	0,00	0,00	0,00	254,64	0,00
09.007.004	LAVABOS								5.820,36	0,00	0,00	0,00	5.820,36	0,00
09.007.004.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	-		-	4,00	552,27	2.209,08	0,00	0,00	0,00	2.209,08	0,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior:
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:			
								Data de medição: 26/05/2026							
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								VALORES R\$							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido	
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período									
			4,00	-		-	4,00	26,94	107,76	0,00	0,00	0,00	107,76	0,00	
09.007.004.002	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4,00	-		-	4,00	512,22	2.048,88	0,00	0,00	0,00	2.048,88	0,00	
09.007.004.003	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	4,00	-		-	4,00	166,09	664,36	0,00	0,00	0,00	664,36	0,00	
09.007.004.004	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	-		-	4,00	45,28	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12	0,00	
09.007.004.005	Dispenser para sabonete líquido	un	4,00	-		-	4,00	66,28	265,12	0,00	0,00	0,00	265,12	0,00	
09.007.004.006	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00	-		-	4,00	86,01	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	
09.007.004.007	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4,00	-		-	4,00		21.432,06	0,00	0,00	0,00	21.432,06	0,00	
09.007.005	CONSULTÓRIOS E DEMAIS SALAS								3.155,71	0,00	0,00	0,00	3.155,71	0,00	
09.007.005.001	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	19,00	-		-	19,00	166,09							
09.007.005.002	Dispenser para sabonete líquido	un	30,00	-		-	30,00	45,28	1.358,40	0,00	0,00	0,00	1.358,40	0,00	
09.007.005.003	Dispenser para toalha interfolhada	un	30,00	-		-	30,00	66,28	1.988,40	0,00	0,00	0,00	1.988,40	0,00	
09.007.005.004	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	4,00	-		-	4,00	1.272,09	5.088,36	0,00	0,00	0,00	5.088,36	0,00	
09.007.005.005	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	4,00	-		-	4,00	1.261,70	5.046,80	0,00	0,00	0,00	5.046,80	0,00	
09.007.005.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	3,00	-		-	3,00	1.598,13	4.794,39	0,00	0,00	0,00	4.794,39	0,00	
09.007.006	ÁREA DE SERVIÇO								507,19	0,00	0,00	0,00	507,19	0,00	
09.007.006.001	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	1,00	-		-	1,00	507,19	507,19	0,00	0,00	0,00	507,19	0,00	
10	ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS								211.383,81	0,00	0,00	0,00	211.383,81	0,00	
10.001	PORTAS								112.727,14	0,00	0,00	0,00	112.727,14	0,00	
10.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	20,00	-		-	20,00	2.149,82	42.996,40	0,00	0,00	0,00	42.996,40	0,00	
10.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	18,00	-		-	18,00	2.370,95	42.677,10	0,00	0,00	0,00	42.677,10	0,00	
10.001.003	Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0,90 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01	un	7,00	-		-	7,00	2.047,59	14.333,13	0,00	0,00	0,00	14.333,13	0,00	
10.001.004	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	4,00	-		-	4,00	495,98	1.983,92	0,00	0,00	0,00	1.983,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2121031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
10.001.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	6,72	-	-	6,72	363,45	2.442,38	0,00	0,00	0,00	2.442,38	0,00	
10.001.006	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	3,50	-	-	3,50	1.250,48	4.376,68	0,00	0,00	0,00	4.376,68	0,00	
10.001.007	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	3,60	-	-	3,60	473,74	1.705,46	0,00	0,00	0,00	1.705,46	0,00	
10.001.008	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	4,46	-	-	4,46	495,98	2.212,07	0,00	0,00	0,00	2.212,07	0,00	
10.002	JANELAS							98.656,67	0,00	0,00	0,00	98.656,67	0,00	
10.002.001	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	51,37	-	-	51,37	447,46	22.986,02	0,00	0,00	0,00	22.986,02	0,00	
10.002.002	Vidro laminado 6mm (3+3mm) reflecta	m2	49,87	-	-	49,87	819,07	40.847,02	0,00	0,00	0,00	40.847,02	0,00	
10.002.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	1,50	-	-	1,50	247,08	370,62	0,00	0,00	0,00	370,62	0,00	
10.002.004	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	m2	30,41	-	-	30,41	1.132,95	34.453,01	0,00	0,00	0,00	34.453,01	0,00	
11	ELEVADOR							148.908,41	0,00	0,00	0,00	148.908,41	0,00	
11.001	ESTRUTURA							8.958,86	0,00	0,00	0,00	8.958,86	0,00	
11.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,60	-	-	5,60	64,02	358,51	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	
11.001.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	2,24	-	-	2,24	5,89	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	
11.001.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,22	-	-	0,22	723,26	159,12	0,00	0,00	0,00	159,12	0,00	
11.001.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	kg	324,00	-	-	324,00	13,77	4.461,48	0,00	0,00	0,00	4.461,48	0,00	
11.001.005	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m2	5,18	-	-	5,18	114,81	594,72	0,00	0,00	0,00	594,72	0,00	
11.001.006	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m3	3,24	-	-	3,24	1.040,69	3.371,84	0,00	0,00	0,00	3.371,84	0,00	
11.002	REFORÇO - ESTRUTURA EXISTENTE							8.116,09	0,00	0,00	0,00	8.116,09	0,00	
11.002.001	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	kg	312,00	-	-	312,00	13,77	4.296,24	0,00	0,00	0,00	4.296,24	0,00	
11.002.002	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m2	4,99	-	-	4,99	114,81	572,90	0,00	0,00	0,00	572,90	0,00	
11.002.003	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m3	3,12	-	-	3,12	1.040,69	3.246,95	0,00	0,00	0,00	3.246,95	0,00	
11.003	APARELHAGEM							131.833,46	0,00	0,00	0,00	131.833,46	0,00	

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
11.003.001	Elevador panorâmico para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1,45 x 1,6m, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar	un	1,00	-		-	1,00	131.833,46	131.833,46	0,00	0,00	0,00	131.833,46	0,00
12	CASA DE LIXO E COMPRESSORES								15.821,15	0,00	0,00	0,00	15.821,15	0,00
12.001	CASA DE LIXO								12.458,66	0,00	0,00	0,00	12.458,66	0,00
12.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,11	-		-	2,11	64,02	135,08	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00
12.001.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	4,22	-		-	4,22	5,89	24,86	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00
12.001.003	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	2,11	-		-	2,11	645,68	1.362,38	0,00	0,00	0,00	1.362,38	0,00
12.001.004	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m2	0,76	-		-	0,76	114,81	87,26	0,00	0,00	0,00	87,26	0,00
12.001.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	kg	48,00	-		-	48,00	13,77	660,96	0,00	0,00	0,00	660,96	0,00
12.001.006	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	8,43	-		-	8,43	79,55	670,61	0,00	0,00	0,00	670,61	0,00
12.001.007	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m3	0,48	-		-	0,48	1.040,69	499,53	0,00	0,00	0,00	499,53	0,00
12.001.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	22,42	-		-	22,42	61,58	1.380,62	0,00	0,00	0,00	1.380,62	0,00
12.001.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	46,84	-		-	46,84	8,17	382,68	0,00	0,00	0,00	382,68	0,00
12.001.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	46,84	-		-	46,84	42,81	2.005,22	0,00	0,00	0,00	2.005,22	0,00
12.001.011	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	13,19	-		-	13,19	9,77	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87	0,00
12.001.012	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	13,19	-		-	13,19	26,33	347,29	0,00	0,00	0,00	347,29	0,00
12.001.013	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	13,19	-		-	13,19	16,29	214,87	0,00	0,00	0,00	214,87	0,00
12.001.014	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe	m2	25,28	-		-	25,28	153,45	3.879,22	0,00	0,00	0,00	3.879,22	0,00
12.001.015	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiro 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	2,90	-		-	2,90	234,21	679,21	0,00	0,00	0,00	679,21	0,00
12.002	COMPRESSORES								3.362,49	0,00	0,00	0,00	3.362,49	0,00
12.002.001	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	3,20	-		-	3,20	79,55	254,56	0,00	0,00	0,00	254,56	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
12.002.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	4,16	-		-	4,16	61,58	256,17	0,00	0,00	0,00	256,17	0,00
12.002.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	8,32	-		-	8,32	8,17	67,97	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00
12.002.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,32	-		-	8,32	42,81	356,18	0,00	0,00	0,00	356,18	0,00
12.002.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	8,32	-		-	8,32	26,33	219,07	0,00	0,00	0,00	219,07	0,00
12.002.006	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	8,32	-		-	8,32	16,29	135,53	0,00	0,00	0,00	135,53	0,00
12.002.007	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe	m2	8,32	-		-	8,32	153,45	1.276,70	0,00	0,00	0,00	1.276,70	0,00
12.002.008	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	3,40	-		-	3,40	234,21	796,31	0,00	0,00	0,00	796,31	0,00
									100.371,64	0,00	0,00	0,00	100.371,64	0,00
13	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES								7.357,93	0,00	0,00	0,00	7.357,93	0,00
13.001	COBERTURA								1.046,13	0,00	0,00	0,00	1.046,13	0,00
13.001.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	13,70	-		-	13,70	76,36	1.046,13	0,00	0,00	0,00	1.046,13	0,00
13.001.002	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03	m2	13,70	-		-	13,70	176,64	2.419,97	0,00	0,00	0,00	2.419,97	0,00
13.001.003	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	3,86	-		-	3,86	164,89	636,48	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00
13.001.004	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	10,93	-		-	10,93	177,26	1.937,45	0,00	0,00	0,00	1.937,45	0,00
13.001.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	30,00	-		-	30,00	43,93	1.317,90	0,00	0,00	0,00	1.317,90	0,00
13.002	IMPERMEABILIZAÇÕES								93.013,71	0,00	0,00	0,00	93.013,71	0,00
13.002.001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	m2	301,64	-		-	301,64	308,36	93.013,71	0,00	0,00	0,00	93.013,71	0,00
									282.324,18	0,00	0,00	0,00	282.324,18	0,00
14	FACHADA								2.813,25	0,00	0,00	0,00	2.813,25	0,00
14.001	DEMOLIÇÕES								1.001,92	0,00	0,00	0,00	1.001,92	0,00
14.001.001	Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras	m2	145,84	-		-	145,84	6,87	1.001,92	0,00	0,00	0,00	1.001,92	0,00
14.001.002	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	145,84	-		-	145,84	12,42	1.811,33	0,00	0,00	0,00	1.811,33	0,00
									37.521,21	0,00	0,00	0,00	37.521,21	0,00
14.002	ACESSO								270,80	0,00	0,00	0,00	270,80	0,00
14.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,23	-		-	4,23	64,02	270,80	0,00	0,00	0,00	270,80	0,00
14.002.002	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	17,56	-		-	17,56	645,68	11.338,14	0,00	0,00	0,00	11.338,14	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.002.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	19,73	-		-	19,73	18,90	372,90	0,00	0,00	0,00	372,90	0,00
14.002.004	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	34,02	-		-	34,02	723,26	24.605,31	0,00	0,00	0,00	24.605,31	0,00
14.002.005	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	18,76	-		-	18,76	49,79	934,06	0,00	0,00	0,00	934,06	0,00
14.003	ACESSIBILIDADE								4.909,66	0,00	0,00	0,00	4.909,66	0,00
14.003.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3,00	-		-	3,00	574,34	1.723,02	0,00	0,00	0,00	1.723,02	0,00
14.003.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	17,51	-		-	17,51	181,99	3.186,64	0,00	0,00	0,00	3.186,64	0,00
14.004	PAVIMENTAÇÕES								17.542,62	0,00	0,00	0,00	17.542,62	0,00
14.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,10	-		-	1,10	64,02	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00
14.004.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	0,55	-		-	0,55	130,03	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00
14.004.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	49,00	-		-	49,00	49,79	2.439,71	0,00	0,00	0,00	2.439,71	0,00
14.004.004	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	93,35	-		-	93,35	135,73	12.670,40	0,00	0,00	0,00	12.670,40	0,00
14.004.005	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	34,02	-		-	34,02	67,33	2.290,57	0,00	0,00	0,00	2.290,57	0,00
14.005	CIRCULAÇÕES EXTERNAS								30.370,98	0,00	0,00	0,00	30.370,98	0,00
14.005.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	36,32	-		-	36,32	723,26	26.268,80	0,00	0,00	0,00	26.268,80	0,00
14.005.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	36,32	-		-	36,32	67,33	2.445,43	0,00	0,00	0,00	2.445,43	0,00
14.005.003	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	31,36	-		-	31,36	10,04	314,85	0,00	0,00	0,00	314,85	0,00
14.005.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	31,36	-		-	31,36	26,33	825,71	0,00	0,00	0,00	825,71	0,00
14.005.005	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	31,36	-		-	31,36	16,46	516,19	0,00	0,00	0,00	516,19	0,00
14.006	ACABAMENTOS								184.356,17	0,00	0,00	0,00	184.356,17	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.006.001	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (máximo-ar/esq)	m2	56,30	-		-	56,30	1.704,85	95.983,05	0,00	0,00	0,00	95.983,05	0,00
14.006.002	Revestimento em Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro preto ou similar, exclusive regularização de base ou emboço (PEDRA IRREGULAR ALMOFADA, COR OURO PÁLIDO)	m2	42,09	-			42,09	195,76	8.239,54	0,00	0,00	0,00	8.239,54	0,00
14.006.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, acetinado, borda reta, linha Iseo Grigio, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (FILETTO CANELA)	m2	51,12	-		-	51,12	293,63	15.010,37	0,00	0,00	0,00	15.010,37	0,00
14.006.004	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	38,23	-		-	38,23	10,04	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83	0,00
14.006.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	38,23	-		-	38,23	26,33	1.006,60	0,00	0,00	0,00	1.006,60	0,00
14.006.006	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 (TEXTURA CRAQUEATO NOBRE CINZA)	m2	38,23	-		-	38,23	16,46	629,27	0,00	0,00	0,00	629,27	0,00
14.006.007	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	217,28	-		-	217,28	10,04	2.181,49	0,00	0,00	0,00	2.181,49	0,00
14.006.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	217,28	-		-	217,28	26,33	5.720,98	0,00	0,00	0,00	5.720,98	0,00
14.006.009	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	217,28	-		-	217,28	16,46	3.576,43	0,00	0,00	0,00	3.576,43	0,00
14.006.010	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	29,25	-		-	29,25	1.198,60	35.059,05	0,00	0,00	0,00	35.059,05	0,00
14.006.011	Execução completa de estrutura metálica espacial com cobertura metálica, revestimento em ACM e letreiro em PVC expandido, incluindo iluminação e pintura, destinada à fachada principal da UBS Dr. José Souto Diniz	und	1,00	-		-	1,00	15.331,80	15.331,80	0,00	0,00	0,00	15.331,80	0,00
14.006.012	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	8,00	-		-	8,00	154,22	1.233,76	0,00	0,00	0,00	1.233,76	0,00
14.007	PAISAGISMO								4.810,29	0,00	0,00	0,00	4.810,29	0,00
14.007.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	7,68	-		-	7,68	41,97	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33	0,00
14.007.002	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e	un	4,00	-		-	4,00	1.019,49	4.077,96	0,00	0,00	0,00	4.077,96	0,00
14.007.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	10,00	-		-	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
15	DIVERSOS								82.133,13	0,00	0,00	0,00	82.133,13	0,00
15.001	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	33,06	-		-	33,06	1.198,60	39.625,72	0,00	0,00	0,00	39.625,72	0,00
15.002	Escada marinho em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	8,00	-		-	8,00	400,18	3.201,44	0,00	0,00	0,00	3.201,44	0,00
15.003	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	2,00	-		-	2,00	2.728,52	5.457,04	0,00	0,00	0,00	5.457,04	0,00
15.004	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	2,00	-		-	2,00	6.063,21	12.126,42	0,00	0,00	0,00	12.126,42	0,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ								BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				CONTRATO Nº: 004/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2026 à 31/03/2026				CONTRATO DE REPASSE:		
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA								Data de medição: 26/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumula do Anterior	Do Período	Acumula do até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
15.005	Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 - Rev. 01	m	8,00	-		-	8,00	319,41	2.555,28	0,00	0,00	0,00	2.555,28	0,00
15.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-		-	1,00	2.628,35	2.628,35	0,00	0,00	0,00	2.628,35	0,00
15.007	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	21,25	-		-	21,25	778,30	16.538,88	0,00	0,00	0,00	16.538,88	0,00
16	SERVIÇOS FINAIS								3.124,84	0,00	0,00	0,00	3.124,84	0,00
16.001	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	98,00	-		-	98,00	3,58	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84	0,00
16.002	Limpeza geral	m2	912,50	-		-	912,50	3,04	2.774,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00	0,00
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								141.442,55	2.560,11	6.266,04	8.826,15	132.616,40	6,24
17.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	330,00	5,9730	14,6199	20,5929	309,4071	158,03	52.149,90	943,91	2.310,38	3.254,29	48.895,61	6,24
17.002	Mestre de obras com encargos complementares	mes	5,00	0,0905	0,2215	0,3120	4,6880	17.858,53	89.292,65	1.616,20	3.955,66	5.571,86	83.720,79	6,24
Total geral									R\$ 2.850.000,00	R\$ 51.640,87	R\$ 126.206,76	R\$ 177.847,63	R\$ 2.672.152,37	6,24
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:30892714590 Dados: 2026.05.26 08:05:06 -03'00'					Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__						
								Aprovado para pagamento Data: __/__/__						

Kelly Pinto Freire
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362449

José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA 2721031039
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ			MEMORIAL DE CALCULO BM 02		CONTRATO Nº 004/2026
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			Data de medição: 26/05/2026		CONTRATO DE REPASSE:
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE		
02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS				
02.002	Projeto de Fundações - Fundações rasas	m²	663,29	> ÁREA DA EDIFICAÇÃO = 663,29m²	
02.003	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	m²	663,29	> ÁREA DA EDIFICAÇÃO = 663,29m²	
02.004	Projeto Hidráulico - Edifícios Hospitalares e de Saúde	m²	663,29	> ÁREA DA EDIFICAÇÃO = 663,29m²	
02.005	Projeto Esgoto Sanitário - Edifícios Hospitalares e de Saúde	m²	663,29	> ÁREA DA EDIFICAÇÃO = 663,29m²	
03	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES				
03.001	ÁREA EXTERNA				
03.001.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	3,19	> 3,19 m³ x 100,00% = 3,19 m³	
03.001.010	Coleta e carga manuais de entulho	m³	4,15	> 3,19 m³ x 1,30 = 4,15 m³	
03.001.011	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	311,25	> 4,15 m³ x 1,50 t/m³ x 50,00 km = 311,25 tkm	
03.003	PAVIMENTO TÉRREO				
03.003.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	20,01	> 20,01 m³ x 100,00% = 20,01 m³	
03.003.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	70,24	> 351,21 m² x 90,00% = 316,09 m² - 245,85 m² (Medição Anterior) = 70,24 m²	
03.003.003	Demolição de piso de alta resistência	m²	30,17	> 301,70 m² x 10,00% = 30,17 m²	
03.003.004	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	1,96	> 19,67 m² x 90,00% = 17,70 m² - 15,74 m² (Medição Anterior) = 1,96 m²	
03.003.005	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m²	4,53	> 45,36 m² x 90,00% = 40,82 m² - 36,29 m² (Medição Anterior) = 4,53 m²	
03.003.007	Remoção de pia	m²	2,00	> 0,50 m x 4,00 m = 2,00 m²	
03.003.012	Coleta e carga manuais de entulho	m³	62,77	> 69,74 m³ x 90,00% = 62,77 m³	
03.003.013	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.707,00	> 5.230,00 tkm x 90,00% = 4.707,00 tkm	
03.004	PAVIMENTO SUPERIOR				
03.004.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	10,03	> 10,03 m³ x 100,00% = 10,03 m³	
03.004.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	49,14	> 245,71 m² x 100,00 % = 245,71 m² - 196,57 m² (Medição Anterior) = 49,14 m²	
03.004.008	Demolição de concreto manualmente	m³	7,83	> (28,24 + 22,53 - 4,53) x (0,10 x 0,25 + 0,07 x 0,45) x 3 = 7,83 m³	
04	ELEVAÇÕES				
04.001	TÉRREO				
04.001.002	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	24,87	> 24,87 m² x 100,00% = 24,87 m²	
04.001.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m²	142,81	> 204,01 m² x 70,00% = 142,81 m²	
04.001.005	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m²	285,62	> 408,02 m² x 70,00% = 285,62 m²	
04.001.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	285,62	> 408,02 m² x 70,00% = 285,62 m²	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031635
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ		MEMORIAL DE CALCULO BM 02		CONTRATO Nº 004/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA		Data de medição: 26/05/2026		CONTRATO DE REPASSE:	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE		
04.001.007	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	105,36	> 351,21 m² x 30,00% = 105,36 m²	
04.001.008	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	33,19	> 110,65 m x 30,00% = 33,19 m	
04.001.009	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	709,00	> 709,00 kg x 100,00% = 709,00 kg	
04.001.010	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	66,15	> 66,15 m² x 100,00% = 66,15 m²	
04.001.011	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	m3	7,09	> 7,09 m³ x 100,00% = 7,09 m³	
04.004	AMPLIAÇÃO				
04.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,00	> 14,00 m³ x 100,00% = 14,00 m³	
04.004.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	14,00	> 14,00 m² x 100,00% = 14,00 m²	
04.004.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	9,52	> 9,52 m³ x 100,00% = 9,52 m³	
04.004.004	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m2	78,03	> 156,05 m² x 50,00% = 78,03 m²	
04.004.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	kg	680,00	> 680,00 kg (Conforme projeto)	
04.004.006	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ARGOLAMENTO SUPERIOR)	m3	5,71	> 22,84 m³ x 25,00% = 5,71 m³	
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
17.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	14,6199	> (171.581,59 - 2.560,11) / (2.850.000,00 - 141.442,55) = 0,0624 x 330,00 h = 20,5929 h - 5,9730 h (Medição Anterior) = 14,6199 h	
17.002	Mestre de obras com encargos complementares	mes	0,2215	> (171.581,59 - 2.560,11) / (2.850.000,00 - 141.442,55) = 0,0624 x 5,00 mes = 0,3120 mes - 0,0905 mes (Medição Anterior) = 0,2215 mes	
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398		Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2026.05.26 08:37:28 -03'00' Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____			

José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721631833
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engº Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ


CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. Nº. 02/2026

CONTRATO Nº 004/2026


ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 22/01/2026

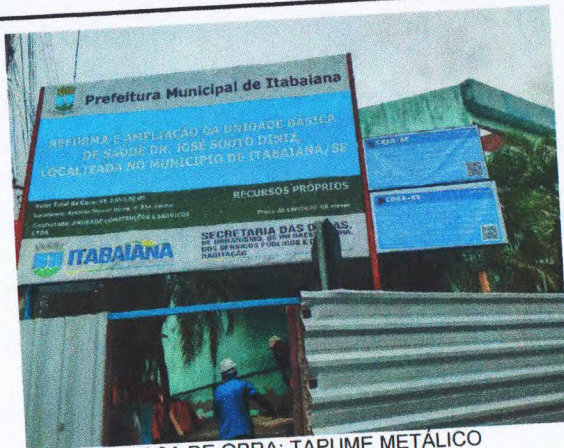

PLACA DE OBRA; TAPUME METÁLICO




DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

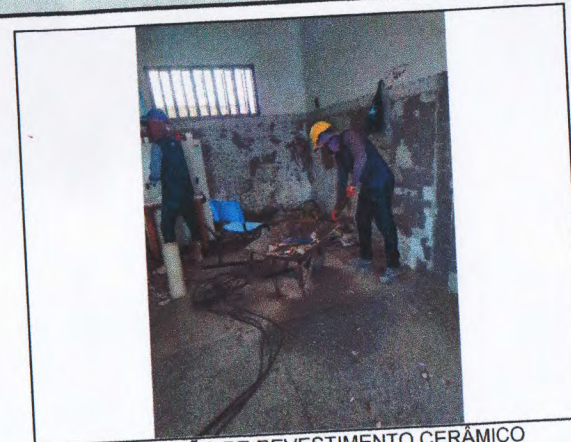

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO



DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

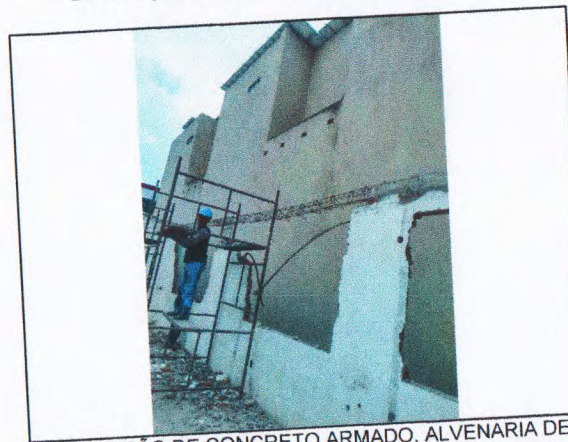

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA DE
BLOCO CERÂMICO E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS



DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA DE
BLOCO CERÂMICO E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.05.26
08:37:56 -03'00'

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031833
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

FOLHA 1

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ


CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. Nº. 02/2026

CONTRATO Nº 004/2026


ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 22/01/2026

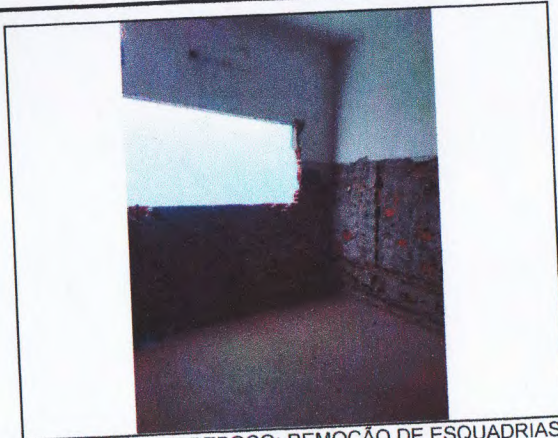

DEMOLIÇÃO DE REBOCO; REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

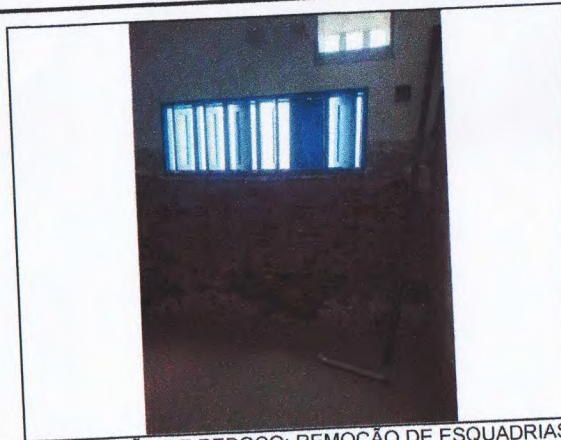


DEMOLIÇÃO DE REBOCO; REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

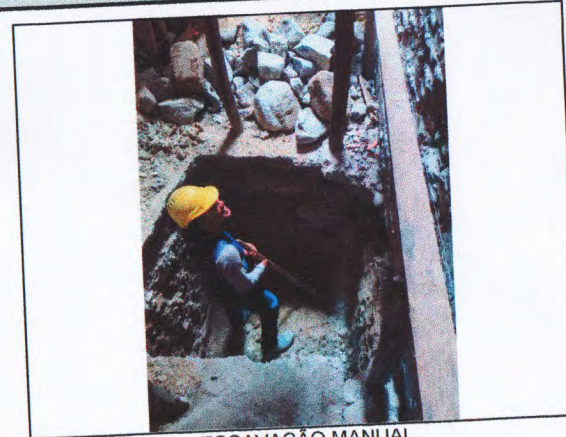

ESCAVAÇÃO MANUAL



ESCAVAÇÃO MANUAL

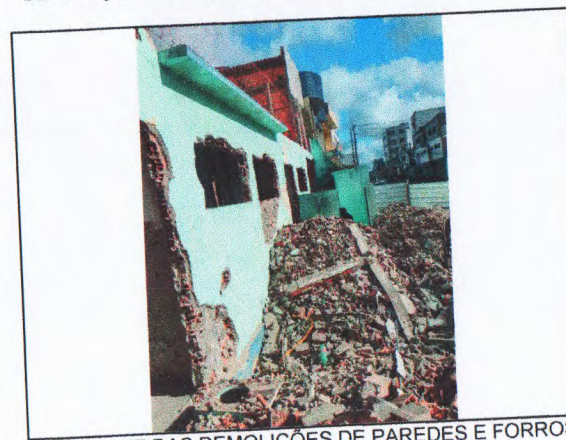

DESCARTE DAS DEMOLIÇÕES DE PAREDES E FORROS
DE GESSO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,
TELHAMENTO CERÂMICO, CALHAS



DESCARTE DAS DEMOLIÇÕES DE PAREDES E FORROS
DE GESSO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,
TELHAMENTO CERÂMICO, CALHAS

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.05.26
08:38:18 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

João Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721051899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. Nº. 02/2026

CONTRATO Nº 004/2026


ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 22/01/2026




ESCAVAÇÃO; CONCRETO MAGRO; FORMA E FERRAGEM DA SAPATA E ARRANQUE PILAR



ESCAVAÇÃO; CONCRETO MAGRO; FORMA; FERRAGEM E CONCRETO DE SAPATA

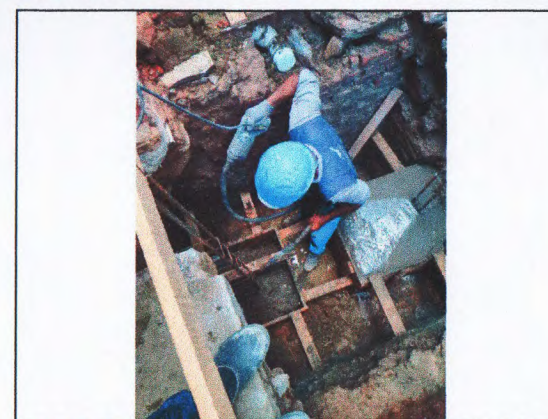

ESCAVAÇÃO; CONCRETO MAGRO; FORMA; FERRAGEM E CONCRETO DE SAPATAS

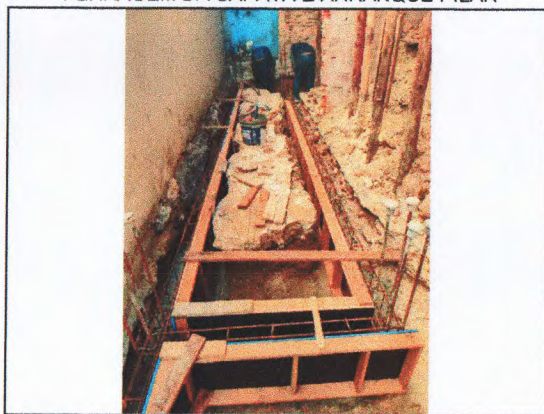

ESCAVAÇÃO; CONCRETO MAGRO; FORMA; FERRAGEM VIGAS E ARRANQUE PILAR



ESCAVAÇÃO; CONCRETO MAGRO; FORMA; FERRAGEM DA SAPATA E ARRANQUE PILAR



IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008

92714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.05.26
08:38:33 -03'00'

ELABORADO POR:

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

FOLHA 3

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ SOUTO DINIZ


CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B. M. Nº. 02/2026

CONTRATO Nº 004/2026


ORDEN DE SERVIÇO
INICIO - 22/01/2026

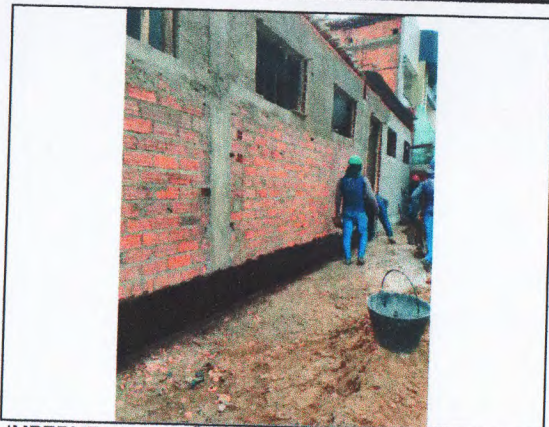


IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA; ALVENARIA DE BLOCO; CHAPISCO, REBOCO

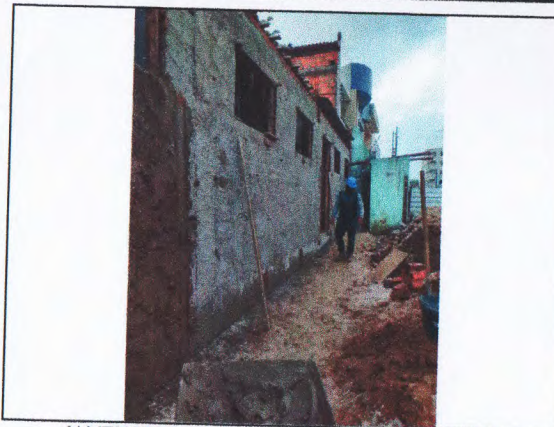

ALVENARIA DE BLOCO; CHAPISCO, REBOCO

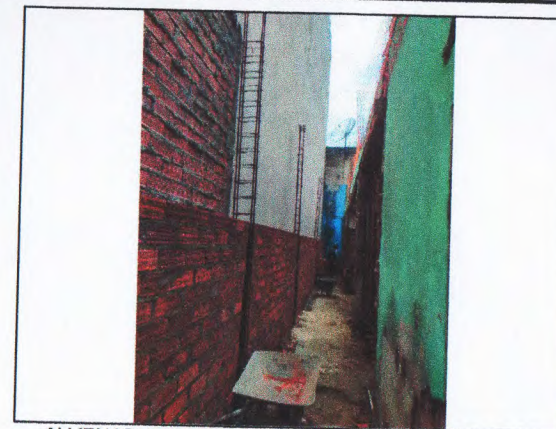


ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO; FERRAGEM DE PILARES

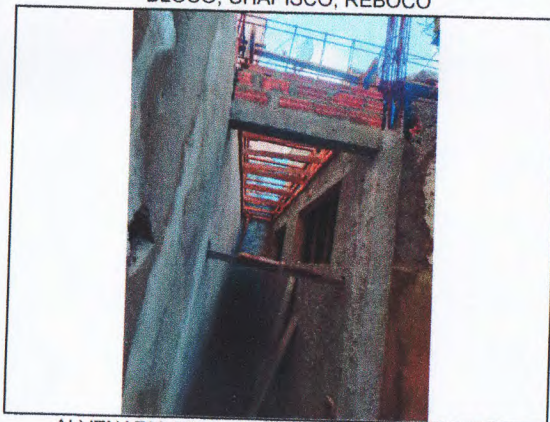

ALVENARIA DE BLOCO; CHAPISCO, REBOCO;
FERRAGEM DE VIGAS E PILARES



FORMA E FERRAGEM DE VIGAS E LAJE

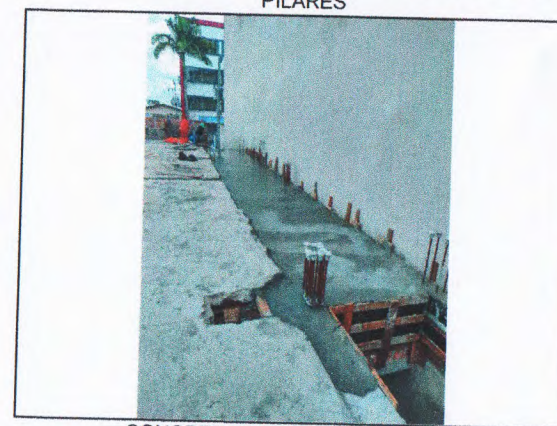

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE

ELABORADO POR:
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008927
14590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.05.26 08:38:57
-03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior:
Eng. Civil CREA - 2/21631839
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 4
