

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 02 Período: 31/10/2025 a 28/11/2025				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 28/11/2025		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								88.162,36	86.492,86	0,00	86.492,86	1.669,50	87,50
01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	4.042,58	4.042,58		4.042,58	0,00	4,27	17.261,82	17.261,82	0,00	17.261,82	0,00	100,00
01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,00	8,00		8,00	0,00	349,93	2.799,44	2.799,44	0,00	2.799,44	0,00	100,00
01.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	30,00		30,00	0,00	231,52	6.945,60	6.945,60	0,00	6.945,60	0,00	100,00
01.004	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1,00	1,00		1,00	0,00	480,85	480,85	480,85	0,00	480,85	0,00	100,00
01.005	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.602,13	1.602,13	1.602,13	0,00	1.602,13	0,00	100,00
01.006	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	630,00	630,00		630,00	0,00	87,33	55.017,90	55.017,90	0,00	55.017,90	0,00	100,00
01.007	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	630,00			0,00	630,00	2,65	1.669,50	0,00	0,00	0,00	1.669,50	0,00
01.008	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	4.042,58	4.042,58		4.042,58	0,00	0,59	2.385,12	2.385,12	0,00	2.385,12	0,00	100,00
02	PAVIMENTAÇÃO								383.059,22	18.743,85	170.782,99	189.526,84	193.532,38	44,00
02.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1.316,71	300,00	621,70	921,70	395,01	38,08	50.140,32	11.424,00	23.674,34	35.098,34	15.041,98	70,00
02.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.316,71			0,00	1.316,71	3,85	5.069,33	0,00	0,00	0,00	5.069,33	0,00
02.003	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	404,25	40,43	242,55	282,98	121,27	148,05	59.849,21	5.985,66	35.909,53	41.895,19	17.954,02	70,00
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12.127,74	1.212,90	7.276,50	8.489,40	3.638,34	1,10	13.340,51	1.334,19	8.004,15	9.338,34	4.002,17	70,00
02.005	Lona plástica preta	m2	1.533,20		766,60	766,60	766,60	5,67	8.693,24	0,00	4.346,62	4.346,62	4.346,62	50,00
02.006	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	361,30		144,52	144,52	216,78	43,88	15.853,84	0,00	6.341,54	6.341,54	9.512,30	40,00
02.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	361,30			0,00	361,30	63,49	22.938,94	0,00	0,00	0,00	22.938,94	0,00
02.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1.049,19		419,68	419,68	629,51	105,62	110.815,45	0,00	44.326,60	44.326,60	66.488,85	40,00
02.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	351,02		175,52	175,52	175,50	102,14	35.853,18	0,00	17.927,61	17.927,61	17.925,57	50,00
02.010	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.171,90		585,95	585,95	585,95	51,63	60.505,20	0,00	30.252,60	30.252,60	30.252,60	50,00
03	ESTACIONAMENTO								21.804,20	0,00	0,00	0,00	21.804,20	0,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vicent Matheus Rocha Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707034703

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 02 Período: 31/10/2025 a 28/11/2025				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 28/11/2025		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	188,75			0,00	188,75	110,05	20.771,94	0,00	0,00	0,00	20.771,94	0,00
03.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00			0,00	2,00	516,13	1.032,26	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								249.389,23	0,00	10.096,02	10.096,02	239.293,21	9,03
04.001	PADRÃO DE ENTRADA								3.684,44	0,00	0,00	0,00	3.684,44	0,00
04.001.001	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	m	36,00			0,00	36,00	51,18	1.842,48	0,00	0,00	0,00	1.842,48	0,00
04.001.002	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	1,00			0,00	1,00	68,26	68,26	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00
04.001.003	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	12,00			0,00	12,00	33,59	403,08	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00
04.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	8,00			0,00	8,00	3,53	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00
04.001.005	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00			0,00	1,00	437,49	437,49	0,00	0,00	0,00	437,49	0,00
04.001.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			0,00	1,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00
04.001.007	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00			0,00	2,00	14,97	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00
04.001.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			0,00	1,00	383,74	383,74	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00
04.001.009	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	1,00			0,00	1,00	348,51	348,51	0,00	0,00	0,00	348,51	0,00
04.001.010	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00			0,00	2,00	51,45	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00
04.001.011	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00			0,00	1,00	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
04.002	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA								243.553,20	0,00	8.987,74	8.987,74	234.565,46	15,97
04.002.001	Luminária Decorativa, IP66, IK08, bivolt, 80w, 10.400lm, distribuição luminosa simétrica, fixação em topo de poste 60,3mm, conforme projeto	un	54,00			0,00	54,00	2.281,74	123.213,96	0,00	0,00	0,00	123.213,96	0,00
04.002.002	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_ 04/2025	un	54,00			0,00	54,00	1.600,32	86.417,28	0,00	0,00	0,00	86.417,28	0,00
04.002.003	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00			0,00	8,00	46,97	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76	0,00
04.002.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	56,00		30,00	30,00	26,00	147,76	8.274,56	0,00	4.432,80	4.432,80	3.841,76	53,57
04.002.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	54,00			0,00	54,00	117,19	6.328,26	0,00	0,00	0,00	6.328,26	0,00
04.002.006	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	772,00			0,00	772,00	9,59	7.403,48	0,00	0,00	0,00	7.403,48	0,00
04.002.007	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	502,00			0,00	502,00	8,54	4.287,08	0,00	0,00	0,00	4.287,08	0,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vicente Matheus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - DE 27070347013

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 335/2025			
							B.M.Nº: 02 Período: 31/10/2025 a 28/11/2025				Data da medição: 28/11/2025			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.002.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	386,00		270,20	270,20	115,80	16,31	6.295,66	0,00	4.406,96	4.406,96	1.888,70	70,00
04.002.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	14,00		14,00	14,00	0,00	10,57	147,98	0,00	147,98	147,98	0,00	100,00
04.002.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	129,00			0,00	129,00	2,99	385,71	0,00	0,00	0,00	385,71	0,00
04.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	5,00			0,00	5,00	1,27	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00
04.002.012	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	54,00			0,00	54,00	6,88	371,52	0,00	0,00	0,00	371,52	0,00
04.002.013	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	2,00			0,00	2,00	11,12	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00
04.002.014	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00			0,00	2,00	11,68	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00
04.003	INTERNET PÚBLICA								2.151,59	0,00	1.108,28	1.108,28	1.043,31	11,11
04.003.001	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00		1,00	1,00	0,00	1.108,28	1.108,28	0,00	1.108,28	1.108,28	0,00	100,00
04.003.002	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	1,00			0,00	1,00	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00
04.003.003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00			0,00	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
04.003.004	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			0,00	1,00	383,74	383,74	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00
04.003.005	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento	m	45,00			0,00	45,00	7,32	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
04.003.006	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00			0,00	1,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00
04.003.007	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	10,00			0,00	10,00	16,19	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00
04.003.008	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00			0,00	1,00	45,42	45,42	0,00	0,00	0,00	45,42	0,00
04.003.009	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	3,00			0,00	3,00	5,03	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00
05	PLAYGROUND								15.876,99	0,00	0,00	0,00	15.876,99	0,00
05.001	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00			0,00	2,00	1.565,86	3.131,72	0,00	0,00	0,00	3.131,72	0,00
05.002	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00			0,00	1,00	2.622,14	2.622,14	0,00	0,00	0,00	2.622,14	0,00
05.003	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00			0,00	1,00	3.696,94	3.696,94	0,00	0,00	0,00	3.696,94	0,00
05.004	Carrocel universal em aço galvanizado diam=1,60m - Sergipark ou similar	un	1,00			0,00	1,00	2.714,79	2.714,79	0,00	0,00	0,00	2.714,79	0,00
05.005	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00			0,00	1,00	3.711,40	3.711,40	0,00	0,00	0,00	3.711,40	0,00
06	ACADEMIA								37.180,68	0,00	0,00	0,00	37.180,68	0,00
06.001	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00			0,00	2,00	3.932,06	7.864,12	0,00	0,00	0,00	7.864,12	0,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vicente Matheus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 02 Período: 31/10/2025 a 28/11/2025				CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 28/11/2025		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.002	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	2,00			0,00	2,00	5.698,04	11.396,08	0,00	0,00	0,00	11.396,08	0,00
06.003	Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	2,00			0,00	2,00	1.822,41	3.644,82	0,00	0,00	0,00	3.644,82	0,00
06.004	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00			0,00	2,00	3.181,35	6.362,70	0,00	0,00	0,00	6.362,70	0,00
06.005	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	2,00			0,00	2,00	1.737,85	3.475,70	0,00	0,00	0,00	3.475,70	0,00
06.006	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	un	2,00			0,00	2,00	2.218,63	4.437,26	0,00	0,00	0,00	4.437,26	0,00
07	MONUMENTO - CRUZ								5.327,04	0,00	0,00	0,00	5.327,04	0,00
07.001	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00			0,00	1,00	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00
07.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,55			0,00	0,55	2.239,54	1.231,75	0,00	0,00	0,00	1.231,75	0,00
07.003	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m3	1,00			0,00	1,00	455,65	455,65	0,00	0,00	0,00	455,65	0,00
07.004	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	12,80			0,00	12,80	12,57	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00
07.005	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	1,00			0,00	1,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00
07.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,26			0,00	9,26	39,10	362,07	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00
07.007	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,07			0,00	15,07	189,80	2.860,29	0,00	0,00	0,00	2.860,29	0,00
08	PAISAGISMO								34.398,07	0,00	0,00	0,00	34.398,07	0,00
08.001	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	6,00			0,00	6,00	197,16	1.182,96	0,00	0,00	0,00	1.182,96	0,00
08.002	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00			0,00	6,00	96,43	578,58	0,00	0,00	0,00	578,58	0,00
08.003	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	5,00			0,00	5,00	98,85	494,25	0,00	0,00	0,00	494,25	0,00
08.004	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	18,00			0,00	18,00	98,85	1.779,30	0,00	0,00	0,00	1.779,30	0,00
08.005	média	un	19,00			0,00	19,00	81,54	1.549,26	0,00	0,00	0,00	1.549,26	0,00
08.006	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	79,00			0,00	79,00	45,36	3.583,44	0,00	0,00	0,00	3.583,44	0,00
08.007	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00			0,00	6,00	98,85	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10	0,00
08.008	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	832,90			0,00	832,90	29,58	24.637,18	0,00	0,00	0,00	24.637,18	0,00
09	DIVERSOS								28.040,85	0,00	0,00	0,00	28.040,85	0,00

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vicente Matheus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 335/2025		
Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME								B.M.Nº: 02				Data da medição: 28/11/2025		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 31/10/2025 a 28/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
09.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00			0,00	5,00	386,20	1.931,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00
09.002	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	9,00			0,00	9,00	162,15	1.459,35	0,00	0,00	0,00	1.459,35	0,00
09.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	89,10			0,00	89,10	189,80	16.911,18	0,00	0,00	0,00	16.911,18	0,00
09.004	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	8,00			0,00	8,00	701,85	5.614,80	0,00	0,00	0,00	5.614,80	0,00
09.005	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	8,00			0,00	8,00	33,95	271,60	0,00	0,00	0,00	271,60	0,00
09.006	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00			0,00	6,00	308,82	1.852,92	0,00	0,00	0,00	1.852,92	0,00
10	PERGOLADO								19.513,66	0,00	0,00	0,00	19.513,66	0,00
10.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 01 demão de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	87,84			0,00	87,84	13,34	1.171,79	0,00	0,00	0,00	1.171,79	0,00
10.002	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	87,84			0,00	87,84	208,81	18.341,87	0,00	0,00	0,00	18.341,87	0,00
11	MARCO INAUGURAL								3.159,22	0,00	0,00	0,00	3.159,22	0,00
11.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00			0,00	1,00	1.876,55	1.876,55	0,00	0,00	0,00	1.876,55	0,00
11.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49			0,00	0,49	2.239,54	1.097,37	0,00	0,00	0,00	1.097,37	0,00
11.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	0,24			0,00	0,24	6,39	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
11.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4,70			0,00	4,70	39,10	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77	0,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								38.682,00	4.255,02	8.123,22	12.378,24	26.303,76	32,00
12.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	100,00	11,00	21,00	32,00	68,00	163,80	16.380,00	1.801,80	3.439,80	5.241,60	11.138,40	32,00
12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	22,00	42,00	64,00	136,00	60,73	12.146,00	1.336,06	2.550,66	3.886,72	8.259,28	32,00
12.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	400,00	44,00	84,00	128,00	272,00	25,39	10.156,00	1.117,16	2.132,76	3.249,92	6.906,08	32,00
	TOTAIS								924.593,52	109.491,73	189.002,23	298.493,96	626.099,56	32,28%
	PERCENTUAL								100,00%	11,84%	20,44%	32,28%	67,72%	
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.						APROVADO PARA PAGAMENTO					
Vicente Matheus Rocha Bezerra Engenheiro Civil CREA - SE 2707034702			DATA:						DATA:					
CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra			Rizla Milene S. Rodrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana											

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº: 02 Período: 31/10/2025 a 28/11/2025		CONTRATO Nº: 335/2025 Data da medição: 28/11/2025	
MEMORIAL DE CALCULO					
02	PAVIMENTAÇÃO				
02.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024	m	Comprimento total: 621,70m		
02.003	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	Volume total: 2.425,50m2 x 0,10m = 242,55m3		
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	tkm	Transporte total: 242,55m3 x 1,5 x 20,00km = 7.276,50tkm		
02.005	Lona plástica preta	m2	Área total: 306,64m x 2,50m = 766,60m2		
02.006	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l,	m2	Área total: 72,26m x 2,00m = 144,52m2		
02.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2,	m2	Área total: 209,84m x 2,00m = 419,68m2		
02.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2,	m2	Área total: 87,76m x 2,00m = 175,52m2		
02.010	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	Área total: 234,38m x 2,50m = 585,95m2		
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
04.002	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
04.002.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	Quantidade total: 30,00und		
04.002.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	Comprimento total: 270,20m		
04.002.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	Comprimento total: 14,00m		
04.003	INTERNET PÚBLICA				
04.003.001	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	Quantidade total: 1,00und		
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
12.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 32,00% x 100,00h = 32,00h (-) 11,00h (Já medido) = 21,00h		
12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 32,00% x 200,00h = 64,00h (-) 22,00h (Já medido) = 42,00h		
12.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	Proporcional ao percentual de execução da obra: 32,00% x 400,00h = 128,00h (-) 44,00h (Já medido) = 84,00h		
 CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:		APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
			João Vitor Reis dos Santos Eng. Civil CREA - 272335922-0 Coordenador de Nucleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		 Kizia Milene S. Rodrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Nucleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA**
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 335/2025

B.M.Nº: 02

Período: 31/10/2025 a 28/11/2025

Data da medição: 28/11/2025



MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO




MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO




MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO



MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO

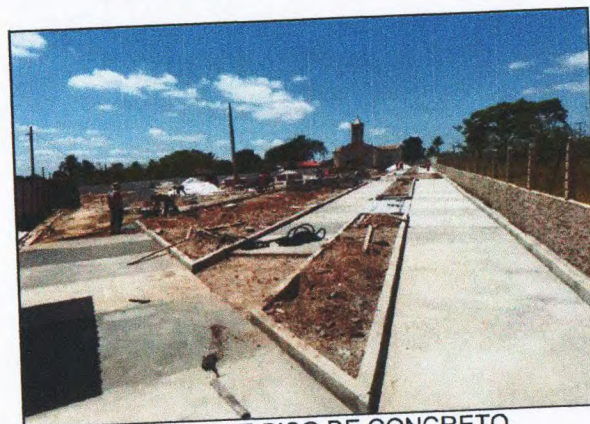

MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO

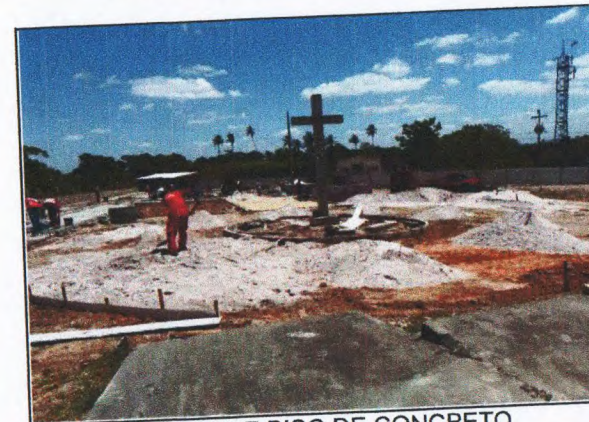

MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vicente Mathheus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA**
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 02
Período: 31/10/2025 a 28/11/2025

CONTRATO Nº: 335/2025

Data da medição: 28/11/2025



MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO



MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO



MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO



MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO



MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO



MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vicente Matheus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MATAPOA**
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº: 02
Período: 31/10/2025 a 28/11/2025

CONTRATO Nº: 335/2025

Data da medição: 28/11/2025



MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO



MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO



MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO



MEIO-FIO E PISO DE CONCRETO



CAIXAS DE PASSAGENS



POSTE DE CONCRETO

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Vicente Matheus Rocha Bezerra
Engenheiro Civil
CREA - SE 2707034703

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
