

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 069/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2022					ORDEM DE SERVIÇOS = 20/06/2022						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022					DATA MEDIÇÃO: 06/09/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	297,23	1.783,38	1.783,38	0,00	1.783,38	2.410,92	0,00	100,00
01.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	729,29	437,57	291,72	729,29	3,99	2.909,87	1.745,90	1.163,97	2.909,87	0,00	100,00	
01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	828,04	496,82	331,22	828,04	0,60	496,82	298,09	198,73	496,82	0,00	100,00	
01.004	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	669,34	535,47	133,87	669,34	24,79	16.592,94	13.274,30	3.318,64	16.592,94	0,00	100,00	
01.005	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20	mês	3,00			0,00	803,64	2.410,92	0,00	0,00	0,00	2.410,92	0,00	100,00
02	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA							12.661,60	9.294,60	3.367,00	12.661,60	-	100,00	
02.001	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	48,00	42,00	6,00	48,00	43,09	2.068,32	1.809,78	258,54	2.068,32	0,00	100,00	
02.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	642,34	642,34		642,34	7,36	4.727,62	4.727,62	0,00	4.727,62	0,00	100,00	
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	46,53	15,00	31,53	46,53	21,25	988,76	318,75	670,01	988,76	0,00	100,00	
02.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	47,66	23,83	23,83	47,66	55,53	2.646,56	1.323,28	1.323,28	2.646,56	0,00	100,00	
02.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	96,14	48,07	48,07	96,14	1,15	110,56	55,28	55,28	110,56	0,00	100,00	
02.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.163,04	1.081,52	1.081,52	2.163,04	0,98	2.119,78	1.059,89	1.059,89	2.119,78	0,00	100,00	
03	PAVIMENTAÇÃO							56.111,35	15.498,37	40.612,98	56.111,35	-	100,00	
03.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.059,21	526,13	533,08	1.059,21	25,14	26.628,54	13.226,91	13.401,63	26.628,54	0,00	100,00	
03.002	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	28,59	7,15	21,44	28,59	14,86	424,85	106,25	318,60	424,85	0,00	100,00	
03.003	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	66,28	16,57	49,71	66,28	107,15	7.101,90	1.775,48	5.326,42	7.101,90	0,00	100,00	
03.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.590,72	397,68	1.193,04	1.590,72	0,98	1.558,91	389,73	1.169,18	1.558,91	0,00	100,00	
03.005	Lona plástica preta	m2	441,89		441,89	441,89	4,93	2.178,52	0,00	2.178,52	2.178,52	0,00	100,00	
03.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m,	m2	441,89		441,89	441,89	35,95	15.885,95	0,00	15.885,95	15.885,95	0,00	100,00	
03.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	6,00		6,00	6,00	388,78	2.332,68	0,00	2.332,68	2.332,68	0,00	100,00	
04	PAISAGISMO							11.282,33	-	11.282,33	11.282,33	-	100,00	
04.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	290,59		290,59	290,59	18,20	5.288,74	0,00	5.288,74	5.288,74	0,00	100,00	
04.002	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	12,00		12,00	12,00	98,66	1.183,92	0,00	1.183,92	1.183,92	0,00	100,00	
04.003	Planta - Ipê amarelo adulto (acima de h=2,00 metros)	un	8,00		8,00	8,00	195,08	1.560,64	0,00	1.560,64	1.560,64	0,00	100,00	


 Andrade e Oliveira Construções Eireli
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 RT Eng.º CIVIL CREA/SE
 RN 2714133398

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Soares Santana
 Eng. Civil - CREA SE 2779636353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 069/2022					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.º. 02/2022					ORDEM DE SERVIÇOS = 20/06/2022					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022					DATA MEDIÇÃO: 06/09/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.004	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	25,00		25,00	25,00	42,79	1.069,75	0,00	1.069,75	1.069,75	0,00	100,00
04.005	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	16,00		16,00	16,00	110,09	1.761,44	0,00	1.761,44	1.761,44	0,00	100,00
04.006	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	12,00		12,00	12,00	34,82	417,84	0,00	417,84	417,84	0,00	100,00
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							127.731,48	-	9.272,51	9.272,51	118.458,97	7,26
05.001	Poste Cônico contínuo duplo, modelo regência, engastado, altura útil 10,0 metros, Galv. a fogo. Conforme desenho anexo	un	17,00			0,00	3.258,28	55.390,76	0,00	0,00	0,00	55.390,76	0,00
05.002	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	34,00			0,00	1.174,35	39.927,90	0,00	0,00	0,00	39.927,90	0,00
05.003	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580	m	27,00			0,00	83,94	2.266,38	0,00	0,00	0,00	2.266,38	0,00
05.004	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00			0,00	77,63	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00
05.005	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	9,00			0,00	31,22	280,98	0,00	0,00	0,00	280,98	0,00
05.006	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	8,00			0,00	5,92	47,36	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00
05.007	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			0,00	581,01	581,01	0,00	0,00	0,00	581,01	0,00
05.008	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			0,00	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00
05.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento	un	17,00			0,00	143,45	2.438,65	0,00	0,00	0,00	2.438,65	0,00
05.010	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00			0,00	17,70	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00
05.011	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			0,00	530,50	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50	0,00
05.012	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	1,00			0,00	447,54	447,54	0,00	0,00	0,00	447,54	0,00
05.013	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00			0,00	98,59	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18	0,00
05.014	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00			0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00
05.015	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	19,00		17,00	17,00	156,72	2.977,68	0,00	2.664,24	2.664,24	313,44	89,47
05.016	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.196,00			0,00	8,66	10.357,36	0,00	0,00	0,00	10.357,36	0,00
05.017	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v -	M	476,00			0,00	11,42	5.435,92	0,00	0,00	0,00	5.435,92	0,00
05.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	49,00		49,00	49,00	14,01	686,49	0,00	686,49	686,49	0,00	100,00
05.019	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	339,00		339,00	339,00	15,07	5.108,73	0,00	5.108,73	5.108,73	0,00	100,00
05.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	16,00		16,00	16,00	2,64	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00	100,00


 Andrade e Oliveira Construções Eireli
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 RT Eng.º Civil CREA/SE
 RN 2714183398


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2115638353
 Coordenador de Nucleo

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 069/2022					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2022					ORDEM DE SERVIÇOS = 20/06/2022					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022					DATA MEDIÇÃO: 06/09/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
05.021	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	113,00		113,00	113,00	3,99	450,87	0,00	450,87	450,87	0,00	100,00
05.022	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	34,00		34,00	34,00	9,41	319,94	0,00	319,94	319,94	0,00	100,00
05.023	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	2,00			0,00	10,19	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00
05.024	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	4,00			0,00	13,85	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00
06	DIVERSOS							10.368,93	-	-	-	10.368,93	0,00
06.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou	un	5,00			0,00	326,14	1.630,70	0,00	0,00	0,00	1.630,70	0,00
06.002	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00			0,00	845,90	845,90	0,00	0,00	0,00	845,90	0,00
06.003	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00			0,00	1.856,07	1.856,07	0,00	0,00	0,00	1.856,07	0,00
06.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.059,21			0,00	3,97	4.205,06	0,00	0,00	0,00	4.205,06	0,00
06.005	Limpeza geral	m2	732,48			0,00	2,50	1.831,20	0,00	0,00	0,00	1.831,20	0,00
07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							16.378,20	2.832,52	4.677,53	7.510,05	8.868,15	45,85
07.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	50,00	8,65	14,28	22,93	128,20	6.410,00	1.108,93	1.830,70	2.939,63	3.470,37	45,86
07.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	220,00	38,04	62,83	100,87	45,31	9.968,20	1.723,59	2.846,83	4.570,42	5.397,78	45,85
Total geral								258.727,82	44.727,16	73.893,69	118.620,85	140.106,97	45,85
Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 069/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02/2022	ORDEM DE SERVIÇOS = 20/06/2022
CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI				PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022	DATA MEDIÇÃO: 06/09/2022
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	291,72	> 37,88 + 62,76 + 91,10 + 58,80 + 201,59 + 86,37 + 83,72 + 81,31 + 72,29 = 775,82 m ² - área de piso de 46,53 m ² = 729,29 m ² - 437,57 m ² (Medição Anterior) = 291,72 m ²	
01.003	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	331,22	> 41,56 + 68,31 + 96,62 + 62,63 + 214,12 + 91,08 + 89,88 + 86,27 + 76,77 = 828,04 m ² - 496,82 m ² (Medição Anterior) = 331,22 m ²	
01.004	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	133,87	> 642,34 + 3,00 x 9,00 = 669,34 m - 535,47 m (Medição Anterior) = 133,87 m	
02	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA				
02.001	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	6,00	> 48,00 un - 42,00 un (Medição Anterior) = 6,00 un	
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	31,53	> 16,50 x 2,82 = 46,53 m ² - 15,00 m ² (Medição Anterior) = 31,53 m ²	
02.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria.	m3	23,83	> 1.059,21 x 0,30 x 0,15 = 47,66 m ³ - 23,83 m ³ (Medição Anterior) = 23,83 m ³	
02.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	48,07	> 47,66 x 1,25 + 642,34 x 0,30 x 0,12 + 46,53 x 0,07 + 48,00 x 3,00 x (0,30 ² x 3,14/4) = 96,14 m ³ - 48,07 m ³ (Medição Anterior) = 48,07 m ³	
02.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	1.081,52	> 96,14 x 1,50 x 15,00 = 2.163,04 tkm - 1.081,52 tkm (Medição Anterior) = 1.081,52 tkm	
03	PAVIMENTAÇÃO				
03.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	533,08	> (Perímetro externo + interno) = 642,34 + 416,87 = 1.059,21m - 526,13 m = 533,08 m	
03.002	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	21,44	> 1.059,21 x 0,15 x 0,12 = 47,66 - 19,07 = 28,59 m ³ - 7,15 m ³ (Medição Anterior) = 21,44 m ³	
03.003	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	49,71	> 441,89 x 0,15 = 66,28 m ³ - 16,57 m ³ (Medição Anterior) = 49,71 m ³	
03.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	1.193,04	> 66,28 x 1,50 x 16,00 = 1.590,72 tkm - 397,68 tkm = 1.193,04 tkm	
03.005	Lona plástica preta	m2	441,89	> 53,83 + 59,58 + 56,80 + 59,83 + 123,03 + 36,05 + 52,77 = 441,89 m ²	
03.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	441,89	> 53,83 + 59,58 + 56,80 + 59,83 + 123,03 + 36,05 + 52,77 = 441,89 m ²	
03.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	6,00	> 6,00 un	
04	PAISAGISMO				
04.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	290,59	> 100,65 + 29,99 + 19,36 + 66,48 + 19,07 + 20,75 + 16,24 + 2,28 + 15,77 = 290,59 m ²	
04.002	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	12,00	> 12,00 un	
04.003	Planta - Ipê amarelo adulto (acima de h=2,00 metros)	un	8,00	> 8,00 un	
04.004	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	25,00	> 25,00 un	
04.005	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	16,00	> 16,00 un	
04.006	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	12,00	> 12,00 un	
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
05.015	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	17,00	> 17,00 un	
05.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	49,00	> 49,00 m	
05.019	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	339,00	> 339,00 m	
05.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	16,00	> 16,00 un	
05.021	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	113,00	> 113,00 un	
<p>Andrade & Oliveira Construções Eireli José Almeida Andrade Engº Civil José Almeida Andrade Administrador CREA RN 2714133398</p>			<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___</p>		<p>Aprovado para pagamento Data: ___/___/___</p>



Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador do Núcleo

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 069/2022	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02/2022	ORDEM DE SERVIÇOS = 20/06/2022	
CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI				PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022	DATA MEDIÇÃO: 06/09/2022	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO			
05.022	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	34,00	> 34,00 m		
07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
07.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	14,28	> $(113.943,32 - 2.832,52) / (258.727,82 - 16.378,20) = 0,4585 \times 50,00 \text{ h} = 22,93\text{h} - 8,65 \text{ h (Medição Anterior)} = 14,28\text{h}$		
07.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	62,83	> $(113.943,32 - 2.832,52) / (258.727,82 - 16.378,20) = 0,4585 \times 220,00 \text{ h} = 100,87 \text{ h} - 38,04 \text{ h (Medição Anterior)} = 62,83 \text{ h}$		
Andrade & Oliveira Construções Eireli <i>José Almeida Andrade</i> Sócio Administrador Engº CREA/SE 2715638353 CREA RN 2715638353		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___		


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

CONTRATO nº 069/2022

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 20/06/2022



PLACA DA OBRA



FECHAMENTO COM TELA; DEMOLIÇÕES;
ESCAVAÇÕES; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO



FECHAMENTO COM TELA; DEMOLIÇÕES;
ESCAVAÇÕES; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO



FECHAMENTO COM TELA; DEMOLIÇÕES;
ESCAVAÇÕES; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO;
ATERRO COMPACTADO



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO;
ATERRO COMPACTADO



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO;
ATERRO COMPACTADO

Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng. CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Prefeitura Municipal de Itabaiiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2714638353
Coordenador de Obras

ELABORADO POR:

FOLHA 1 de 4

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

CONTRATO nº 069/2022

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 20/06/2022



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; ATERRO COMPACTADO; LONA PLÁSTICA



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; ATERRO COMPACTADO; LONA PLÁSTICA




FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; LONA PLÁSTICA; FORMA PARA CONCRETAGEM



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; LONA PLÁSTICA; FORMA PARA CONCRETAGEM




FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; LONA PLÁSTICA; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

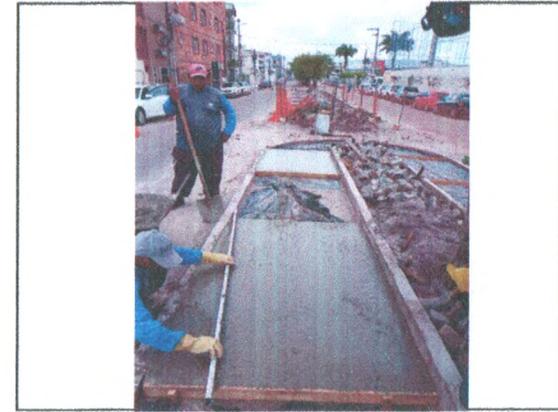

FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; LONA PLÁSTICA; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

ELABORADO POR:


Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT/Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 715638353
Coordenador de Núcleo

FOLHA 2 de 4

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

CONTRATO nº 069/2022

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

INÍCIO - 20/06/2022



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO; RAMPAS PARA ACESSO DEFICIENTE



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; LONA PLÁSTICA PISO EM CONCRETO



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; TERRA VEGETAL

ELABORADO POR:

Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng.º CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 715638353
Coordenador de Núcleo

FOLHA 3 de 4

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02

CONTRATO nº 069/2022

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA


INÍCIO - 20/06/2022



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; TERRA VEGETAL




FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO; TERRA

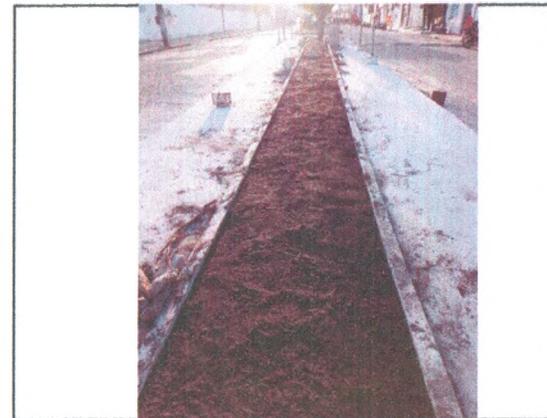

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO; TERRA VEGETAL



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; GRAMA ESMERALDA EM PLACAS; PLANTIO DE MUDAS

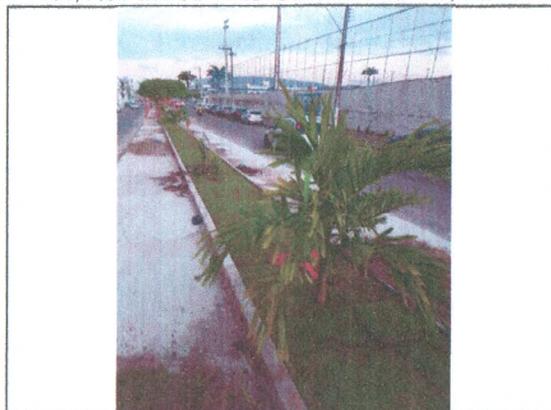

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO; GRAMA ESMERALDA EM PLACAS; PLANTIO DE MUDAS



FECHAMENTO COM TELA; ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO; GRAMA ESMERALDA EM PLACAS; PLANTIO DE MUDAS

ELABORADO POR:

Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Santos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

FOLHA 4 de 4
