


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 162/2022			DIAS			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 01/06/2023 A 22/06/2023					ORDEM DE SERVIÇO: 02/05/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		SALDO	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			Acumulado até o Período
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.990,30	2.133,42	464,22	2.597,64	1.392,66	65,10	
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	-	278,20	1.669,20	1.669,20	-	1.669,20	-	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	1,00	1,00	2,00	3,00	464,22	2.321,10	464,22	464,22	928,44	1.392,66	40,00
02	TRECHO 01							282.980,09	-	-	-	282.980,09	-	
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							11.553,71	-	-	-	11.553,71	-	
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.182,95			-	3.182,95	1,21	3.851,37	-	-	-	3.851,37	-
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	m2	3.311,04			-	3.311,04	1,02	3.377,26	-	-	-	3.377,26	-
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.034,74			-	1.034,74	0,73	755,36	-	-	-	755,36	-
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	3.104,10			-	3.104,10	1,15	3.569,72	-	-	-	3.569,72	-
02.002	PAVIMENTAÇÃO							252.377,64	-	-	-	252.377,64	-	
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.926,77			-	2.926,77	68,89	201.625,19	-	-	-	201.625,19	-
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	853,92			-	853,92	29,33	25.045,47	-	-	-	25.045,47	-
02.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	853,92			-	853,92	2,94	2.510,52	-	-	-	2.510,52	-
02.002.004	Colchão de areia	m3	204,87			-	204,87	101,15	20.722,60	-	-	-	20.722,60	-
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.151,18			-	2.151,18	1,15	2.473,86	-	-	-	2.473,86	-
02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL							17.648,24	-	-	-	17.648,24	-	
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	256,18			-	256,18	68,89	17.648,24	-	-	-	17.648,24	-
02.004	LIMPEZA							1.400,50	-	-	-	1.400,50	-	
02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.182,95			-	3.182,95	0,44	1.400,50	-	-	-	1.400,50	-
03	TRECHO 02							141.128,73	103.593,77	35.517,25	139.111,02	2.017,71	98,57	
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.738,49	4.267,54	1.470,95	5.738,49	-	100,00	
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.578,35	1.173,05	405,30	1.578,35	-	1,21	1.909,80	1.419,39	490,41	1.909,80	-	100,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	m2	1.645,86	1.224,35	421,51	1.645,86	-	1,02	1.678,78	1.248,84	429,94	1.678,78	-	100,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	514,33	382,61	131,72	514,33	-	0,73	375,46	279,31	96,15	375,46	-	100,00
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.543,00	1.147,83	395,17	1.543,00	-	1,15	1.774,45	1.320,00	454,45	1.774,45	-	100,00
03.002	PAVIMENTAÇÃO							125.394,24	92.258,12	31.812,88	124.071,00	1.323,24	98,94	
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.443,33	1.070,45	372,88	1.443,33	-	68,89	99.431,00	73.743,30	25.687,70	99.431,00	-	100,00
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	450,08	342,00	108,08	450,08	-	29,33	13.200,85	10.030,86	3.169,99	13.200,85	-	100,00
03.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	450,08			-	450,08	2,94	1.323,24	-	-	-	1.323,24	-
03.002.004	Colchão de areia	m3	101,03	74,93	26,10	101,03	-	101,15	10.219,18	7.579,17	2.640,01	10.219,18	-	100,00
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.060,84	786,77	274,07	1.060,84	-	1,15	1.219,97	904,79	315,18	1.219,97	-	100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Van Helder Reis dos Santos
 Eng. Civil - CREC/SP/2715030353
 Coordenador de Núcleo

Jose Wilson Gomes da Paiva
 Eng. Civil - CREC/SP/2720293354
 Coordenador de Núcleo



Jose Cristiano Silva Weber
 Engenheiro Civil


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 162/2022		ORDEN DE SERVIÇO: 02/05/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 01/06/2023 A 22/06/2023					DATA: 23/06/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				SALDO	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								9.301,53	7.068,11	2.233,42	9.301,53	-	100,00	
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	135,02	102,60	32,42	135,02	-	68,89	9.301,53	7.068,11	2.233,42	9.301,53	-	100,00	
03.004	LIMPEZA								694,47	-	-	-	694,47	-	
03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.578,35				-	1.578,35	0,44	694,47	-	-	694,47	-	
04	TRECHO 03								171.367,38	-	142.924,98	142.924,98	28.442,40	83,40	
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.987,48	-	5.863,77	5.863,77	1.123,71	83,92	
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.924,00				1.608,85	1.608,85	315,15	1,21	2.328,04	-	1.946,71	381,33	83,62
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	m2	2.002,98				1.683,85	1.683,85	319,13	1,02	2.043,04	-	1.717,53	325,51	84,07
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	625,93				526,20	526,20	99,73	0,73	456,93	-	384,13	72,80	84,07
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.877,80				1.578,61	1.578,61	299,19	1,15	2.159,47	-	1.815,40	344,07	84,07
04.002	PAVIMENTAÇÃO								152.650,79	-	126.727,71	126.727,71	25.923,08	83,02	
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.766,03				1.458,85	1.458,85	307,18	68,89	121.661,81	-	100.500,18	21.161,63	82,61
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	526,56				500,00	500,00	26,56	29,33	15.444,00	-	14.665,00	779,00	94,96
04.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	526,56				-	526,56	2,94	1.548,09	-	-	1.548,09	-	
04.002.004	Colchão de areia	m3	123,62				102,12	102,12	21,50	101,15	12.504,16	-	10.329,44	2.174,72	82,61
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.298,03				1.072,25	1.072,25	225,78	1,15	1.492,73	-	1.233,09	259,64	82,61
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								10.882,55	-	10.333,50	10.333,50	549,05	94,95	
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	157,97				150,00	150,00	7,97	68,89	10.882,55	-	10.333,50	549,05	94,95
04.004	LIMPEZA								846,56	-	-	-	846,56	-	
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.924,00				-	1.924,00	0,44	846,56	-	-	846,56	-	
05	TRECHO 04								192.551,28	-	-	-	192.551,28	-	
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.527,54	-	-	-	7.527,54	-	
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.037,53				-	2.037,53	1,21	2.465,41	-	-	2.465,41	-	
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	m2	2.176,09				-	2.176,09	1,02	2.219,61	-	-	2.219,61	-	
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,03				-	680,03	0,73	496,42	-	-	496,42	-	
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.040,09				-	2.040,09	1,15	2.346,10	-	-	2.346,10	-	
05.002	PAVIMENTAÇÃO								165.036,43	-	-	-	165.036,43	-	
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.760,41				-	1.760,41	68,89	121.274,64	-	-	121.274,64	-	
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	923,74				-	923,74	29,33	27.093,29	-	-	27.093,29	-	
05.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	923,74				-	923,74	2,94	2.715,80	-	-	2.715,80	-	
05.002.004	Colchão de areia	m3	123,23				-	123,23	101,15	12.464,71	-	-	12.464,71	-	
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.293,90				-	1.293,90	1,15	1.487,99	-	-	1.487,99	-	


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Honório Teves de Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Obra

1.487,99
José Cristiano Silva Weber
Eng. Civil - CREA 2720293354

José Cristiano Silva Weber
Eng. Civil

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 162/2022						
			B.M.Nº. 02/2023					ORDEN DE SERVIÇO: 02/05/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 01/06/2023 A 22/06/2023					DATA: 23/06/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				SALDO	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL							19.090,80	-	-	-	-	19.090,80	-
05.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	277,12			-	277,12	68,89	19.090,80	-	-	-	19.090,80	-
05.004	LIMPEZA								896,51	-	-	-	896,51	-
05.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.037,53			-	2.037,53	0,44	896,51	-	-	-	896,51	-
06	EQUIPE DIRIGENTE								60.801,80	7.828,14	13.622,31	21.450,45	39.351,35	35,28
06.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	220,00	26,74	48,70	75,44	144,56	112,59	24.769,80	3.010,66	5.483,13	8.493,79	16.276,01	34,29
06.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	800,00	106,96	180,71	287,67	512,33	45,04	36.032,00	4.817,48	8.139,18	12.956,66	23.075,34	35,96
Total geral									852.819,58	113.555,33	192.528,76	306.084,09	546.735,49	35,89
<p>  José Cristiano Silva Weber Engenheiro Civil DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CREA: 270099334 </p>			<p> Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__ </p>					<p> Aprovado para pagamento Data: __/__/__ </p>						


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Honique Santos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


José F. Jhon Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293354
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA. 2706685387


MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2023

CONTRATO Nº: 162/2022	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,30m - Rev 02_02/2022 = 1,00 mês
03	TRECHO 02
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação: $[(6,20 + 6,00) / 2,00] \times 30,00 = 183,00\text{m}^2$ $[(6,00 + 6,00) / 2,00] \times 30,00 = 180,00\text{m}^2$ $[(6,00 + 6,00) / 2,00] \times 7,05 = 42,30\text{m}^2$ Total = 405,30m²
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019 = $405,30 + (108,08 \times 0,15) =$ 421,51m²
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria = $421,51 \times 0,25 \times 1,25 =$ 131,72m³
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ = $131,72 \times 1,50 \times 2,00 =$ 395,17TKm
03.002	PAVIMENTAÇÃO
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = $405,30 - 32,42 =$ 372,88m²
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 = $(30,00 + 24,04) \times 2,00 =$ 108,08m
03.002.004	Colchão de areia = $372,88 \times 0,07 =$ 26,10m³
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ = $26,10 \times 1,50 \times 7,00 =$ 274,07TKm
03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = $108,08 \times 0,30 =$ 32,42m²
04	TRECHO 03
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES
	Locação de serviços de pavimentação: $[(6,00 + 6,00) / 2,00] \times 23,00 = 138,00\text{m}^2$ $[(6,00 + 6,20) / 2,00] \times 17,00 = 103,70\text{m}^2$ $[(6,20 + 7,00) / 2,00] \times 30,00 = 198,00\text{m}^2$ $[(7,00 + 6,00) / 2,00] \times 24,00 = 156,00\text{m}^2$ $[(6,00 + 6,00) / 2,00] \times 20,00 = 120,00\text{m}^2$ $[(6,00 + 6,15) / 2,00] \times 30,00 = 182,25\text{m}^2$ $[(6,15 + 5,90) / 2,00] \times 30,00 = 180,75\text{m}^2$


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santona
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nucleo


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Cristiano Silva Weber
 Engenheiro Civil
 CREA 2705685387

MEMÓRIA DE CÁLCULO


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2023

CONTRATO Nº: 162/2022	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
04.001.001	$[(5,90 + 6,70) / 2,00] \times 30,00 = 189,00\text{m}^2$ $[(6,70 + 6,75) / 2,00] \times 30,00 = 201,75\text{m}^2$ $[(6,75 + 7,00) / 2,00] \times 16,00 = 110,00\text{m}^2$ $[(13,00 + 6,60) / 2,00] \times 3,00 = 29,40\text{m}^2$ Total = 1.608,85m²
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019 = $1.608,85 + (500,00 \times 0,15) =$ 1.683,85m²
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria = $1.683,85 \times 0,25 \times 1,25 =$ 526,20m³
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ = $526,20 \times 1,50 \times 2,00 =$ 1.578,61TKm
04.002	PAVIMENTAÇÃO
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = $1.608,85 - 150,00 =$ 1.458,85 m²
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 = $(23,00 + 17,00 + 30,00 + 24,00 + 20,00 + 4 \times 30,00 + 16,00) \times 2,00 =$ 500,00m
04.002.004	Colchão de areia = $1.458,85 \times 0,07 =$ 102,12m³
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ = $102,12 \times 1,50 \times 7,00 =$ 1.072,25TKM
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico = $500,00 \times 0,30 =$ 150,00m²
06	EQUIPE DIRIGENTE
06.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares = $(178.906,48 \times 220,00) / 792.017,78 =$ 48,70h
06.002	Mestre de obras com encargos complementares = $(178.906,87 \times 800,00) / 792.017,78 =$ 180,71h

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santos
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Jose Robson Santos da Paiva
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA 2706685387



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO
RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
162/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 23/06/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
01/06/2023 A 22/06/2023



PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 02




PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 02



PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 02



PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 02

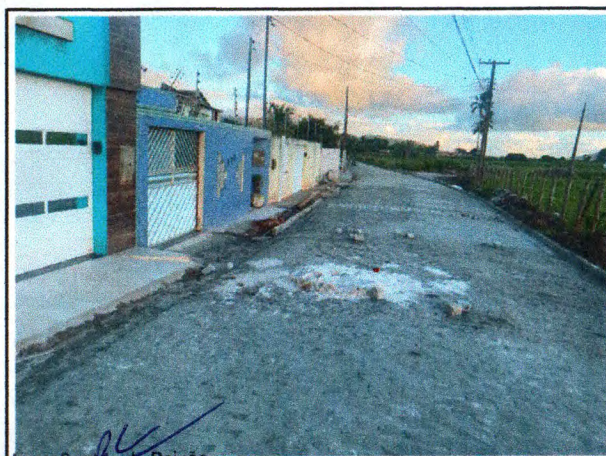

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 02




PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santos
Eng. Civil - CREC/SE 27156800553
Coordenador de Núcleo

José Reisson Canas da Paixão
Eng. Civil - CREC/SE 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREC/SE 1708895207



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 162/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2

DATA DA MEDIÇÃO: 23/06/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/06/2023 A 22/06/2023




PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03




PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03



PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03

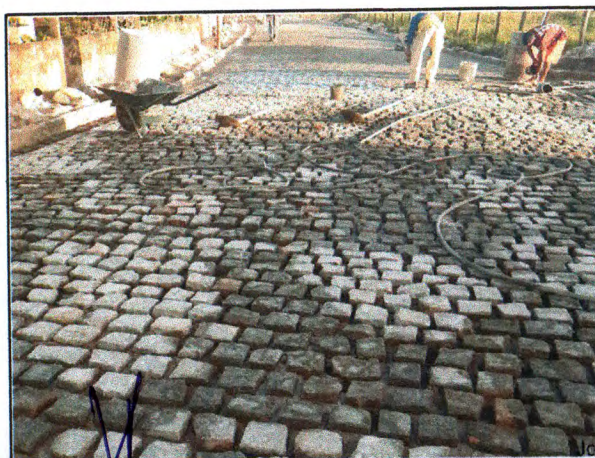

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03

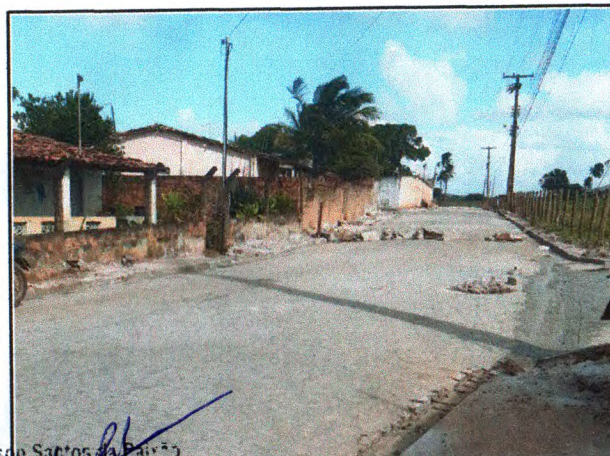

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03



PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Santos
Eng. Civil - CREA Nº 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil - CREA Nº 2710293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA Nº 2000092907
