





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 31/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 14/12/2023 A 20/12/2023				DATA: 20/12/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.162.180,37	27.082,58	1.189.262,95	1.092.969,55	52,11	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	25.564,13	595,63	26.159,76	44,52	2.226.000,00	1.138.115,07	26.517,45	1.164.632,52	1.061.367,48	52,32	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	25,55	0,60	26,15	941,89	47.094,50	24.065,30	565,13	24.630,43	22.464,07	52,30	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	60.769,08	1.650,75	62.419,83	56.800,17	52,36	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	255,88	6,00	261,88	123,60	61.800,00	31.626,77	741,60	32.368,37	29.431,63	52,38	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	609,03	19,00	628,03	47,85	57.420,00	29.142,31	909,15	30.051,46	27.368,54	52,34	
Total geral								2.401.452,50	1.222.949,45	28.733,33	1.251.682,78	1.149.769,72	52,12	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603														


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Teófilo Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



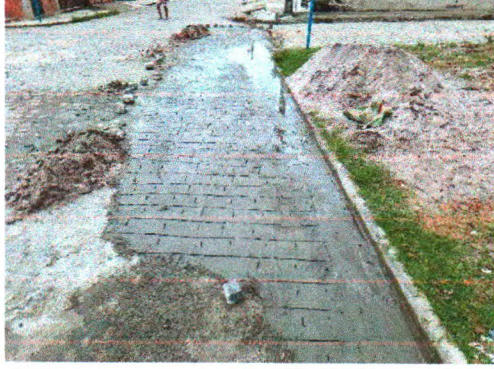
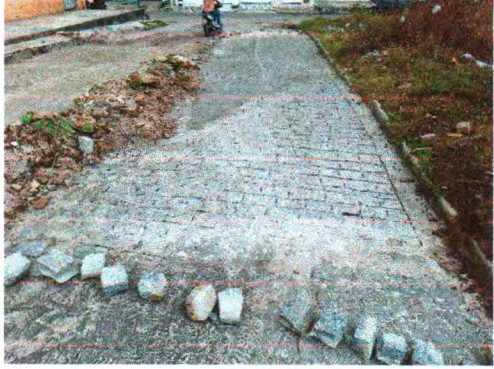


Item		Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 31/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 14/12/2023 A 20/12/2023		DATA: 20/12/2023			
1	14/12/2023		RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTOVÃO	17,00	2,00	34,00
2	14/12/2023		RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTOVÃO	5,00	3,00	15,00
3	14/12/2023		RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,90	2,30	29,67
4	15/12/2023		RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,60	4,40	29,04
5	15/12/2023		RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	15,90	2,80	44,52
6	15/12/2023		RUA ANTÔNIO MENEZES	RIACHO DOCE	41,50	2,00	83,00
7	18/12/2023		RUA CINTURA FINA	LUIZ GONZAGA	11,90	5,00	59,50
8	18/12/2023		RUA CINTURA FINA	LUIZ GONZAGA	15,50	2,50	38,75
9	18/12/2023		RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	23,30	2,50	58,25
10	19/12/2023		RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	13,50	3,50	47,25
11	19/12/2023		RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	4,30	3,00	12,90
12	19/12/2023		RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	8,50	2,50	21,25
13	20/12/2023		RUA JOSÉ VIEIRA LIMA	ROTARY CLUB	9,00	9,00	81,00
14	20/12/2023		AV. ANTÔNIO BISPO SOUZA	MARCELA	7,00	4,00	28,00
15	20/12/2023		AV. ANTÔNIO BISPO SOUZA	MARCELA	3,00	4,50	13,50
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>							595,63

MAYKON DOUGLAS SANTOS
 Assinado de forma digital por
 MAYKON DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 SANTANA:066412115
 Dados: 2023.12.21 11:09:12
 -03'00
 25

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Soares Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 31/2023

 <p>RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS</p>	 <p>RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS</p>
 <p>RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS</p>	 <p>RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS</p>
 <p>RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS</p>	 <p>RUA ANTÔNIO MENEZES</p>

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA.06641211525
Dados: 2023.12.21 11:07:59
-03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA CINTURA FINA



RUA CINTURA FINA



RUA TRISTE PARTIDA



RUA TRISTE PARTIDA



RUA TRISTE PARTIDA



RUA TRISTE PARTIDA

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.12.21 11:07:59
-03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2705638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA JOSÉ VIEIRA LIMA



AV. ANTÔNIO BISPO SOUZA



AV. ANTÔNIO BISPO SOUZA
