



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RJAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 06/9/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº: 32/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 21/12/2023 A 27/12/2023				DATA: 27/12/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.287.232,50	1.185.262,95	3.696,07	1.193.959,02	1.083.273,48	52,53	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	26.159,76	213,56	26.373,32	44,52	2.226.000,00	1.164.632,52	9.507,69	1.174.140,21	1.051.859,79	52,75	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejunte do com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	26,15	0,20	26,35	941,89	47.094,50	24.630,43	188,38	24.818,81	22.275,69	52,70	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							115.220,00	62.419,83	510,38	62.930,20	56.289,30	52,78	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	261,88	2,00	263,88	123,60	61.800,00	32.368,37	247,20	32.615,57	29.184,43	52,78	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	328,03	5,50	633,53	47,85	57.420,00	30.051,46	263,18	30.314,63	27.105,37	52,79	
Total geral								2.401.452,50	1.251.682,78	10.206,45	1.261.889,22	1.139.563,28	52,55	


MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603


Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.12.28 11:22:55 -01'00'

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/__

Aprovado para pagamento
Data: __/__/__


Documento assinado digitalmente
 JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
 Data: 28/12/2023 12:08:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Documento assinado digitalmente
 YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
 Data: 28/12/2023 12:13:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE C/NO NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 32/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 21/12/2023 A 27/12/2023		DATA: 27/12/2023		
						
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	21/12/2023	RUA ANTÔNIO MENÉZES	RIACHO DOCE	36,20	1,80	65,16
2	22/12/2023	RUA ACAUÁ	LUIZ GONZAGA	7,00	7,60	53,20
3	26/12/2023	RUA ACAUÁ	LUIZ GONZAGA	4,00	7,20	28,80
4	27/12/2023	AV. DR. WELLINGTON MENDES	LUIZ GONZAGA	2,00	3,80	7,60
5	27/12/2023	AV. DR. WELLINGTON MENDES	LUIZ GONZAGA	7,00	3,40	58,80
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>						213,56

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:066541211525
Data: 2023.12.28 11:21:36 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 28/12/2023 12:08:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 28/12/2023 12:13:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 32/2023**




RUA ANTÔNIO MENEZES



RUA ACAUA



RUA ACAUA

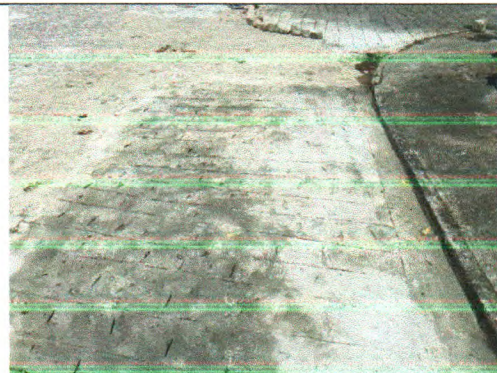

AV. DR. WELLINGTON MENDES



AV. DR. WELLINGTON MENDES

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.12.28
11:22:07 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 28/12/2023 12:08:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 28/12/2023 12:13:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
