



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 37/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				PERÍODO: 01/02/2024 A 08/02/2024				DATA: 08/02/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.312.137,74	32.706,60	1.344.844,34	937.388,16	58,93	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	28.861,57	719,84	29.581,41	44,52	2.226.000,00	1.284.917,11	32.047,28	1.316.964,39	909.035,61	59,16	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	28,90	0,70	29,60	30,46	47.094,50	27.220,63	659,32	27.879,95	19.214,55	59,20	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	68.843,35	1.701,78	70.545,13	48.674,87	59,17	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	288,88	6,80	295,68	123,60	61.800,00	35.705,57	840,48	36.546,05	25.253,95	59,14	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	692,53	18,00	710,53	47,85	57.420,00	33.137,78	861,30	33.999,08	23.420,92	59,21	
Total geral								2.401.452,50	1.380.981,09	34.408,38	1.415.389,47	986.063,03	58,94	
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.02.08 16:29:01 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__			Aprovado para pagamento Data: __/__/__				

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298354
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 37/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 01/02/2024 A 08/02/2024	DATA: 08/02/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	01/02/2024	RUA MARCELINO RENATO BISPO	SERRANO	7,00	4,00	28,00
2	01/02/2024	RUA MARCELINO RENATO BISPO	SERRANO	12,50	2,50	31,25
3	01/02/2024	RUA MARCELINO RENATO BISPO	SERRANO	8,50	2,00	17,00
4	02/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	7,00	3,50	24,50
5	02/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	10,40	8,00	83,20
6	05/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	8,50	7,50	63,75
7	05/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	16,00	4,00	64,00
8	05/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	9,50	2,20	20,90
9	06/02/2024	RUA MARIA DOS ANJOS BISPO	SERRANO	11,50	2,00	23,00
10	06/02/2024	RUA MARIA DOS ANJOS BISPO	SERRANO	10,40	1,80	18,72
11	07/02/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	30,00	1,90	57,00
12	07/02/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	9,60	4,20	40,32
13	07/02/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	9,50	7,00	66,50
14	07/02/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	7,20	5,50	39,60
15	08/02/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	8,20	3,30	27,06
16	08/02/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	6,20	3,20	19,84
17	08/02/2024	RUA MONSENHOR ERALDO BARBOSA	SERRANO	34,00	2,80	95,20
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						719,84


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Van Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06
 641211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.02.08
 16:30:26 -03'00'



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 37/2024**



RUA MARCELINO RENATO BISPO



RUA MARCELINO RENATO BISPO



RUA MARCELINO RENATO BISPO



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Douglas Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298054
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.08
16:29:30 -03'00'




RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA MARIA DOS ANJOS BISPO

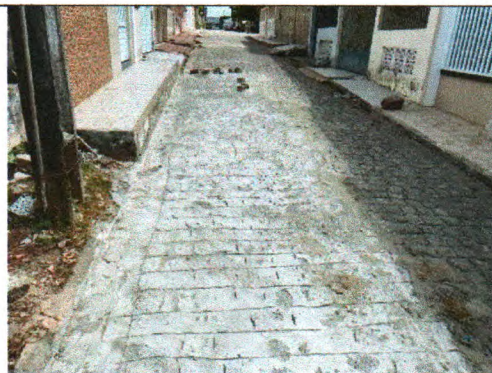

RUA MARIA DOS ANJOS BISPO



RUA MARIA FELIX DA SILVA



RUA TRISTE PARTIDA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.02.08
16:29:48 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 272029054
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA TRISTE PARTIDA



RUA TRISTE PARTIDA



RUA TRISTE PARTIDA



RUA TRISTE PARTIDA



RUA MONSENHOR ERALDO BARBOSA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 em Henrique Cavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:0664
 1211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:0664121152
 5
 Dados: 2024.02.08
 16:30:03 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
