

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2								3.151.999,37	303.984,24	252.126,04	556.110,28	2.595.889,09	17,64
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								367.395,48	57.255,20	25.898,14	83.153,34	284.242,14	22,63
01.001	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af. 03/2022 ps	m2	10,00	6,00		6,00	4,00	408,68	4.086,80	2.452,08	-	2.452,08	1.634,72	60,00
01.002	Tapume com telha metálica. af. 03/2024	m2	99,00	99,00		99,00	-	112,34	11.121,66	11.121,66	-	11.121,66	-	100,00
01.003	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af. 07/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	2.191,47	2.191,47	2.191,47	-	2.191,47	-	100,00
01.004	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	-		-	1,00	2.184,56	2.184,56	-	-	-	2.184,56	-
01.005	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af. 03/2024	m	127,78	127,78		127,78	-	72,91	9.316,44	9.316,44	-	9.316,44	-	100,00
01.006	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)	MÊS	8,00	-		-	8,00	1.019,56	8.156,48	-	-	-	8.156,48	-
01.007	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00	1,00	1,00	2,00	6,00	796,53	6.372,24	796,53	796,53	1.593,06	4.779,18	25,00
01.008	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00			-	8,00	1.274,45	10.195,60	-	-	-	10.195,60	-
01.009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	un	1,00	0,10	0,08	0,18	0,82	313.770,23	313.770,23	31.377,02	25.101,61	56.478,63	257.291,60	-
02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDações								47.662,56	21.622,41	-	21.622,41	26.040,15	45,38
02.001	EDIFICAÇÃO								45.310,07	21.622,41	-	21.622,41	23.887,66	47,72
02.001.001	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af. 03/2024	m2	1.575,00	1.575,00		1.575,00	-	0,80	1.260,00	1.260,00	-	1.260,00	-	100,00
02.001.002	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af. 08/2023	m3	158,44	-		-	158,44	83,94	13.299,45	-	-	-	13.299,45	-
02.001.003	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af. 01/2024	m3	250,58	166,83		166,83	83,75	108,41	27.165,38	18.086,04	-	18.086,04	9.079,34	66,57
02.001.004	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af. 08/2020	m2	107,09	107,09		107,09	-	3,55	380,17	380,17	-	380,17	-	100,00
02.001.005	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af. 08/2023	m3	210,86	124,75		124,75	86,11	15,20	3.205,07	1.896,20	-	1.896,20	1.308,87	59,16
02.002	MURETA ABRIGO DE GÁS								1.920,91	-	-	-	1.920,91	-
02.002.001	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af. 01/2024	m3	15,68	-		-	15,68	108,41	1.699,87	-	-	-	1.699,87	-
02.002.002	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af. 08/2020	m2	13,37	-		-	13,37	3,55	47,46	-	-	-	47,46	-
02.002.003	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af. 08/2023	m3	11,42	-		-	11,42	15,20	173,58	-	-	-	173,58	-
02.003	CASTELO D'ÁGUA								11,58	-	-	-	431,58	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024- FNDE		DATA DE TÉRMINO				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA						VIGÊNCIA		24/07/2026	Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						EXECUÇÃO		24/07/2026	Data da Medição:05/03/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.003.001	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	m3	3,65	-		-	3,65	108,41	395,70	-	-	-	395,70	-
02.003.002	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	4,84	-		-	4,84	3,55	17,18	-	-	-	17,18	-
02.003.003	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	1,23	-		-	1,23	15,20	18,70	-	-	-	18,70	-
03	FUNDAÇÕES								156.413,36	132.964,95	-	132.964,95	23.448,41	85,00
03.001	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS								48.430,94	47.940,57	-	47.940,57	490,37	98,98
03.001.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	46,65	46,65		46,65	-	47,05	2.194,88	2.194,88	-	2.194,88	-	100,00
03.001.002	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	131,71	131,71		131,71	-	97,98	12.904,95	12.904,95	-	12.904,95	-	100,00
03.001.003	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	317,20	292,62		292,62	24,58	19,95	6.328,14	5.837,77	-	5.837,77	490,37	92,25
03.001.004	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	41,25	41,25		41,25	-	18,75	773,44	773,44	-	773,44	-	100,00
03.001.005	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	366,94	366,94		366,94	-	16,85	6.182,94	6.182,94	-	6.182,94	-	100,00
03.001.006	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	225,00	225,00		225,00	-	14,38	3.235,50	3.235,50	-	3.235,50	-	100,00
03.001.007	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	134,38	134,38		134,38	-	21,22	2.851,54	2.851,54	-	2.851,54	-	100,00
03.001.008	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	15,55	15,55		15,55	-	897,72	13.959,55	13.959,55	-	13.959,55	-	100,00
03.002	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME								85.024,38	85.024,38	-	85.024,38	-	100,00
03.002.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	60,44	60,44		60,44	-	47,05	2.843,70	2.843,70	-	2.843,70	-	100,00
03.002.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	m3	3,89	3,89		3,89	-	941,41	3.662,08	3.662,08	-	3.662,08	-	100,00
03.002.003	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	349,55	349,55		349,55	-	97,98	34.248,91	34.248,91	-	34.248,91	-	100,00
03.002.004	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	660,10	660,10		660,10	-	18,75	12.376,88	12.376,88	-	12.376,88	-	100,00
03.002.005	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	113,60	113,60		113,60	-	16,85	1.914,16	1.914,16	-	1.914,16	-	100,00
03.002.006	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	26,41	26,41		26,41	-	14,38	379,78	379,78	-	379,78	-	100,00
03.002.007	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	356,91	356,91		356,91	-	24,70	8.815,68	8.815,68	-	8.815,68	-	100,00

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.002.008	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	24,18	24,18		24,18	-	859,52	20.783,19	20.783,19	-	20.783,19	-	100,00
03.003	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA								9.587,35	-	-	-	9.587,35	-
03.003.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa	m	35,00	-		-	35,00	75,10	2.628,50	-	-	-	2.628,50	-
03.003.002	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. af_05/2021	un	5,00	-		-	5,00	19,45	97,25	-	-	-	97,25	-
03.003.003	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	4,84	-		-	4,84	47,05	227,72	-	-	-	227,72	-
03.003.004	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	4,40	-		-	4,40	157,81	694,36	-	-	-	694,36	-
03.003.005	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	116,61	-		-	116,61	18,33	2.137,46	-	-	-	2.137,46	-
03.003.006	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	83,78	-		-	83,78	14,38	1.204,76	-	-	-	1.204,76	-
03.003.007	Armação de bloco e sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. af_01/2024	kg	13,87	-		-	13,87	14,00	194,18	-	-	-	194,18	-
03.003.008	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	13,08	-		-	13,08	24,70	323,08	-	-	-	323,08	-
03.003.009	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	2,42	-		-	2,42	859,52	2.080,04	-	-	-	2.080,04	-
03.004	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS								2.912,40	-	-	-	2.912,40	-
03.004.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pa	m	17,50	-		-	17,50	75,10	1.314,25	-	-	-	1.314,25	-
03.004.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	1,25	-		-	1,25	47,05	58,81	-	-	-	58,81	-
03.004.003	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	5,00	-		-	5,00	157,81	789,05	-	-	-	789,05	-
03.004.004	Armação de descida d'água utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_08/2022	kg	10,19	-		-	10,19	20,49	208,79	-	-	-	208,79	-
03.004.005	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	0,63	-		-	0,63	859,52	541,50	-	-	-	541,50	-
03.005	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME								10.458,29	-	-	-	10.458,29	-
03.005.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	13,25	-		-	13,25	47,05	623,41	-	-	-	623,41	-
03.005.002	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	44,97	-		-	44,97	114,02	5.127,48	-	-	-	5.127,48	-
03.005.003	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	84,20	-		-	84,20	18,75	1.578,75	-	-	-	1.578,75	-
03.005.004	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	3,64	-		-	3,64	859,52	3.128,65	-	-	-	3.128,65	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
									372.898,10	27.346,88	62.473,14	89.819,82	283.076,28	24,08
04	SUPERESTRUTURA								62.522,33	27.346,88	28.140,05	55.486,73	7.035,60	88,74
04.001	CONCRETO ARMADO - PILARES													
04.001.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	333,34	66,66	213,34	280,00	53,34	70,75	23.583,81	4.716,19	15.093,80	19.809,99	3.773,82	83,99
04.001.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	839,33	671,46	134,29	805,75	33,58	14,99	12.581,56	10.065,18	2.013,00	12.078,18	503,38	95,99
04.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	312,88	250,30	50,06	300,36	12,52	12,68	3.967,32	3.173,80	634,76	3.808,56	158,76	95,99
04.001.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	450,22	360,17	72,04	432,21	18,01	18,19	8.189,50	6.551,49	1.310,40	7.861,89	327,61	95,99
04.001.005	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	18,25	3,65	11,68	15,33	2,92	778,09	14.200,14	2.840,02	9.088,09	11.928,11	2.272,03	83,99
04.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS								61.468,21	-	34.333,09	34.333,09	27.135,12	55,85
04.002.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	344,10	-	172,05	172,05	172,05	70,75	24.345,08	-	12.172,53	12.172,53	12.172,55	49,99
04.002.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	675,91	-	473,13	473,13	202,78	16,61	11.226,87	-	7.858,68	7.858,68	3.368,19	69,99
04.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	9,64	-	6,74	6,74	2,90	14,99	144,50	-	101,03	101,03	43,47	69,91
04.002.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	365,31	-	255,71	255,71	109,60	18,19	6.644,99	-	4.651,36	4.651,36	1.993,63	69,99
04.002.005	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	24,55	-	12,27	12,27	12,28	778,28	19.106,77	-	9.549,49	9.549,49	9.557,28	49,97
04.003	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS								4.233,73	-	-	-	4.233,73	-
04.003.001	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	124,12	-	-	-	124,12	34,11	4.233,73	-	-	-	4.233,73	-
04.004	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES								2.842,84	-	-	-	2.842,84	-
04.004.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	18,00	-	-	-	18,00	70,75	1.273,50	-	-	-	1.273,50	-
04.004.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	43,92	-	-	-	43,92	16,61	729,51	-	-	-	729,51	-
04.004.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	13,66	-	-	-	13,66	18,19	248,48	-	-	-	248,48	-
04.004.004	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	0,76	-	-	-	0,76	778,09	591,35	-	-	-	591,35	-
04.005	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE								3.638,66	-	-	-	3.638,66	-
04.005.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	19,24	-	-	-	19,24	70,75	1.361,23	-	-	-	1.361,23	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.005.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	15,26	-		-	15,26	17,49	266,90	-	-	-	266,90	-
04.005.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	19,45	-		-	19,45	16,61	323,06	-	-	-	323,06	-
04.005.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	28,01	-		-	28,01	14,99	419,87	-	-	-	419,87	-
04.005.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	17,06	-		-	17,06	18,19	310,32	-	-	-	310,32	-
04.005.006	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	1,23	-		-	1,23	778,28	957,28	-	-	-	957,28	-
04.006	ESTRUTURA METÁLICA								150.246,30	-	-	-	150.246,30	-
04.006.001	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	kg	9.693,31	-		-	9.693,31	15,50	150.246,30	-	-	-	150.246,30	-
04.007	PISO DE CONCRETO								87.946,03	-	-	-	87.946,03	-
04.007.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM								66.366,17	-	-	-	66.366,17	-
04.007.001.001	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	m2	783,72	-		-	783,72	3,83	3.001,65	-	-	-	3.001,65	-
04.007.001.002	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	m3	39,19	-		-	39,19	314,75	12.335,05	-	-	-	12.335,05	-
04.007.001.003	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	m2	783,72	-		-	783,72	4,64	3.636,46	-	-	-	3.636,46	-
04.007.001.004	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional. não armado. af_08/2022	m3	54,86	-		-	54,86	863,89	47.393,01	-	-	-	47.393,01	-
04.007.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM								21.579,86	-	-	-	21.579,86	-
04.007.002.001	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	m2	254,80	-		-	254,80	3,83	975,88	-	-	-	975,88	-
04.007.002.002	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	m3	12,74	-		-	12,74	314,75	4.009,91	-	-	-	4.009,91	-
04.007.002.003	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	m2	254,80	-		-	254,80	4,64	1.182,27	-	-	-	1.182,27	-
04.007.002.004	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional. não armado. af_08/2022	m3	17,84	-		-	17,84	863,89	15.411,80	-	-	-	15.411,80	-
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								205.227,27	-	126.384,76	126.384,76	78.842,51	61,58
05.001	ELEMENTOS VAZADOS								1.505,72	-	-	-	1.505,72	-
05.001.001	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m2	6,10	-		-	6,10	246,84	1.505,72	-	-	-	1.505,72	-
05.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								185.974,58	-	126.384,76	126.384,76	59.589,82	67,95
05.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	572,77	-	400,93	400,93	171,84	58,50	33.507,04	-	23.454,40	23.454,40	10.052,64	69,99

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026				
Item		Discriminação dos Serviços		Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
				Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
05.002.002		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021		m2	1.038,00	-	726,60	726,60	311,40	98,88	102.637,44	-	71.846,20	71.846,20	30.791,24	69,99
05.002.003		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021		m2	564,11	-	394,87	394,87	169,24	78,72	44.406,74	-	31.084,16	31.084,16	13.322,58	69,99
05.002.004		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020		m2	9,72	-	-	-	9,72	139,98	1.360,61	-	-	-	1.360,61	-
05.002.005		Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. af_03/2024		m	311,80	-	-	-	311,80	13,03	4.062,75	-	-	-	4.062,75	-
05.003		ALVENARIA DA MURETA									4.955,42	-	-	-	4.955,42	-
05.003.001		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021		m2	62,95	-	-	-	62,95	78,72	4.955,42	-	-	-	4.955,42	-
05.004		DIVISÓRIAS									12.791,55	-	-	-	12.791,55	-
05.004.001		Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021		m2	8,06	-	-	-	8,06	938,13	7.561,33	-	-	-	7.561,33	-
05.004.002		INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U		M2	7,20	-	-	-	7,20	683,06	4.918,03	-	-	-	4.918,03	-
05.004.003		Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023 ps		m2	3,60	-	-	-	3,60	86,72	312,19	-	-	-	312,19	-
06		ESQUADRIA									339.967,02	-	-	-	339.967,02	-
06.001		PORTAS DE MADEIRA									39.824,20	-	-	-	39.824,20	-
06.001.001		PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	6,00	-	-	-	6,00	1.310,70	7.864,20	-	-	-	7.864,20	-
06.001.002		PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	3,00	-	-	-	3,00	1.889,87	5.669,61	-	-	-	5.669,61	-
06.001.003		PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	6,00	-	-	-	6,00	1.425,65	8.553,90	-	-	-	8.553,90	-
06.001.004		PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	3,00	-	-	-	3,00	811,88	2.435,64	-	-	-	2.435,64	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:05/03/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
06.001.005	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	-		-	5,00	1.889,87	9.449,35	-	-	-	9.449,35	-		
06.001.006	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	UN	4,00	-		-	4,00	1.324,45	5.297,80	-	-	-	5.297,80	-		
06.001.007	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	1,80	-		-	1,80	307,61	553,70	-	-	-	553,70	-		
06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS								6.434,18	-	-	-	6.434,18	-		
06.002.001	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af. 12/2019	un	4,00	-		-	4,00	98,88	395,52	-	-	-	395,52	-		
06.002.002	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	8,00	-		-	8,00	397,44	3.179,52	-	-	-	3.179,52	-		
06.002.003	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	12,80	-		-	12,80	223,37	2.859,14	-	-	-	2.859,14	-		
06.003	PORTAS EM ALUMÍNIO								44.630,31	-	-	-	44.630,31	-		
06.003.001	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	-		-	1,00	835,10	835,10	-	-	-	835,10	-		
06.003.002	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	-		-	1,68	713,58	1.198,81	-	-	-	1.198,81	-		
06.003.003	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36	-		-	3,36	713,58	2.397,63	-	-	-	2.397,63	-		
06.003.004	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	83,48	-		-	83,48	464,10	38.743,07	-	-	-	38.743,07	-		
06.003.005	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,04	-		-	2,04	713,58	1.455,70	-	-	-	1.455,70	-		
06.004	JANELAS EM ALUMÍNIO								61.522,14	-	-	-	61.522,14	-		
06.004.001	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	-		-	0,88	863,59	759,96	-	-	-	759,96	-		
06.004.002	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,15	-		-	2,15	863,59	1.856,72	-	-	-	1.856,72	-		

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO						BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
06.004.003	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61	-		-	1,61	941,65	1.516,06	-	-	-	1.516,06	-	
06.004.004	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,73	-		-	2,73	863,59	2.357,60	-	-	-	2.357,60	-	
06.004.005	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,16	-		-	2,16	941,65	2.033,96	-	-	-	2.033,96	-	
06.004.006	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	-		-	1,05	863,59	906,77	-	-	-	906,77	-	
06.004.007	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	-		-	12,60	863,59	10.881,23	-	-	-	10.881,23	-	
06.004.008	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	-		-	8,40	863,59	7.254,16	-	-	-	7.254,16	-	
06.004.009	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	-		-	6,30	863,59	5.440,62	-	-	-	5.440,62	-	
06.004.010	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	-		-	1,05	863,59	906,77	-	-	-	906,77	-	
06.004.011	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	-		-	5,25	863,59	4.533,85	-	-	-	4.533,85	-	
06.004.012	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,20	-		-	4,20	863,59	3.627,08	-	-	-	3.627,08	-	
06.004.013	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	-		-	16,80	863,59	14.508,31	-	-	-	14.508,31	-	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.004.014	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,72	-		-	2,72	941,65	2.561,29	-	-	-	2.561,29	-
06.004.015	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,28	-		-	10,28	231,30	2.377,76	-	-	-	2.377,76	-
06.005	PORTAS DE VIDRO								1.646,20	-	-	-	1.646,20	-
06.005.001	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	1,00	-		-	1,00	1.646,20	1.646,20	-	-	-	1.646,20	-
06.006	ESQUADRIA GERAL								185.909,99	-	-	-	185.909,99	-
06.006.001	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	-		-	3,08	1.187,67	3.658,02	-	-	-	3.658,02	-
06.006.002	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,94	-		-	2,94	435,23	1.279,58	-	-	-	1.279,58	-
06.006.003	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	116,76	-		-	116,76	1.161,92	135.665,78	-	-	-	135.665,78	-
06.006.004	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	71,89	-		-	71,89	323,80	23.277,98	-	-	-	23.277,98	-
06.006.005	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,30	-		-	6,30	1.331,84	8.390,59	-	-	-	8.390,59	-
06.006.006	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00	-		-	4,00	1.331,84	5.327,36	-	-	-	5.327,36	-
06.006.007	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24	-		-	6,24	1.331,84	8.310,68	-	-	-	8.310,68	-
07	SISTEMAS DE COBERTURA								269.705,54	-	-	-	269.705,54	-
07.001	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST C/ ESP. DE 0,50 MM, C/ PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS 2 FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) C/ ESP. DE 50 MM	M2	850,66	-		-	850,66	259,62	220.848,35	-	-	-	220.848,35	-
07.002	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	M	69,15	-		-	69,15	205,81	14.231,76	-	-	-	14.231,76	-
07.003	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,60	-		-	93,60	73,59	6.888,02	-	-	-	6.888,02	-
07.004	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,70	-		-	45,70	73,59	3.363,06	-	-	-	3.363,06	-
07.005	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,60	-		-	126,60	73,59	9.316,49	-	-	-	9.316,49	-
07.006	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	233,60	-		-	233,60	64,46	15.057,86	-	-	-	15.057,86	-
08	IMPERMEABILIZAÇÃO								33.968,80	25.764,97	-	25.764,97	8.203,83	75,84
08.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M	394,02	394,02		394,02	-	65,39	25.764,97	25.764,97	-	25.764,97	-	100,00
08.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	125,46	-		-	125,46	65,39	8.203,83	-	-	-	8.203,83	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
09	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								294.929,90	-	18.838,20	18.838,20	276.091,70	8,38
09.001	EDIFICAÇÃO								289.880,33	-	18.838,20	18.838,20	271.042,13	6,49
09.001.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m2	2.569,60	-	1.284,80	1.284,80	1.284,80	5,60	14.389,76	-	7.194,88	7.194,88	7.194,88	50,00
09.001.002	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af. 03/2024	m2	1.599,78	-	317,95	317,95	1.271,83	36,62	58.217,74	-	11.643,32	11.643,32	46.574,42	19,99
09.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 08/2022	m2	979,82	-	-	979,82	45,90	44.973,74	-	-	-	-	44.973,74	-
09.001.004	Massa única, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicada com equipamento de mistura e projeção de argamassa em paredes internas, e = 5mm, sem taliscas. af. 03/2024	m2	1.024,77	-	-	1.024,77	32,47	33.274,28	-	-	-	-	33.274,28	-
09.001.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af. 02/2023 pe	m2	456,39	-	-	456,39	75,91	34.644,56	-	-	-	-	34.644,56	-
09.001.006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	94,00	-	-	94,00	67,98	6.390,12	-	-	-	-	6.390,12	-
09.001.007	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,60	-	-	4,60	67,98	312,71	-	-	-	-	312,71	-
09.001.008	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	9,71	-	-	9,71	67,98	660,09	-	-	-	-	660,09	-
09.001.009	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,92	-	-	4,92	67,98	334,46	-	-	-	-	334,46	-
09.001.010	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	127,20	-	-	127,20	43,27	5.503,94	-	-	-	-	5.503,94	-
09.001.011	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bircional de fixação. af. 08/2023 ps	m2	438,37	-	-	438,37	103,08	45.187,18	-	-	-	-	45.187,18	-
09.001.012	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	259,43	-	-	259,43	177,28	45.991,75	-	-	-	-	45.991,75	-
09.002	MURETA								5.049,57	-	-	-	5.049,57	-
09.002.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m2	98,05	-	-	98,05	5,60	549,08	-	-	-	-	549,08	-
09.002.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 08/2022	m2	98,05	-	-	98,05	45,90	4.500,49	-	-	-	-	4.500,49	-
10	SISTEMAS DE PISOS								158.398,44	-	-	-	158.398,44	-
10.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA								129.854,86	-	-	-	129.854,86	-
10.001.001	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	282,92	-	-	282,92	47,43	13.418,90	-	-	-	-	13.418,90	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.001.002	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af. 09/2020	m2	375,34	-		-	375,34	54,07	20.294,63	-	-	-	20.294,63	-
10.001.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af. 07/2021	m2	125,46	-		-	125,46	56,96	7.146,20	-	-	-	7.146,20	-
10.001.004	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 02/2023. pe	m2	42,90	-		-	42,90	72,92	3.128,27	-	-	-	3.128,27	-
10.001.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 02/2023. pe	m2	148,95	-		-	148,95	61,79	9.203,62	-	-	-	9.203,62	-
10.001.006	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	M2	216,53	-		-	216,53	255,36	55.293,10	-	-	-	55.293,10	-
10.001.007	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	216,53	-		-	216,53	4,31	933,24	-	-	-	933,24	-
10.001.008	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af. 02/2023	m	68,00	-		-	68,00	13,52	919,36	-	-	-	919,36	-
10.001.009	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af. 09/2020	m	127,20	-		-	127,20	76,47	9.726,98	-	-	-	9.726,98	-
10.001.010	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af. 09/2020	m	53,45	-		-	53,45	122,53	6.549,23	-	-	-	6.549,23	-
10.001.011	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,75	-		-	1,75	122,53	214,43	-	-	-	214,43	-
10.001.012	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af. 05/2021	m2	37,42	-		-	37,42	80,89	3.026,90	-	-	-	3.026,90	-
10.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								28.543,58	-	-	-	28.543,58	-
10.002.001	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af. 09/2020	m2	254,80	-		-	254,80	51,19	13.043,21	-	-	-	13.043,21	-
10.002.002	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	m2	27,74	-		-	27,74	103,11	2.860,27	-	-	-	2.860,27	-
10.002.003	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	4,88	-		-	4,88	242,27	1.182,28	-	-	-	1.182,28	-
10.002.004	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	7,50	-		-	7,50	242,27	1.817,03	-	-	-	1.817,03	-
10.002.005	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	21,96	-		-	21,96	159,22	3.496,47	-	-	-	3.496,47	-
10.002.006	Plantio de grama batatais em placas. af. 07/2024	m2	344,81	-		-	344,81	16,88	5.820,39	-	-	-	5.820,39	-
10.002.007	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af. 01/2024	m	8,06	-		-	8,06	40,19	323,93	-	-	-	323,93	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS								147.716,94	-	-	-	147.716,94	-
11.001	PINTURA EDIFICAÇÃO								103.835,66	-	-	-	103.835,66	-
11.001.001	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af. 04/2023	m2	2.004,59	-		-	2.004,59	19,14	38.367,85	-	-	-	38.367,85	-
11.001.002	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.902,96	-		-	1.902,96	15,85	30.161,92	-	-	-	30.161,92	-
11.001.003	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af. 01/2021	m2	126,01	-		-	126,01	19,95	2.513,90	-	-	-	2.513,90	-
11.001.004	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	12,72	-		-	12,72	19,95	253,76	-	-	-	253,76	-
11.001.005	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	101,63	-		-	101,63	151,84	15.431,50	-	-	-	15.431,50	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido			
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir				
11.001.006	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af. 01/2020	m2	593,16	-		-	593,16	28,84	17.106,73	-	-	-	17.106,73	-			
11.002	PINTURA DE FORROS								18.374,88	-	-	-	18.374,88	-			
11.002.001	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af. 04/2023	m2	442,55	-		-	442,55	23,05	10.200,78	-	-	-	10.200,78	-			
11.002.002	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af. 04/2023	m2	442,55	-		-	442,55	18,47	8.173,90	-	-	-	8.173,90	-			
11.003	PINTURA - DIVERSOS								25.506,60	-	-	-	25.506,60	-			
11.003.001	ESTRUTURA METÁLICA								22.097,40	-	-	-	22.097,40	-			
11.003.001.001	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af. 01/2020	m2	1.285,48	-		-	1.285,48	17,19	22.097,40	-	-	-	22.097,40	-			
11.003.002	MURETA								3.409,20	-	-	-	3.409,20	-			
11.003.002.001	Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af. 03/2024	m2	98,05	-		-	98,05	18,76	1.839,42	-	-	-	1.839,42	-			
11.003.002.002	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af. 04/2023	m2	98,05	-		-	98,05	16,01	1.569,78	-	-	-	1.569,78	-			
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								87.852,90	-	-	-	87.852,90	-			
12.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO								33.154,64	-	-	-	33.154,64	-			
12.001.001	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	27,60	-		-	27,60	12,00	331,20	-	-	-	331,20	-			
12.001.002	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	166,90	-		-	166,90	26,40	4.406,16	-	-	-	4.406,16	-			
12.001.003	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	81,05	-		-	81,05	33,03	2.677,08	-	-	-	2.677,08	-			
12.001.004	Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	11,00	-		-	11,00	31,74	349,14	-	-	-	349,14	-			
12.001.005	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	134,60	-		-	134,60	51,63	6.949,40	-	-	-	6.949,40	-			
12.001.006	Tubo, pvc, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	54,55	-		-	54,55	71,06	3.876,32	-	-	-	3.876,32	-			
12.001.007	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4"	un	3,00	-		-	3,00	27,42	82,26	-	-	-	82,26	-			
12.001.008	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	6,00	-		-	6,00	254,60	1.527,60	-	-	-	1.527,60	-			
12.001.009	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 85 mm x 3", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	2,00	-		-	2,00	357,40	714,80	-	-	-	714,80	-			
12.001.010	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	4,00	-		-	4,00	6,33	25,32	-	-	-	25,32	-			
12.001.011	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	72,00	-		-	72,00	7,15	514,80	-	-	-	514,80	-			
12.001.012	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	40,00	-		-	40,00	19,13	765,20	-	-	-	765,20	-			
12.001.013	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	6,00	-		-	6,00	33,01	198,06	-	-	-	198,06	-			

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2028		Data da Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.001.014	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	-		-	2,00	44,03	88,06	-	-	-	88,06	-
12.001.015	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	6,00	-		-	6,00	22,41	134,46	-	-	-	134,46	-
12.001.016	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-		-	2,00	16,44	32,88	-	-	-	32,88	-
12.001.017	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-		-	4,00	16,44	65,76	-	-	-	65,76	-
12.001.018	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	30,00	-		-	30,00	16,01	480,30	-	-	-	480,30	-
12.001.019	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	-		-	1,00	21,36	21,36	-	-	-	21,36	-
12.001.020	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,00	-		-	5,00	31,40	157,00	-	-	-	157,00	-
12.001.021	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00	-		-	3,00	6,85	20,55	-	-	-	20,55	-
12.001.022	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	-		-	2,00	18,58	37,16	-	-	-	37,16	-
12.001.023	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00	-		-	8,00	88,77	710,16	-	-	-	710,16	-
12.001.024	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	-		-	2,00	108,48	216,96	-	-	-	216,96	-
12.001.025	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	-		-	4,00	8,90	35,60	-	-	-	35,60	-
12.001.026	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	-		-	4,00	8,90	35,60	-	-	-	35,60	-
12.001.027	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	28,00	-		-	28,00	15,82	442,96	-	-	-	442,96	-
12.001.028	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	-		-	4,00	44,66	178,64	-	-	-	178,64	-
12.001.029	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	26,00	-		-	26,00	116,29	3.023,54	-	-	-	3.023,54	-
12.001.030	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	6,00	-		-	6,00	140,29	841,74	-	-	-	841,74	-
12.001.031	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	47,00	-		-	47,00	14,40	676,80	-	-	-	676,80	-
12.001.032	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	12,00	-		-	12,00	14,40	172,80	-	-	-	172,80	-
12.001.033	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00	-		-	17,00	14,67	249,39	-	-	-	249,39	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026	Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026	Data da Medição:05/03/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
12.001.034	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	14,00	-	-	-	14,00	24,92	348,88	-	-	-	348,88	-	
12.001.035	Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	7,00	-	-	-	7,00	86,75	607,25	-	-	-	607,25	-	
12.001.036	Te, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	4,00	-	-	-	4,00	113,69	454,76	-	-	-	454,76	-	
12.001.037	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	10,00	-	-	-	10,00	21,97	219,70	-	-	-	219,70	-	
12.001.038	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	2,00	-	-	-	2,00	65,89	131,78	-	-	-	131,78	-	
12.001.039	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	13,00	-	-	-	13,00	65,89	856,57	-	-	-	856,57	-	
12.001.040	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	-	-	-	3,00	32,64	97,92	-	-	-	97,92	-	
12.001.041	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	8,00	-	-	-	8,00	24,46	195,68	-	-	-	195,68	-	
12.001.042	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	9,00	-	-	-	9,00	22,56	203,04	-	-	-	203,04	-	
12.002	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS								7.261,20	-	-	-	7.261,20	-	
12.002.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	3,00	-	-	-	3,00	346,87	1.040,61	-	-	-	1.040,61	-	
12.002.002	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	-	-	-	1,00	420,99	420,99	-	-	-	420,99	-	
12.002.003	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	-	-	-	2,00	98,83	197,66	-	-	-	197,66	-	
12.002.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	8,00	-	-	-	8,00	198,92	1.591,36	-	-	-	1.591,36	-	
12.002.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	30,00	-	-	-	30,00	112,35	3.370,50	-	-	-	3.370,50	-	
12.002.006	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	6,00	-	-	-	6,00	106,68	640,08	-	-	-	640,08	-	
12.003	RESERVATÓRIO 15.000 L								47.437,06	-	-	-	47.437,06	-	
12.003.001	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	UN	1,00	-	-	-	1,00	47.437,06	47.437,06	-	-	-	47.437,06	-	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								17.160,35	-	-	-	17.160,35	-	
13.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								11.285,71	-	-	-	11.285,71	-	
13.001.001	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	m	246,60	-	-	-	246,60	32,31	7.967,65	-	-	-	7.967,65	-	
13.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	m	3,00	-	-	-	3,00	68,07	204,21	-	-	-	204,21	-	
13.001.003	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	un	11,00	-	-	-	11,00	47,65	524,15	-	-	-	524,15	-	
13.001.004	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	un	47,00	-	-	-	47,00	46,64	2.192,08	-	-	-	2.192,08	-	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
13.001.005	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 06/2022	un	4,00	-		-	4,00	81,34	325,36	-	-	-	325,36	-
13.001.006	Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	un	1,00	-		-	1,00	72,26	72,26	-	-	-	72,26	-
13.002	ACESSÓRIOS								5.874,64	-	-	-	5.874,64	-
13.002.001	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af 12/2020	un	9,00	-		-	9,00	601,71	5.415,39	-	-	-	5.415,39	-
13.002.002	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af 06/2022	un	11,00	-		-	11,00	41,75	459,25	-	-	-	459,25	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								68.182,02	36.586,35	-	36.586,35	31.595,67	53,65
14.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES								36.586,35	36.586,35	-	36.586,35	-	100,00
14.001.001	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	149,30	149,30		149,30	-	40,53	6.051,13	6.051,13	-	6.051,13	-	100,00
14.001.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	115,30	115,30		115,30	-	23,27	2.683,03	2.683,03	-	2.683,03	-	100,00
14.001.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	173,10	173,10		173,10	-	29,11	5.038,94	5.038,94	-	5.038,94	-	100,00
14.001.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	69,55	69,55		69,55	-	36,12	2.512,15	2.512,15	-	2.512,15	-	100,00
14.001.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	32,00	32,00		32,00	-	11,49	367,68	367,68	-	367,68	-	100,00
14.001.006	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	31,00	31,00		31,00	-	17,17	532,27	532,27	-	532,27	-	100,00
14.001.007	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	9,00	9,00		9,00	-	25,51	229,59	229,59	-	229,59	-	100,00
14.001.008	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	6,00	6,00		6,00	-	30,76	184,56	184,56	-	184,56	-	100,00
14.001.009	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	12,00	12,00		12,00	-	29,94	359,28	359,28	-	359,28	-	100,00
14.001.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	28,00	28,00		28,00	-	24,56	687,68	687,68	-	687,68	-	100,00
14.001.011	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	18,00	18,00		18,00	-	16,45	296,10	296,10	-	296,10	-	100,00
14.001.012	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	106,00	106,00		106,00	-	11,27	1.194,62	1.194,62	-	1.194,62	-	100,00
14.001.013	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	14,00	14,00		14,00	-	56,31	788,34	788,34	-	788,34	-	100,00
14.001.014	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	8,00	8,00		8,00	-	56,31	450,48	450,48	-	450,48	-	100,00

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
14.001.015	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	1,00		1,00	-	43,44	43,44	43,44	-	43,44	-	100,00
14.001.016	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_ 08/2022	un	9,00	9,00		9,00	-	20,83	187,47	187,47	-	187,47	-	100,00
14.001.017	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_ 06/2022	un	1,00	1,00		1,00	-	32,92	32,92	32,92	-	32,92	-	100,00
14.001.018	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_ 12/2020	un	16,00	16,00		16,00	-	601,71	9.627,36	9.627,36	-	9.627,36	-	100,00
14.001.019	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_ 08/2022	un	19,00	19,00		19,00	-	108,30	2.057,70	2.057,70	-	2.057,70	-	100,00
14.001.020	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_ 06/2022	un	12,00	12,00		12,00	-	86,35	1.036,20	1.036,20	-	1.036,20	-	100,00
14.001.021	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	4,00		4,00	-	86,35	345,40	345,40	-	345,40	-	100,00
14.001.022	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_ 08/2022	un	13,00	13,00		13,00	-	26,27	341,51	341,51	-	341,51	-	100,00
14.001.023	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_ 06/2022	un	1,00	1,00		1,00	-	54,71	54,71	54,71	-	54,71	-	100,00
14.001.024	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_ 06/2022	un	12,00	12,00		12,00	-	21,25	255,00	255,00	-	255,00	-	100,00
14.001.025	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_ 08/2022	un	15,00	15,00		15,00	-	19,64	294,60	294,60	-	294,60	-	100,00
14.001.026	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	3,00		3,00	-	109,40	328,20	328,20	-	328,20	-	100,00
14.001.027	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	9,00	9,00		9,00	-	23,20	208,80	208,80	-	208,80	-	100,00
14.001.028	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	9,00	9,00		9,00	-	11,16	100,44	100,44	-	100,44	-	100,00
14.001.029	Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_ 08/2022	un	25,00	25,00		25,00	-	11,87	296,75	296,75	-	296,75	-	100,00
14.002	UNIDADE DE TRATAMENTO								31.595,67	-	-	-	31.595,67	-
14.002.001	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_ 12/2020	un	1,00	-		-	1,00	12.787,73	12.787,73	-	-	-	12.787,73	-
14.002.002	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_ 12/2020_pa	un	1,00	-		-	1,00	9.452,92	9.452,92	-	-	-	9.452,92	-
14.002.003	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_ 12/2020	un	1,00	-		-	1,00	9.355,02	9.355,02	-	-	-	9.355,02	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS								67.255,32	-	-	-	67.255,32	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITAIBAIA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
15.001	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	4,00	-		-	4,00	359,29	1.437,16	-	-	-	1.437,16	-
15.002	Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af 01/2020	un	9,00	-		-	9,00	636,98	5.732,82	-	-	-	5.732,82	-
15.003	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af 01/2020	un	4,00	-		-	4,00	51,89	207,56	-	-	-	207,56	-
15.004	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af 01/2020	un	9,00	-		-	9,00	103,70	933,30	-	-	-	933,30	-
15.005	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	2,00	-		-	2,00	467,48	934,96	-	-	-	934,96	-
15.006	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	-		-	3,00	173,45	520,35	-	-	-	520,35	-
15.007	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	13,00	-		-	13,00	169,94	2.209,22	-	-	-	2.209,22	-
15.008	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	3,00	-		-	3,00	372,37	1.117,11	-	-	-	1.117,11	-
15.009	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	5,00	-		-	5,00	838,82	4.194,10	-	-	-	4.194,10	-
15.010	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	5,00	-		-	5,00	267,94	1.339,70	-	-	-	1.339,70	-
15.011	CUBA DE EMBUTIR RETÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	-		-	6,00	267,94	1.607,64	-	-	-	1.607,64	-
15.012	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	-		-	1,00	293,60	293,60	-	-	-	293,60	-
15.013	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	24,00	-		-	24,00	96,11	2.306,64	-	-	-	2.306,64	-
15.014	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	38,00	-		-	38,00	13,20	501,60	-	-	-	501,60	-
15.015	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	9,00	-		-	9,00	146,98	1.322,82	-	-	-	1.322,82	-
15.016	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	-		-	16,00	161,81	2.588,96	-	-	-	2.588,96	-
15.017	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	-		-	2,00	274,27	548,54	-	-	-	548,54	-
15.018	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	7,00	-		-	7,00	62,23	435,61	-	-	-	435,61	-
15.019	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	3,00	-		-	3,00	388,89	1.166,67	-	-	-	1.166,67	-
15.020	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI	UN	2,00	-		-	2,00	157,34	314,68	-	-	-	314,68	-
15.021	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	25,00	-		-	25,00	77,16	1.929,00	-	-	-	1.929,00	-
15.022	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	8,00	-		-	8,00	132,45	1.059,60	-	-	-	1.059,60	-
15.023	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	-		-	9,00	397,44	3.576,96	-	-	-	3.576,96	-
15.024	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	5,00	-		-	5,00	422,61	2.113,05	-	-	-	2.113,05	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
15.025	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_ 01/2020	un	7,00	-		-	7,00	439,35	3.075,45	-	-	-	3.075,45	-	
15.026	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_ 01/2020	un	1,00	-		-	1,00	1.393,34	1.393,34	-	-	-	1.393,34	-	
15.027	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	-		-	13,00	459,43	5.972,59	-	-	-	5.972,59	-	
15.028	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	17,00	-		-	17,00	117,31	1.994,27	-	-	-	1.994,27	-	
15.029	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	9,00	-		-	9,00	89,26	803,34	-	-	-	803,34	-	
15.030	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_ 01/2020	un	14,00	-		-	14,00	98,05	1.372,70	-	-	-	1.372,70	-	
15.031	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	7,50	-		-	7,50	691,11	5.183,32	-	-	-	5.183,32	-	
15.032	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	10,00	-		-	10,00	210,51	2.105,10	-	-	-	2.105,10	-	
15.033	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	107,00	-		-	107,00	52,14	5.578,98	-	-	-	5.578,98	-	
15.034	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	M	9,70	-		-	9,70	142,74	1.384,58	-	-	-	1.384,58	-	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								4.622,23	-	-	-	4.622,23	-	
16.001	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	-		-	1,00	823,94	823,94	-	-	-	823,94	-	
16.002	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_ 08/2021	un	2,00	-		-	2,00	54,01	108,02	-	-	-	108,02	-	
16.003	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	m	45,80	-		-	45,80	47,20	2.161,76	-	-	-	2.161,76	-	
16.004	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	-		-	1,00	18,22	18,22	-	-	-	18,22	-	
16.005	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	-		-	4,00	31,43	125,72	-	-	-	125,72	-	
16.006	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_ 08/2021	un	2,00	-		-	2,00	62,29	124,58	-	-	-	124,58	-	
16.007	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_ 08/2021	un	4,00	-		-	4,00	73,45	293,80	-	-	-	293,80	-	
16.008	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	1,00	-		-	1,00	52,06	52,06	-	-	-	52,06	-	
16.009	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	8,00	-		-	8,00	28,24	225,92	-	-	-	225,92	-	
16.010	Curva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	2,00	-		-	2,00	60,63	121,26	-	-	-	121,26	-	
16.011	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	6,00	-		-	6,00	60,63	363,78	-	-	-	363,78	-	
16.012	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	2,00	-		-	2,00	41,21	82,42	-	-	-	82,42	-	
16.013	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	-		-	0,24	503,13	120,75	-	-	-	120,75	-	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								44.391,76	-	10.824,97	10.824,97	33.566,79	24,38	
17.001	EXTINTORES								3.518,34	-	-	-	3.518,34	-	

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025								
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026	Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026	Data de Medição:05/03/2026										
Item							Quantidades							Unit.	Valores (R\$)					% Medido
							Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado		Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
17.001.001							un	6,00	-	-	6,00	302,32	1.813,92	-	-	-	1.813,92	-		
17.001.002							un	2,00	-	-	2,00	852,21	1.704,42	-	-	-	1.704,42	-		
17.002													7.015,04	-	-	-	7.015,04	-		
17.002.001							un	1,00	-	-	1,00	2.889,14	2.889,14	-	-	-	2.889,14	-		
17.002.002							un	1,00	-	-	1,00	4.125,90	4.125,90	-	-	-	4.125,90	-		
17.003													20.805,43	-	-	-	20.805,43	-		
17.003.001							un	5,00	-	-	5,00	346,87	1.734,35	-	-	-	1.734,35	-		
17.003.002							un	3,00	-	-	3,00	678,62	2.035,86	-	-	-	2.035,86	-		
17.003.003							un	1,00	-	-	1,00	197,58	197,58	-	-	-	197,58	-		
17.003.004							UN	1,00	-	-	1,00	5.346,02	5.346,02	-	-	-	5.346,02	-		
17.003.005							UN	1,00	-	-	1,00	598,27	598,27	-	-	-	598,27	-		
17.003.006							UN	1,00	-	-	1,00	3.435,23	3.435,23	-	-	-	3.435,23	-		
17.003.007							un	2,00	-	-	2,00	1.369,41	2.738,82	-	-	-	2.738,82	-		
17.003.008							UN	1,00	-	-	1,00	4.719,30	4.719,30	-	-	-	4.719,30	-		
17.004													10.824,97	-	10.824,97	10.824,97	-	100,00		
17.004.001							un	7,00	-	7,00	-	155,73	1.090,11	-	1.090,11	1.090,11	-	100,00		
17.004.002							m	63,00	-	63,00	-	132,51	8.348,13	-	8.348,13	8.348,13	-	100,00		
17.004.003							un	1,00	-	1,00	-	169,49	169,49	-	169,49	169,49	-	100,00		
17.004.004							un	2,00	-	2,00	-	96,68	193,36	-	193,36	193,36	-	100,00		
17.004.005							un	4,00	-	4,00	-	255,97	1.023,88	-	1.023,88	1.023,88	-	100,00		
17.005													2.227,98	-	-	-	2.227,98	-		
17.005.001							un	36,00	-	-	36,00	19,34	696,24	-	-	-	696,24	-		
17.005.002							UN	34,00	-	-	34,00	31,11	1.057,74	-	-	-	1.057,74	-		
17.005.003							m2	5,00	-	-	5,00	94,80	474,00	-	-	-	474,00	-		
18													260.008,81	-	7.706,72	7.706,72	262.302,09	2,96		
18.001													3.598,98	-	-	-	3.598,98	-		
18.001.001							un	1,00	-	-	1,00	422,96	422,96	-	-	-	422,96	-		

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
18.001.002	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	-	-	-	2,00	582,21	1.164,42	-	-	-	1.164,42	-
18.001.003	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	-	-	-	3,00	610,59	1.831,77	-	-	-	1.831,77	-
18.001.004	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	-	-	-	1,00	179,83	179,83	-	-	-	179,83	-
18.002	DISJUNTORES								14.394,39	-	-	-	14.394,39	-
18.002.001	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	57,00	-	-	-	57,00	13,58	774,06	-	-	-	774,06	-
18.002.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	8,00	-	-	-	8,00	14,30	114,40	-	-	-	114,40	-
18.002.003	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	-	-	-	4,00	15,75	63,00	-	-	-	63,00	-
18.002.004	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	18,00	-	-	-	18,00	70,31	1.265,58	-	-	-	1.265,58	-
18.002.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	-	-	-	4,00	73,76	295,04	-	-	-	295,04	-
18.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	-	-	-	1,00	78,27	78,27	-	-	-	78,27	-
18.002.007	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	-	-	-	2,00	89,05	178,10	-	-	-	178,10	-
18.002.008	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	-	-	-	2,00	112,88	225,76	-	-	-	225,76	-
18.002.009	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	8,00	-	-	-	8,00	182,37	1.458,96	-	-	-	1.458,96	-
18.002.010	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	-	-	-	2,00	1.576,19	3.152,38	-	-	-	3.152,38	-
18.002.011	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	1,00	-	-	-	1,00	180,63	180,63	-	-	-	180,63	-
18.002.012	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA	UN	5,00	-	-	-	5,00	339,45	1.697,25	-	-	-	1.697,25	-
18.002.013	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	UN	24,00	-	-	-	24,00	131,39	3.153,36	-	-	-	3.153,36	-
18.002.014	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	UN	8,00	-	-	-	8,00	219,70	1.757,60	-	-	-	1.757,60	-
18.003	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS								28.167,66	-	7.706,72	7.706,72	20.460,94	27,36
18.003.001	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023 pa	m	408,30	-	204,15	204,15	204,15	19,03	7.769,95	-	3.884,97	3.884,97	3.884,98	49,99
18.003.002	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023 pa	m	174,40	-	87,20	87,20	87,20	21,91	3.821,10	-	1.910,55	1.910,55	1.910,55	50,00
18.003.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	334,90	-	-	-	334,90	19,19	6.426,73	-	-	-	6.426,73	-
18.003.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	10,20	-	-	-	10,20	28,19	287,54	-	-	-	287,54	-
18.003.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	40,00	-	40,00	40,00	-	47,78	1.911,20	-	1.911,20	1.911,20	-	100,00
18.003.006	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,80	-	-	-	29,80	28,22	840,96	-	-	-	840,96	-
18.003.007	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af 12/2020	un	11,00	-	-	-	11,00	185,88	2.044,68	-	-	-	2.044,68	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:05/03/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
18.003.008	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	100,00	-		-	100,00	16,91	1.691,00	-	-	-	1.691,00	-		
18.003.009	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	170,00	-		-	170,00	19,85	3.374,50	-	-	-	3.374,50	-		
18.004	CABOS E FIOS CONDUTORES								175.932,62	-	-	-	175.932,62	-		
18.004.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.858,00	-		-	2.858,00	5,23	14.947,34	-	-	-	14.947,34	-		
18.004.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.309,30	-		-	2.309,30	8,08	18.659,14	-	-	-	18.659,14	-		
18.004.003	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.412,10	-		-	2.412,10	11,33	27.329,09	-	-	-	27.329,09	-		
18.004.004	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	143,60	-		-	143,60	20,37	2.925,13	-	-	-	2.925,13	-		
18.004.005	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	25,10	-		-	25,10	29,38	737,44	-	-	-	737,44	-		
18.004.006	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	47,90	-		-	47,90	34,13	1.634,83	-	-	-	1.634,83	-		
18.004.007	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	38,90	-		-	38,90	47,27	1.838,80	-	-	-	1.838,80	-		
18.004.008	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	191,40	-		-	191,40	68,73	13.154,92	-	-	-	13.154,92	-		
18.004.009	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	187,20	-		-	187,20	95,22	17.825,18	-	-	-	17.825,18	-		
18.004.010	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	167,80	-		-	167,80	160,12	26.868,14	-	-	-	26.868,14	-		
18.004.011	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	159,80	-		-	159,80	312,97	50.012,61	-	-	-	50.012,61	-		
18.005	ELETROCALHAS								19.464,77	-	-	-	19.464,77	-		
18.005.001	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,20	-		-	75,20	233,00	17.521,60	-	-	-	17.521,60	-		
18.005.002	Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023	m	75,20	-		-	75,20	25,84	1.943,17	-	-	-	1.943,17	-		
18.006	ILUMINAÇÃO E TOMADAS								18.450,39	-	-	-	18.450,39	-		
18.006.001	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	95,00	-		-	95,00	33,67	3.198,65	-	-	-	3.198,65	-		
18.006.002	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	23,00	-		-	23,00	35,83	824,09	-	-	-	824,09	-		
18.006.003	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	34,00	-		-	34,00	61,75	2.099,50	-	-	-	2.099,50	-		
18.006.004	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	3,00	-		-	3,00	39,14	117,42	-	-	-	117,42	-		


		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: Nº 215/2025				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026	Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026	Data da Medição:05/03/2026						
Item		Discriminação dos Serviços		Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
				Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
18.006.005		Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023		un	2,00	-	-	-	2,00	85,39	170,78	-	-	-	170,78	-
18.006.006		Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023		un	1,00	-	-	-	1,00	65,57	65,57	-	-	-	65,57	-
18.006.007		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES		UN	10,00	-	-	-	10,00	14,23	142,30	-	-	-	142,30	-
18.006.008		Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção		UN	8,00	-	-	-	8,00	98,43	787,44	-	-	-	787,44	-
18.006.009		Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		un	11,00	-	-	-	11,00	68,33	751,63	-	-	-	751,63	-
18.006.010		Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção		UN	81,00	-	-	-	81,00	98,43	7.972,83	-	-	-	7.972,83	-
18.006.011		Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un	9,00	-	-	-	9,00	104,54	940,86	-	-	-	940,86	-
18.006.012		Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un	4,00	-	-	-	4,00	104,54	418,16	-	-	-	418,16	-
18.006.013		Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un	1,00	-	-	-	1,00	164,92	164,92	-	-	-	164,92	-
18.006.014		Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 09/2024		un	8,00	-	-	-	8,00	99,53	796,24	-	-	-	796,24	-
19		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									15.010,61	2.443,64	-	2.443,64	12.566,97	16,27
19.001		DUTOS									12.566,97	-	-	-	12.566,97	-
19.001.001		Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023		m	22,60	-	-	-	22,60	5,88	132,89	-	-	-	132,89	-
19.001.002		Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023		m	132,40	-	-	-	132,40	8,65	1.145,26	-	-	-	1.145,26	-
19.001.003		Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af 12/2015		m	16,90	-	-	-	16,90	34,12	576,63	-	-	-	576,63	-
19.001.004		Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af 12/2015		m	154,90	-	-	-	154,90	57,85	8.960,97	-	-	-	8.960,97	-
19.001.005		Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022		un	138,00	-	-	-	138,00	12,69	1.751,22	-	-	-	1.751,22	-
19.002		DRENO									2.443,64	2.443,64	-	2.443,64	-	100,00
19.002.001		Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022		m	63,90	63,90	-	63,90	-	28,98	1.851,82	1.851,82	-	1.851,82	-	100,00
19.002.002		Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022		un	12,00	12,00	-	12,00	-	19,58	234,96	234,96	-	234,96	-	100,00
19.002.003		Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022		un	14,00	14,00	-	14,00	-	19,52	273,28	273,28	-	273,28	-	100,00
19.002.004		Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022		un	3,00	3,00	-	3,00	-	27,86	83,58	83,58	-	83,58	-	100,00
20		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO									36.888,74	-	-	-	36.888,74	-
20.001		ACESSÓRIOS CABEAMENTO									14.630,18	-	-	-	14.630,18	-
20.001.001		Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af 11/2019		un	3,00	-	-	-	3,00	1.422,12	4.266,36	-	-	-	4.266,36	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:05/03/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
20.001.002	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UN	1,00	-	-	-	1,00	3.591,25	3.591,25	-	-	-	3.591,25	-
20.001.003	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	19,00	-	-	-	19,00	61,48	1.168,12	-	-	-	1.168,12	-
20.001.004	GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)	UN	3,00	-	-	-	3,00	30,85	92,55	-	-	-	92,55	-
20.001.005	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00	-	-	-	2,00	215,45	430,90	-	-	-	430,90	-
20.001.006	Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af 11/2019	un	3,00	-	-	-	3,00	1.645,00	4.935,00	-	-	-	4.935,00	-
20.001.007	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	4,00	-	-	-	4,00	36,50	146,00	-	-	-	146,00	-
20.002	CAIXAS E QUADROS								1.279,47	-	-	-	1.279,47	-
20.002.001	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af 12/2020	un	4,00	-	-	-	4,00	185,88	743,52	-	-	-	743,52	-
20.002.002	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	27,00	-	-	-	27,00	19,85	535,95	-	-	-	535,95	-
20.003	DISPOSITIVOS								1.298,51	-	-	-	1.298,51	-
20.003.001	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af 11/2019	un	19,00	-	-	-	19,00	47,49	902,31	-	-	-	902,31	-
20.003.002	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	-	-	-	8,00	27,45	219,60	-	-	-	219,60	-
20.003.003	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	10,00	-	-	-	10,00	17,66	176,60	-	-	-	176,60	-
20.004	ELETROCALHA E ELETRODUTOS								13.744,55	-	-	-	13.744,55	-
20.004.001	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM e ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,65	-	-	-	51,65	177,56	9.170,97	-	-	-	9.170,97	-
20.004.002	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023 pa	m	15,20	-	-	-	15,20	25,46	386,99	-	-	-	386,99	-
20.004.003	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023 pa	m	112,05	-	-	-	112,05	20,55	2.302,63	-	-	-	2.302,63	-
20.004.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	4,80	-	-	-	4,80	20,05	96,24	-	-	-	96,24	-
20.004.005	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UN	4,00	-	-	-	4,00	21,89	87,56	-	-	-	87,56	-
20.004.006	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,20	-	-	-	55,20	30,80	1.700,16	-	-	-	1.700,16	-
20.005	CABEAMENTO								5.936,03	-	-	-	5.936,03	-
20.005.001	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af 11/2019	m	579,00	-	-	-	579,00	9,05	5.239,95	-	-	-	5.239,95	-
20.005.002	Cabo coaxial rg59 95% - fornecimento e instalação. af 11/2019	m	113,00	-	-	-	113,00	6,16	696,08	-	-	-	696,08	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								11.651,59	-	-	-	11.651,59	-
21.001	DUTO DE ALCANTARAL PARA EXAUSTOR	M	4,00	-	-	-	4,00	145,14	580,56	-	-	-	580,56	-
21.002	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,00	-	-	-	1,00	11.071,03	11.071,03	-	-	-	11.071,03	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								51.303,90	-	-	-	51.303,90	-
22.001	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af 08/2023	un	1,00	-	-	-	1,00	199,31	199,31	-	-	-	199,31	-
22.002	Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	45,00	-	-	-	45,00	16,52	743,40	-	-	-	743,40	-
22.003	Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. af 08/2023	un	11,00	-	-	-	11,00	27,16	298,76	-	-	-	298,76	-
22.004	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af 08/2020	un	4,00	-	-	-	4,00	31,65	126,60	-	-	-	126,60	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: Nº 215/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:01/01/2026 a 31/01/2026		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026		Data de Medição:05/03/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
22.005	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,00	-		-	1,00	486,44	486,44	-	-	-	486,44	-	
22.006	Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	33,00	-		-	33,00	31,38	1.035,54	-	-	-	1.035,54	-	
22.007	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00	-		-	1,00	415,27	415,27	-	-	-	415,27	-	
22.008	Escavação manual de vala. af. 09/2024	m3	26,18	-		-	26,18	98,78	2.586,06	-	-	-	2.586,06	-	
22.009	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af. 08/2023	m3	26,18	-		-	26,18	30,57	800,32	-	-	-	800,32	-	
22.010	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	11,00	-		-	11,00	114,90	1.263,90	-	-	-	1.263,90	-	
22.011	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af. 08/2023	m	287,00	-		-	287,00	84,14	24.148,18	-	-	-	24.148,18	-	
22.012	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af. 08/2023	m	174,50	-		-	174,50	71,38	12.455,81	-	-	-	12.455,81	-	
22.013	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 12/2020	un	11,00	-		-	11,00	53,95	593,45	-	-	-	593,45	-	
22.014	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	251,00	-		-	251,00	17,66	4.432,66	-	-	-	4.432,66	-	
22.015	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	-		-	22,00	78,10	1.718,20	-	-	-	1.718,20	-	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								90.519,51	-	-	-	90.519,51	-	
23.001	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	-		-	1,00	5.242,51	5.242,51	-	-	-	5.242,51	-	
23.002	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,96	-		-	42,96	798,31	34.295,40	-	-	-	34.295,40	-	
23.003	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,89	-		-	26,89	704,35	18.939,97	-	-	-	18.939,97	-	
23.004	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	30,15	-		-	30,15	228,35	6.884,75	-	-	-	6.884,75	-	
23.005	Pelotril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af. 11/2020	m	79,65	-		-	79,65	145,82	11.614,56	-	-	-	11.614,56	-	
23.006	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	148,00	-		-	148,00	40,42	5.982,16	-	-	-	5.982,16	-	
23.007	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	4,12	-		-	4,12	238,24	981,55	-	-	-	981,55	-	
23.008	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	9,32	-		-	9,32	701,08	6.534,07	-	-	-	6.534,07	-	
23.009	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	2,00	-		-	2,00	22,27	44,54	-	-	-	44,54	-	
24	SERVIÇOS FINAIS								2.868,22	-	-	-	2.868,22	-	
24.001	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af. 04/2019	m2	891,68	-		-	891,68	2,30	2.050,86	-	-	-	2.050,86	-	
24.002	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af. 03/2022 ps	m2	2,00	-		-	2,00	408,68	817,36	-	-	-	817,36	-	
TOTAL:									3.151.999,37	303.984,24	252.126,04	556.110,28	2.595.889,09	17,63%	
PERCENTUAL									9,64%	7,99%	17,63%	82,37%			
 KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Dados: 2026.03.06 13:32:14 -03'00'							 SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO Documento assinado digitalmente Data: 06/03/2026 11:48:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br								
ASSINATURA DA EMPRESA							FISCAL DO CONTRATO								
							ENGª. KELLY PINTO FREIRE - CREA/SE 2722482487								

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 03	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				Período 01/01/2026 a 31/01/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data da medição: 05/03/2025	
Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	MEDIDO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.007	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev	mês	1,00	1,00 mês	
1.009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	un	0,08	531.008,56-31.337,02/3.151.999,37-	
04	SUPERESTRUTURA				
4.001	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.001.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações.	m2	213,34	Foi executado 80% do total	
4.001.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -	kg	134,29	Foi executado 80% do total	
4.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -	kg	50,06	Foi executado 80% do total	
4.001.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm -	kg	72,04	Foi executado 80% do total	
4.001.005	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	11,68	Foi executado 80% do total	
4.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.002.001	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em	m2	172,05	Foi executado 50% do total	
4.002.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -	kg	473,13	Foi executado 70% do total	
4.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -	kg	6,74	Foi executado 70% do total	
4.002.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm -	kg	255,71	Foi executado 70% do total	
4.002.005	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	12,27	Foi executado 50% do total	
5.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de	m2	400,93	Foi executado 70% do total	
5.002.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa	m2	726,6	Foi executado 70% do total	
5.002.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa	m2	394,87	Foi executado 70% do total	
9.001	EDIFICAÇÃO				
9.001.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3	m2	1284,8	Foi executado 50% do total	
9.001.002	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas.	m2	317,95	Foi executado 20% do total	
17.004	TUBULAÇÕES E CONEXÕES				
17.004.001	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação	un	7,00	Foi executado 100% do total	
17.004.002	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	m	63,00	Foi executado 100% do total	
17.004.003	Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação	un	1,00	Foi executado 100% do total	
17.004.004	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	Foi executado 100% do total	



 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil - CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362446

17.004.005	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	Foi executado 100% do total
18.003	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS			
18.003.001	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa	m	204,15	Foi executado 50% do total
18.003.002	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa	m	87,2	Foi executado 50% do total
18.003.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	40	Foi executado 100% do total
				Atestamos que os serviços constantes na NF -
				foram recebidos
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				Data:

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:7904588
0563

Assinado de forma digital
por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.03.16
14:12:50 -03'00'


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362446

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº Instrumento Transferegov
960753/2024

Conveniente / Recebedor
MUNICIPIO DE ITABAIANA

UF
SE

Objeto

Construção de Creche Pré-escola Tipo 2 no Bairro São Cristóvão – Itabaiana/SE

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF

Empresa executora

Data de assinatura

Valor vigente

215/2025

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS

13/10/2025

R\$ 3.151.999,37

Descrição da meta / submeta

Localidade / Endereço da obra

Construção de Creche Pré-financia/Supraestrutura- Al: Rua Projetada B, S/N Bairro São Cristóvão

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição
03

Data de fechamento
05/03/2026

Data da vistoria
05/03/2026

Valor medido no período
R\$ 252.126,04

Valor medido acumulado
R\$ 556.110,28

% Acum.
17,64%


4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ARMAÇÃO DO ARGOLAMENTO



CONCRETAGEM DOS PILARES

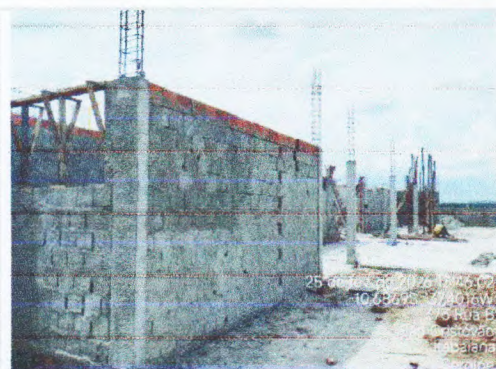


CHAPISCO




ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



FORMA DOS PILARES

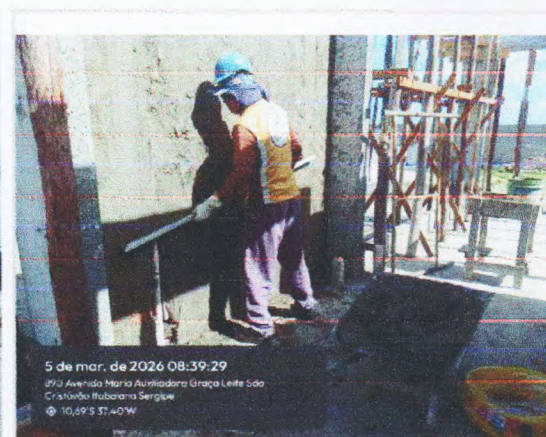

REBOCO

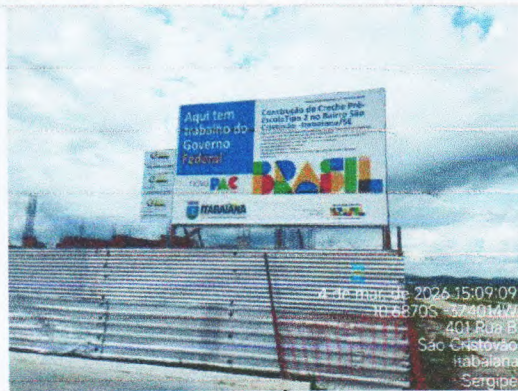

ENTRADA DE ENERGIA

PLACA DA OBRA



CONCRETAGEM DO ARGOLAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO- BLOCO DE 14

5 DATA E ASSINATURA

Observações

Itabaiana/SE 06/03/2026

Local e data



Documento assinado digitalmente

KELLY PINTO FREIRE

Data: 06/03/2026 11:18:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO

Data: 06/03/2026 11:48:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profissional responsável pela fiscalização

Nome: KELLY PINTO FREIRE- CREA/SE
2709362449
