

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS
PEDRAS


Bancos
ORSE - 11/2025 - Sergipe
B.D.I.
23,54%


Encargos
Não
Desonerado:


PERÍODO: 26/05/2026 a 03/07/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03


Orçamento Sintético											
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADE			VALOR		
						ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS PEDRAS				476.261,81				124.624,83	60.522,17	185.147,00
01.01	REFORMA QUADRA DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS PEDRAS				476.261,81				124.624,83	60.522,17	185.147,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				47.978,40				R\$ 7.248,00	R\$ 6.040,00	R\$ 13.288,00
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				47.978,40				R\$ 7.248,00	R\$ 6.040,00	R\$ 13.288,00
01.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00	158,22	37.972,80	30,00	25,00	55,00	4.746,60	3.955,50	8.702,10
01.01.003	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	83,38	10.005,60	30,00	25,00	55,00	2.501,40	2.084,50	4.585,90
01.02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
01.02.001	PLACA DE OBRA				4.669,30				R\$ 2.801,58	R\$ 0,00	R\$ 2.801,58
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	10,00	466,93	4.669,30	6,00		6,00	2.801,58	-	2.801,58
01.02.003	CANTEIRO DE OBRAS				36.269,97				R\$ 8.170,88	R\$ 0,00	R\$ 8.170,88
01.02.003.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10,00	310,88	3.108,80	10,00		10,00	3.108,80	-	3.108,80
01.02.003.002	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm - ver 03_10/2022	und	1,00	730,11	730,11			-	-	-	-
01.02.003.003	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	153,76	210,92	32.431,06	24,00		24,00	5.062,08	-	5.062,08
01.02.003	COBERTURA				29.649,60				R\$ 29.649,60	R\$ 0,00	R\$ 29.649,60
01.02.003.001	Recuperação de estrutura metálica de cobertura, com substituição de peças metálicas, solda e pintura em pilares, vigas e terças - obra reforma da quadra SEDUC	und	1,00	29.649,60	29.649,60	1,00		1,00	29.649,60	-	29.649,60
01.02.004	ARQUIBANCADA				16.346,98				R\$ 2.632,82	R\$ 9.599,91	R\$ 12.232,73
01.02.004.001	Demolição de reboco	m²	43,41	11,43	496,18	43,41		43,41	496,18	-	496,18
01.02.004.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	43,41	8,33	361,61	43,41		43,41	361,61	-	361,61
01.02.004.003	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5 (cimento / areia) com rebotec, espessura 2,0cm	m²	43,41	40,89	1.775,03	43,41		43,41	1.775,03	-	1.775,03
01.02.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - ver 03	m²	239,80	57,19	13.714,16		167,86	167,86	-	9.599,91	9.599,91



André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293399-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.02.005	PALCO				5.277,34			R\$ 866,27	R\$ 3.088,26	R\$ 3.954,53
01.02.005.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com rebotec, espessura 2,0cm	m²	17,60	40,89	719,66	17,60	17,60	719,66	-	719,66
01.02.005.002	Chapeco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	17,60	8,33	146,61	17,60	17,60	146,61	-	146,61
01.02.005.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - ver 03	m²	77,13	57,19	4.411,06	54,00	54,00	-	3.088,26	3.088,26
01.02.006	QUADRA				5.237,50			R\$ 3.508,14	R\$ 0,00	R\$ 3.508,14
01.02.006.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual af_ 05/2021	m	143,04	12,09	1.729,35	-	-	-	-	-
01.02.006.002	Piso alta resistência 12 mm cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusiva argamassa de regularização, aplicado	m	45,36	77,34	3.508,14	45,36	45,36	3.508,14	-	3.508,14
01.02.007	ALAMBRADO				31.784,88			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.007.001	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m²	153,68	183,63	28.220,26	-	-	-	-	-
01.02.007.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	105,12	9,93	1.043,84	-	-	-	-	-
01.02.007.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	105,12	23,98	2.520,78	-	-	-	-	-
01.02.008	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO WC				2.618,50			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	52,06	8,33	433,66	-	-	-	-	-
01.02.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm	m²	28,74	39,84	1.145,00	-	-	-	-	-
01.02.008.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm	m²	23,32	44,59	1.039,84	-	-	-	-	-
01.02.009	PINTURA WC				4.052,69			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.009.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	20,00	13,96	279,20	-	-	-	-	-
01.02.009.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta latex convencional para exteriores - Rer 03	m²	39,38	57,19	2.252,14	-	-	-	-	-
01.02.009.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta latex convencional para interiores. Ver. 03_ 04/2022	m²	20,00	53,27	1.065,40	-	-	-	-	-
01.02.009.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	6,72	67,85	455,95	-	-	-	-	-
01.02.010	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO				66,16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.010.001	Remoção de lavatório	und	2,00	16,54	33,08	-	-	-	-	-
01.02.010.002	Remoção de vaso sanitário	und	2,00	16,54	33,08	-	-	-	-	-
01.02.011	FORRO				562,80			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.011.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_pe	m²	5,00	59,29	296,45	-	-	-	-	-
01.02.011.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta latex convencional para interiores. Ver. 03_ 04/2022	m²	5,00	53,27	266,35	-	-	-	-	-


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-2
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.012	PASSEIOS EXTERNOS				52.402,15				R\$ 44.148,75	R\$ 880,85	R\$ 45.029,60
01.02.012.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_ 08/2022	m²	38,68	837,64	32.399,92	30,93	30,93	25.908,21	-	-	25.908,21
01.02.012.002	Lona plástica preta	m²	386,78	8,82	2.837,84	386,78	386,78	2.837,84	-	-	2.837,84
01.02.012.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	386,78	33,45	12.937,79	386,78	386,78	12.937,79	-	-	12.937,79
01.02.012.004	Regularização Manual	m²	386,78	8,89	2.864,91	386,78	386,78	2.864,91	-	-	2.864,91
01.02.012.005	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, bast ou similar, para pavimentos em concreto	m	64,46	27,33	1.761,69		32,23	32,23	-	880,85	880,85
01.02.013	MURO				170.728,77				R\$ 0,00	R\$ 40.913,15	R\$ 40.913,15
01.02.013.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	80,60	23,98	1.932,79			-	-	-	-
01.02.013.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de anti-corrosiva zinco - R2	m²	80,60	9,93	800,36			-	-	-	-
01.02.013.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	2.837,50	57,19	167.895,63	715,39	715,39	-	40.913,15	-	40.913,15
01.02.014	DIVERSOS				9.994,77				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.014.001	Par de tabeiras de basquete de compensado naval, com aros e redes fornecimento e instalação. af_03/2022	und	2,00	4.042,30	8.084,60			-	-	-	-
01.02.014.002	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	361,80	361,80			-	-	-	-
01.02.014.003	Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura	und	1,00	305,38	305,38			-	-	-	-
01.02.014.004	Poste oficial para vôlei em aço galvanizado d=3" c/estecedor e catraca	par	1,00	1.242,99	1.242,99			-	-	-	-
01.02.015	INSTALAÇÕES HIDRAULICA				2.429,47				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.02.015.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, elizabeth ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto c/ descarga - ver 02	und	2,00	458,41	916,82			-	-	-	-
01.02.015.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/ válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. De fixação (deca ref sp7) ou similares	und	2,00	322,24	644,48			-	-	-	-
01.02.015.003	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	und	1,00	823,99	823,99			-	-	-	-
01.02.015.004	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário af_ 08/2022	und	2,00	22,09	44,18			-	-	-	-
01.02.016	INSTALAÇÕES ELETRICA				3.278,50				R\$ 3.135,32	R\$ 0,00	R\$ 3.135,32
01.02.016.001	PROJETO ELETRICO QUADRA DOM JOSE THOMAZ										
01.02.016.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em porl. Rev 03	und	1,00	586,86	586,86	1,00	1,00	586,86	-	-	586,86
01.02.016.001	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação af_ 07/2025	und	1,00	83,76	83,76	1,00	1,00	83,76	-	-	83,76
01.02.016.001	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. Af_ 07/2020	und	1,00	143,18	143,18			-	-	-	-
01.02.016.001	cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90°C	m	50,00	20,78	1.039,00	50,00	50,00	1.039,00	-	-	1.039,00
01.02.016.001	poste auxiliar p/ entrada energia trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h= 6,00m, completo	und	1,00	614,83	614,83	1,00	1,00	614,83	-	-	614,83
01.02.016.001	caixa pré moldada em concreto c/ Tampa para aterramento (20x20x15)cm, padão energisa	und	1,00	22,94	22,94	1,00	1,00	22,94	-	-	22,94


Andre Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.016.001	fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	163,99	163,99	1,00	1,00	163,99	-	163,99
01.02.016.001	eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	6,00	28,71	160,26	6,00	6,00	160,26	-	160,26
01.02.016.001	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	und	3,00	5,81	17,43	3,00	3,00	17,43	-	17,43
01.02.016.001	cabeçote de alumínio de 1 1/4"	und	1,00	17,63	17,63	1,00	1,00	17,63	-	17,63
01.02.016.001	eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	15,00	21,31	319,65	15,00	15,00	319,65	-	319,65
01.02.016.001	curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	2,00	10,24	20,48	2,00	2,00	20,48	-	20,48
01.02.016.001	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	8,00	3,99	31,92	8,00	8,00	31,92	-	31,92
01.02.016.001	curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4"	und	1,00	56,57	56,57	1,00	1,00	56,57	-	56,57
01.02.016.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				887,77			R\$ 887,77	R\$ 0,00	R\$ 887,77
01.02.016.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação af. 07/2025	und	1,00	83,76	83,76	1,00	1,00	83,76	-	83,76
01.02.016.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação af. 07/2025	und	1,00	14,54	14,54	1,00	1,00	14,54	-	14,54
01.02.016.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação af. 07/2025	und	1,00	69,47	69,47	1,00	1,00	69,47	-	69,47
01.02.016.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação af. 07/2025	und	1,00	65,30	65,30	1,00	1,00	65,30	-	65,30
01.02.016.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação af. 07/2025	und	2,00	13,52	27,04	2,00	2,00	27,04	-	27,04
01.02.016.002	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	440,73	440,73	1,00	1,00	440,73	-	440,73
01.02.016.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	1,00	22,94	22,94	1,00	1,00	22,94	-	22,94
01.02.016.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	163,99	163,99	1,00	1,00	163,99	-	163,99
01.02.016.003	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				52.026,27			R\$ 21.575,70	R\$ 0,00	R\$ 21.575,70
01.02.016.003	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref. HBML-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	und	20,00	745,56	14.911,20	20,00	20,00	14.911,20	-	14.911,20
01.02.016.003	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação af. 09/2024	und	14,00	128,06	1.792,84	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação af. 09/2024	und	2,00	31,42	62,84	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	und	7,00	44,38	310,66	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação af. 03/2023	und	7,00	33,34	233,38	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 3/4	und	2,00	250,34	500,68	-	-	-	-	-


Andre Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293313-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabirana


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabirana


Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabirana

01.02.016.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750V / 70°C	m	450,00	11,77	5.296,50	450,00	450,00	5.296,50	-	5.296,50
01.02.016.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação af. 03/2023	m	120,00	11,40	1.368,00	120,00	120,00	1.368,00	-	1.368,00
01.02.016.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação af. 03/2023	m	120,00	20,04	2.404,80	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	15,00	21,31	319,65	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	2,00	10,24	20,48	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	8,00	3,99	31,92	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente 3/4	und	43,00	295,24	12.695,32	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	33,00	16,67	550,11	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	und	2,00	7,46	14,92	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	und	12,00	2,57	30,84	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, conipost ref. Serie A0008/ classe 30 da conipost ou similar	und	2,00	2.876,04	5.752,08	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 petalas encaixe em poste com top de 0 de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de 48mm/60,3mm	und	2,00	263,58	527,16	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/W, 16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, MODELO GL421 G-light ou similar	und	4,00	1.253,95	5.015,96	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Caixa pré moldada em concreto c/ Tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	1,00	22,94	22,94	-	-	-	-	-
01.02.016.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	163,99	163,99	-	-	-	-	-
			VALOR TOTAL		476.261,81	Total Geral		R\$ 124.624,83	R\$ 60.522,17	R\$ 185.147,00

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750
4

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaituba

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-1
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaituba

Andre Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaituba

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

ESTADO DE SERGIPE		PERIODO: 26/05/2026 a 03/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO		
OBJ:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS PEDRAS	
CONTRATO: 048/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 03	ORSE - 11/2025 - Sergipe B.D.I. 23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
01.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
25 H	
01.01.003	Mestre de obras com encargos complementares
25 H	
01.02.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - ver 03
167,86 m²	
01.02.005.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - ver 03
54 m²	
01.02.012.005	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, basf ou similar, para pavimentos em concreto
32,23 m	
01.02.013.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação af. 03/2023
715,39 m²	

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453
1407504
Assinado de
forma digital por
CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504

Andre Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana-SE	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ, POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO
CONTRATO: 048/2026	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 26/05/2026 A 03/07/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA., CNPJ: 23.684.541/0001-42	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	ORSE - 11/2025 - Sergipe	B.D.I. 23,54% NÃO DESONERADO	

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



Imagem 1 - Pintura arquibancada



Imagem 2 - Pintura arquibancada

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

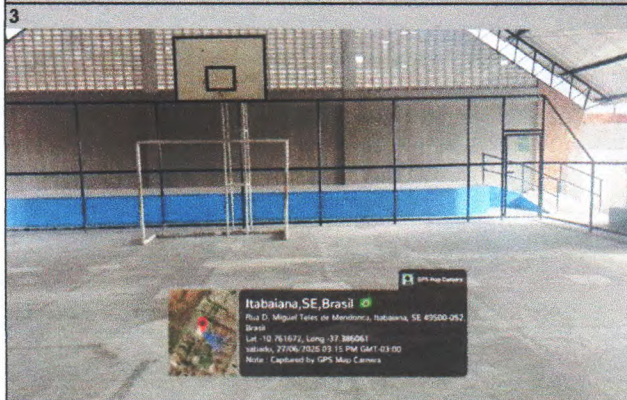


Imagem 3 - Pintura palco



Imagem 4 - Junta de dilatação

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

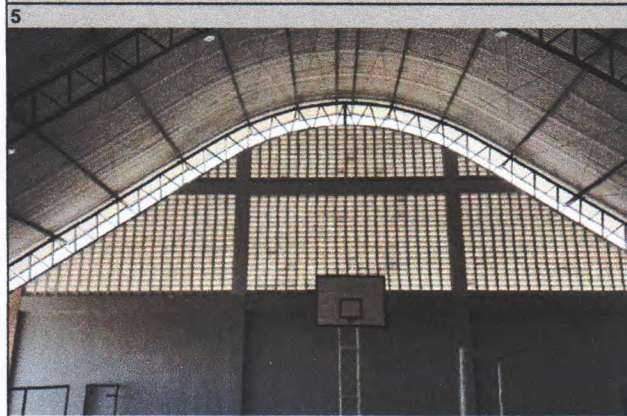


Imagem 5 - Pintura das paredes e cobogo da quadra



Imagem 6 - Aplicação de massa acrílica nos muros e paredes externas

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 72721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de
forma digital por
CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:045314
07504

Andre Agosti Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
