

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (LOTEAMENTO OSCAR NIEMEYER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2026					ORDEM DE SERVIÇO = 31/03/2026					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 15/05/2026 a 17/06/2026					DATA: 17/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							308.829,70	210.480,45	98.349,25	308.829,70	-	100,00
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	6000,00	4.069,94	1.930,06	6.000,00	50,11	R\$ 300.660,00	203.944,69	96.715,31	300.660,00	0,00	100,00
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	4,00	1,00	5,00	1633,94	R\$ 8.169,70	6.535,76	1.633,94	8.169,70	0,00	100,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 16.717,38	11.097,84	5.619,55	16.717,38	-	100,00
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,59	40,34	20,25	60,59	155,26	R\$ 9.407,20	6.263,19	3.144,02	9.407,20	0,00	100,00
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	121,19	80,15	41,04	121,19	60,32	R\$ 7.310,18	4.834,65	2.475,53	7.310,18	0,00	100,00
Total geral								325.547,08	221.578,30	103.968,78	325.547,08	0,00	100,00
Maykon Douglas Santos SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____					Aprovado para pagamento Data: ____/____/____					

gov.br


Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 18/06/2026 08:04:38 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (LOTEAMENTO OSCAR NIEMEYER)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2026		ORDEN DE SERVIÇO = 31/03/	
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 15/05/2026 a 17/06/2026		DATA: 17/06/2026	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	15/05/2026	AV. CONSTRUTOR PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	21,00	8,00	168,00
2	18/05/2026	AV. CONSTRUTOR PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	17,50	8,00	140,00
3	19/05/2026	AV. CONSTRUTOR PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	17,00	9,50	161,50
4	20/05/2026	AV. CONSTRUTOR PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	8,00	5,00	40,00
5	21/05/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	6,50	4,00	26,00
6	22/05/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	10,50	7,00	73,50
7	25/05/2026	RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	14,75	8,00	118,00
8	26/05/2026	RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	16,80	9,00	151,20
9	27/05/2026	RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	9,50	5,00	47,50
10	28/05/2026	RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	7,70	5,00	38,50
11	29/05/2026	RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	10,40	8,00	83,20
12	01/06/2026	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	5,60	3,00	16,80
13	02/06/2026	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	14,30	9,75	139,43
14	03/06/2026	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	13,00	7,00	91,00
15	05/06/2026	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	11,50	8,00	92,00
16	08/06/2026	ESTRADA PARA AÇUDE VELHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	9,50	2,99	28,40
17	09/06/2026	ESTRADA PARA AÇUDE VELHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	8,00	5,00	40,00
18	10/06/2026	ESTRADA PARA AÇUDE VELHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	8,00	3,56	28,48
19	11/06/2026	ESTRADA PARA AÇUDE VELHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	11,00	5,40	59,40
20	12/06/2026	RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	15,70	7,49	117,59
21	15/06/2026	RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	16,00	8,50	136,00
22	16/06/2026	RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	15,00	7,30	109,50
23	17/06/2026	RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	6,00	4,01	24,06
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)====>						1.930,06


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Maykan Douglas Santos Santana
Sócio Administrador
RT Eng.ª Civil
CREA/SE RN 2717140603

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO OSCAR NIEMEYER)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2026

AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE




AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE




Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03/2026

RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA




RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA




RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES

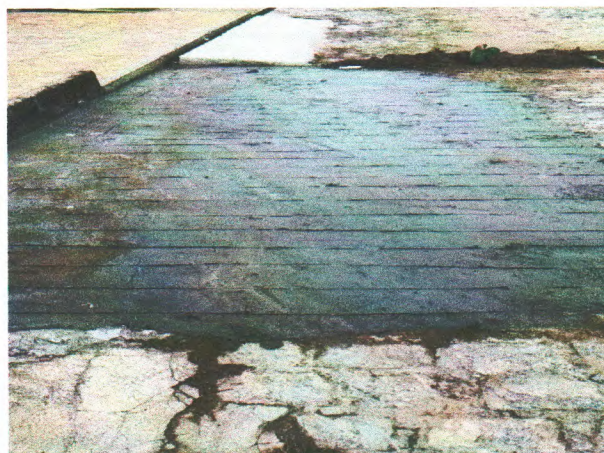

RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES



RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES

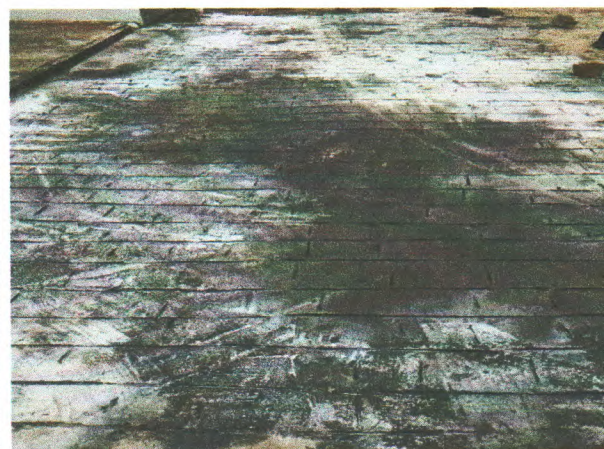

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2026

RUA MARCENEIRO ANTÔNIO DE MENEZES



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



ESTRADA PARA AÇUDE VELHO



Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03/2026

ESTRADA PARA AÇUDE VELHO



ESTRADA PARA AÇUDE VELHO



ESTRADA PARA AÇUDE VELHO



RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03/2026

RUA AGENARIO PEREIRA DE CARVALHO



Documento assinado digitalmente




SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO

Data: 17/06/2026 12:03:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado digitalmente por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
ND: C=BR, CN=MAYKON DOUGLAS
SANTOS SANTANA:06641211525,
L=CAMPO DO BRITO, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.06.17 11:38:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana
