

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 026/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDOS E QUALIDADE	
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 03/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
				PERÍODO: 23/06/2026 a 30/06/2026				DATA: 01/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.744,25	2.744,25	0,00	2.744,25	0,00	100,00
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	99,90	99,90	0,00	99,90	27,47	2.744,25	2.744,25	0,00	2.744,25	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							6.738,97	13,13	6.725,84	6.738,97	0,00	100,00
02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	0,24	0,00	0,24	54,72	13,13	13,13	0,00	13,13	0,00	100,00
2.003	Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023	m3	38,00		38,00		96,90	3.682,20	0,00	3.682,20	3.682,20	0,00	100,00
2.004	Concreto Armado fck 21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas sem compensadores inado 12mm (05 usos)	m3	1,29		1,29		2.359,41	3.043,64	0,00	3.043,64	3.043,64	0,00	100,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							6.739,18	6.198,92	540,26	6.739,18	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	76,64	76,64	0,00	76,64	10,16	778,66	778,66	0,00	778,66	0,00	100,00
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	204,77	204,77	0,00	204,77	26,47	5.420,26	5.420,26	0,00	5.420,26	0,00	100,00
3.020	Demolição de reboco	m2	59,50		59,50		9,08	540,26	0,00	540,26	540,26	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							27.084,75	12.169,72	14.915,03	27.084,75	0,00	100,00
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024	m	76,64	24,00	52,64	76,64	44,38	3.401,28	1.065,12	2.336,16	3.401,28	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fclt em obra, acabamento convencional, não armado. af. 08/2022	m3	28,62	14,33	14,29	28,62	774,92	22.178,21	11.104,60	11.073,61	22.178,21	0,00	100,00
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	M2	13,50		13,50		111,50	1.505,25	0,00	1.505,25	1.505,25	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE							1.249,44	1.249,44	0,00	1.249,44	0,00	100,00
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	3,00	0,00	3,00	416,48	1.249,44	1.249,44	0,00	1.249,44	0,00	100,00
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							6.416,56	2.941,93	3.474,63	6.416,56	0,00	100,00
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	59,50	43,48	16,02	59,50	6,66	396,27	289,58	106,69	396,27	0,00	100,00
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	141,30	43,48	97,82	141,30	34,43	4.864,96	1.497,02	3.367,94	4.864,96	0,00	100,00
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,79	1,79	0,00	1,79	645,44	1.155,34	1.155,34	0,00	1.155,34	0,00	100,00
08	PINTURA							12.250,78	11.511,90	738,88	12.250,78	0,00	100,00
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	300,68	300,68	0,00	300,68	20,22	6.079,75	6.079,75	0,00	6.079,75	0,00	100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	133,63	117,63	16,00	133,63	46,18	6.171,03	5.432,15	738,88	6.171,03	0,00	100,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							56.194,42	56.194,42	0,00	56.194,42	0,00	100,00
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim: 1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	6,00	6,00	0,00	6,00	550,37	3.302,22	3.302,22	0,00	3.302,22	0,00	100,00
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m	un	4,00	4,00	0,00	4,00	806,46	3.225,84	3.225,84	0,00	3.225,84	0,00	100,00
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00	6,00	0,00	6,00	333,63	2.001,78	2.001,78	0,00	2.001,78	0,00	100,00
09.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	1,00	0,00	1,00	12.822,76	12.822,76	12.822,76	0,00	12.822,76	0,00	100,00
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/ mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3.706,09	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	0,00	100,00
09.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00	1,00	0,00	1,00	4.987,04	4.987,04	4.987,04	0,00	4.987,04	0,00	100,00

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MARIA GARDENIA APALHO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-9
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÊ DO VEADO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 026/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
			B.M.Nº. 03/2026					ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
			PERÍODO: 23/06/2026 a 30/06/2026					DATA: 01/07/2026					
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	1,00	0,00	1,00	8.944,94	8.944,94	8.944,94	0,00	8.944,94	0,00	100,00
09.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3.859,06	3.859,06	3.859,06	0,00	3.859,06	0,00	100,00
09.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.883,47	2.883,47	2.883,47	0,00	2.883,47	0,00	100,00
09.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.845,39	2.845,39	2.845,39	0,00	2.845,39	0,00	100,00
09.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	4.177,74	4.177,74	4.177,74	0,00	4.177,74	0,00	100,00
09.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3.438,09	3.438,09	3.438,09	0,00	3.438,09	0,00	100,00
13	DIVERSOS							9.359,33	4.923,82	4.435,52	9.359,34	0,00	100,00
13.001	Limpeza geral	m2	1.836,37	1.836,37	0,00	1.836,37	2,42	4.444,02	4.444,02	0,00	4.444,02	0,00	100,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	19,03	19,03	0,00	19,03	10,81	205,74	205,74	0,00	205,74	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	228,38	228,38	0,00	228,38	1,20	274,06	274,06	0,00	274,06	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	100,00
13.005	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02	M	100,00	0,00	100,00	100,00	23,47	2.347,27	0,00	2.347,27	2.347,27	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	3.301,31	0,00	3.301,31	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	10,50	0,00	10,50	154,93	1.626,77	1.626,77	0,00	1.626,77	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	21,00	0,00	21,00	79,74	1.674,54	1.674,54	0,00	1.674,54	0,00	100,00
TOTAL GERAL								132.079,00	101.248,84	30.830,16	132.079,00	0,00	100,00
CONSTRUTORA ROCHA LTDA Maria Gardênia Araújo Silva CREA 2704386949			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____					Aprovado para pagamento Data: ____/____/____					

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BM 03 01/07/2026
		CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
026/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)	
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	
2.003	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 - 38,00 M3	
2.004	Concreto Armado fck 21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas sem compensadores sinado 12mm (05 usos) - 1,29 M3	
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	
3.020	Demolição de reboco - 59,50 M2	
04	PAVIMENTAÇÃO	
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 - 52,64 M	
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 - 14,29 M3	
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia - 13,50 M2	
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS	
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - 16,02 M2	
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 97,82 M2	
08	PINTURA	
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 16,00 M2	
13	DIVERSOS	
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m - 1,00 UND	
13.005	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 - 100,00 M	

Maria Gaudêncio Araújo Silva
CREA 270439694-9
 CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 270439694-9

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 026/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE


DATA: 01/07/2026



ATERRO



CONCRETO ARMADO

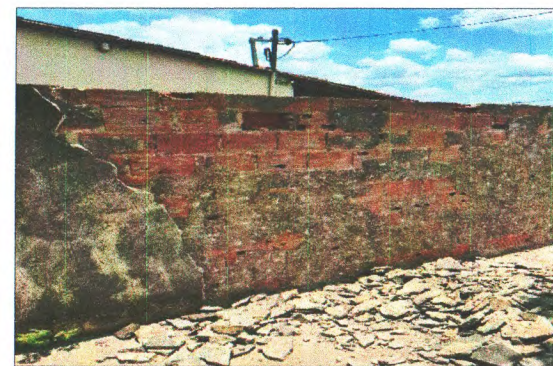

DEMOLIÇÃO DE REBOCO



ASSENTAMENTO DE MEIO FIO



EXECUÇÃO DE PASSEIO



PISO BLOCOS EXAGONAL

ELABORADO POR:

Maria GARDÊNIA Araújo Silva
CREA 2704396949

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03



CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 026/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 01/07/2026



CHAPISCO



REBOCO




PINTURA EXTERIORES



PLACA DE INAUGURAÇÃO



CORRENTE DE AÇO



ELABORADO POR:

Maria Gardênia Araújo Silva
CREA 2704396949

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272210318899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 271981849
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
