

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO Nº 031/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				VIGÊNCIA 07/04/2025 EXECUÇÃO 05/01/2025				Período: 01/09/2024 a 20/12/2024				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 24/03/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CAJAÍBA, ITABAIANA-SE													
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							32.590,06	32.590,06	0,00	32.590,06	0,00	100,00	
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	424,50	5.094,00	5.094,00	0,00	5.094,00	0,00	100,00
01.01.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	676,53	676,53	676,53	0,00	676,53	0,00	100,00
01.01.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	0,00	1.981,21	1.981,21	1.981,21	0,00	1.981,21	0,00	100,00
01.01.004	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	20,00		20,00	0,00	300,16	6.003,20	6.003,20	0,00	6.003,20	0,00	100,00
01.01.005	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.750,00	1.750,00		1.750,00	0,00	2,34	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	100,00
01.01.006	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	37,50	37,50		37,50	0,00	245,47	9.205,13	9.205,13	0,00	9.205,13	0,00	100,00
01.01.007	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	718,83	718,83		718,83	0,00	7,70	5.534,99	5.534,99	0,00	5.534,99	0,00	100,00
01.02	QUADRA POLIESPORTIVA							680.543,36	393.793,46	227.736,97	621.530,43	59.012,93	91,33	
01.02.001	GALPÃO PRÉ MOLDADO							393.793,46	393.793,46	0,00	393.793,46	0,00	100,00	
01.02.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	12,00	12,00		12,00	0,00	12,78	153,36	153,36	0,00	153,36	0,00	100,00
01.02.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	18,00		18,00	0,00	1,24	22,32	22,32	0,00	22,32	0,00	100,00
01.02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	54,00		54,00	0,00	1,48	79,92	79,92	0,00	79,92	0,00	100,00
01.02.001.004	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	718,83	718,83		718,83	0,00	393,79	283.068,07	283.068,07	0,00	283.068,07	0,00	100,00
01.02.001.005	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	718,83	718,83		718,83	0,00	153,68	110.469,79	110.469,79	0,00	110.469,79	0,00	100,00
01.02.002	QUADRA							121.237,03	0,00	69.911,02	69.911,02	51.326,01	57,66	
01.02.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padrolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	618,76	8.118,13	0,00	8.118,13	8.118,13	0,00	100,00
01.02.002.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	215,64	0,00	215,64	215,64	0,00	17,25	3.719,79	0,00	3.719,79	3.719,79	0,00	100,00

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892
714590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.03.24 16:18:42
-03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA			DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO Nº 031/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/04/2025 EXECUÇÃO 05/01/2025					Período: 01/09/2024 a 20/12/2024				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 24/03/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.002.003	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	215,64	0,00	215,64	215,64	0,00	22,53	4.858,37	0,00	4.858,37	4.858,37	0,00	100,00
01.02.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.940,84	0,00	1.940,84	1.940,84	0,00	1,48	2.872,44	0,00	2.872,44	2.872,44	0,00	100,00
01.02.002.005	Lona plástica preta	m2	514,96	0,00	514,96	514,96	0,00	4,82	2.482,11	0,00	2.482,11	2.482,11	0,00	100,00
01.02.002.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	514,96	0,00	514,96	514,96	0,00	22,44	11.555,70	0,00	11.555,70	11.555,70	0,00	100,00
01.02.002.007	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	514,96	0,00	514,96	514,96	0,00	44,81	23.075,36	0,00	23.075,36	23.075,36	0,00	100,00
01.02.002.008	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	514,96	0,00		0,00	514,96	52,00	26.777,92	0,00	0,00	0,00	26.777,92	0,00
01.02.002.009	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	514,96	0,00		0,00	514,96	44,53	22.931,17	0,00	0,00	0,00	22.931,17	0,00
01.02.002.010	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	203,87	0,00	203,87	203,87	0,00	64,89	13.229,12	0,00	13.229,12	13.229,12	0,00	100,00
01.02.002.011	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	137,26	0,00		0,00	137,26	11,78	1.616,92	0,00	0,00	0,00	1.616,92	0,00
01.02.003	ALAMBRADO								138.022,90	0,00	134.948,23	134.948,23	3.074,67	97,77
01.02.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,43	0,00	8,43	8,43	0,00	59,69	503,19	0,00	503,19	503,19	0,00	100,00
01.02.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,11	0,00	10,11	10,11	0,00	11,69	118,19	0,00	118,19	118,19	0,00	100,00
01.02.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	1,48	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	100,00
01.02.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,93	0,00	3,93	3,93	0,00	618,76	2.431,73	0,00	2.431,73	2.431,73	0,00	100,00
01.02.003.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	54,39	1.783,99	0,00	1.783,99	1.783,99	0,00	100,00
01.02.003.006	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	6,18	405,41	0,00	405,41	405,41	0,00	100,00
01.02.003.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	43,23	2.835,89	0,00	2.835,89	2.835,89	0,00	100,00
01.02.003.008	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	65,60	0,00		0,00	65,60	46,87	3.074,67	0,00	0,00	0,00	3.074,67	0,00
01.02.003.009	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	694,58	1.125,22	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00	100,00

JOSE ALMEIDA Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089 ANDRADE:00892714590
2714590 Dados: 2025.03.24 16:18:58
-03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA			DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO Nº 031/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/04/2025 EXECUÇÃO 05/01/2025				Período: 01/09/2024 a 20/12/2024				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 24/03/2025							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.003.010	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	347,20	0,00	347,20	347,20	0,00	347,59	120.683,25	0,00	120.683,25	120.683,25	0,00	100,00
01.02.003.011	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	870,91	5.016,44	0,00	5.016,44	5.016,44	0,00	100,00
01.02.004	ARQUIBANCADA								27.489,97	0,00	22.877,72	22.877,72	4.612,25	83,22
01.02.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	59,69	278,75	0,00	278,75	278,75	0,00	100,00
01.02.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	11,69	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00	100,00
01.02.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16,81	0,00	16,81	16,81	0,00	1,48	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00	100,00
01.02.004.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00	2.914,96	12.038,78	0,00	12.038,78	12.038,78	0,00	100,00
01.02.004.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev 06	m2	23,54	0,00	23,54	23,54	0,00	79,26	1.865,78	0,00	1.865,78	1.865,78	0,00	100,00
01.02.004.006	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m2	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00	6,18	290,95	0,00	290,95	290,95	0,00	100,00
01.02.004.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00	43,23	2.035,27	0,00	2.035,27	2.035,27	0,00	100,00
01.02.004.008	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	223,31	3.773,94	0,00	3.773,94	3.773,94	0,00	100,00
01.02.004.009	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	22,53	380,76	0,00	380,76	380,76	0,00	100,00
01.02.004.010	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	36,01	0,00	36,01	36,01	0,00	58,96	2.123,15	0,00	2.123,15	2.123,15	0,00	100,00
01.02.004.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,54	0,00		0,00	23,54	47,64	1.121,45	0,00	0,00	0,00	1.121,45	0,00
01.02.004.012	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	0,00		0,00	15,00	232,72	3.490,80	0,00	0,00	0,00	3.490,80	0,00
01.03	DRENAGEM PLUVIAL								20.567,77	0,00	0,00	0,00	20.567,77	0,00
01.03.001	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	130,74	0,00		0,00	130,74	61,66	8.061,43	0,00	0,00	0,00	8.061,43	0,00
01.03.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	6,00	0,00		0,00	6,00	320,17	1.921,02	0,00	0,00	0,00	1.921,02	0,00
01.03.003	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	65,20	0,00		0,00	65,20	160,98	10.495,90	0,00	0,00	0,00	10.495,90	0,00

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.03.24 16:19:15
-03'00'

José Robson Paixão
Eng. Civil 93954
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA			DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO Nº 031/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/04/2025 EXECUÇÃO 05/01/2025				Período: 01/09/2024 a 20/12/2024				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 24/03/2025							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.03.004	Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro entre 119 e 170 mm, para drenagem pluvial predial	un	2,00	0,00		0,00	2,00	44,71	89,42	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								17.846,01	0,00	0,00	0,00	17.846,01	0,00
01.04.001	PADRÃO DE ENTRADA								2.619,97	0,00	0,00	0,00	2.619,97	0,00
01.04.001.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	0,00		0,00	1,00	557,13	557,13	0,00	0,00	0,00	557,13	0,00
01.04.001.002	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	0,00		0,00	1,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00
01.04.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	0,00		0,00	1,00	594,69	594,69	0,00	0,00	0,00	594,69	0,00
01.04.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	0,00		0,00	2,00	19,02	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00
01.04.001.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00		0,00	1,00	162,78	162,78	0,00	0,00	0,00	162,78	0,00
01.04.001.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00		0,00	1,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00
01.04.001.007	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16 +16mm²	m	50,00	0,00		0,00	50,00	8,35	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00
01.04.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	57,00	0,00		0,00	57,00	12,86	733,02	0,00	0,00	0,00	733,02	0,00
01.04.002	QUADRO DISTRIBUIÇÃO								732,34	0,00	0,00	0,00	732,34	0,00
01.04.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00		0,00	1,00	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00	304,98	0,00
01.04.002.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00		0,00	1,00	162,78	162,78	0,00	0,00	0,00	162,78	0,00
01.04.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00		0,00	1,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00
01.04.002.004	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	0,00		0,00	1,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00
01.04.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00		0,00	1,00	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00
01.04.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00		0,00	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
01.04.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu linha branca), corrente 5KA	un	2,00	0,00		0,00	2,00	59,57	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00
01.04.003	PONTOS DE ILUMINAÇÃO								14.493,70	0,00	0,00	0,00	14.493,70	0,00
01.04.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	90,00	0,00		0,00	90,00	18,94	1.704,60	0,00	0,00	0,00	1.704,60	0,00
01.04.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	30,00	0,00		0,00	30,00	4,09	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	0,00
01.04.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C	m	420,00	0,00		0,00	420,00	10,25	4.305,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00
01.04.003.004	Luminária industrial de embutir, em alumínio, p/ lâmpada mista ou vapor mercúrio, ref. .tb-105/2, Tecnolux ou similar	un	26,00	0,00		0,00	26,00	235,88	6.132,88	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00

JOSE ALMEIDA Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.03.24
16:19:29 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA			DATA DE TÉRMINO:					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03					CONTRATO Nº 031/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/04/2025 EXECUÇÃO 05/01/2025					Período: 01/09/2024 a 20/12/2024					CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 24/03/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.003.005	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	14,00	0,00		0,00	14,00	159,18	2.228,52	0,00	0,00	0,00	2.228,52	0,00
01.05	ÁREA EXTERNA								51.551,33	0,00	0,00	0,00	51.551,33	0,00
01.05.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016	m	59,12	0,00		0,00	59,12	54,37	3.214,35	0,00	0,00	0,00	3.214,35	0,00
01.05.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	59,12	0,00		0,00	59,12	4,06	240,03	0,00	0,00	0,00	240,03	0,00
01.05.003	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	132,00	0,00		0,00	132,00	94,75	12.507,00	0,00	0,00	0,00	12.507,00	0,00
01.05.004	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	29,97	0,00		0,00	29,97	189,49	5.679,02	0,00	0,00	0,00	5.679,02	0,00
01.05.005	Lastro de brita 1	m3	28,41	0,00		0,00	28,41	240,37	6.828,91	0,00	0,00	0,00	6.828,91	0,00
01.05.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	355,71	0,00		0,00	355,71	64,89	23.082,02	0,00	0,00	0,00	23.082,02	0,00
01.06	DIVERSOS								14.427,14	0,00	0,00	0,00	14.427,14	0,00
01.06.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	0,00		0,00	1,00	5.287,94	5.287,94	0,00	0,00	0,00	5.287,94	0,00
01.06.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00		0,00	2,00	499,84	999,68	0,00	0,00	0,00	999,68	0,00
01.06.003	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	0,00		0,00	2,00	4.069,76	8.139,52	0,00	0,00	0,00	8.139,52	0,00
01.07	MURO DE FECHAMENTO								83.525,94	71.806,50	0,00	71.806,50	11.719,44	85,97
01.07.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	243,00	243,00		243,00	0,00	295,50	71.806,50	71.806,50	0,00	71.806,50	0,00	100,00
01.07.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	246,00	0,00		0,00	246,00	47,64	11.719,44	0,00	0,00	0,00	11.719,44	0,00
01.08	SERVIÇOS FINAIS								8.703,93	0,00	0,00	0,00	8.703,93	0,00
01.08.001	Limpeza geral	m2	1.750,00	0,00		0,00	1.750,00	2,69	4.707,50	0,00	0,00	0,00	4.707,50	0,00
01.08.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00		0,00	1,00	2.511,58	2.511,58	0,00	0,00	0,00	2.511,58	0,00

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590


Assinado de forma digital
por JOSE.ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.03.24 16:19:49
-03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA			DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO Nº 031/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA			VIGÊNCIA 07/04/2025 / EXECUÇÃO 05/01/2025 /				Período: 01/09/2024 a 20/12/2024				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 24/03/2025							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.08.003	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1.484,85	1.484,85	0,00	0,00	0,00	1.484,85	0,00
01.09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								40.215,00	22.021,96	10.066,93	32.088,87	8.126,13	79,79
01.09.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	150,00	80,560	36,827	117,387	32,61	136,68	20.502,00	11.010,94	5.033,54	16.044,46	4.457,54	78,26
01.09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	300,00	167,570	76,600	244,170	55,83	65,71	19.713,00	11.011,02	5.033,39	16.044,41	3.668,59	81,39
Total geral									949.970,54	520.212,10	237.803,90	758.016,00	191.954,54	79,79
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398			Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2025.03.24 16:21:17 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___					


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA		MEMORIAL DE CALCULO BM 03		CONTRATO Nº 031/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 24/03/2025			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE		
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CAJAÍBA, ITABAIANA-SE				
01.02	QUADRA POLIESPORTIVA				
01.02.002	QUADRA				
01.02.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	13,12	109,30m x 0,30m x 0,40m = 13,12m³	
01.02.002.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	215,64	718,83m² x 0,30m = 215,64m³	
01.02.002.003	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	215,64	718,83m² x 0,30m = 215,64m³	
01.02.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.940,84	215,64m³ x 1,50t x 6km = 1940,84tkm	
01.02.002.005	Lona plástica preta	m2	514,96	514,96m² = Área retirada em projeto, área da quadra	
01.02.002.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	514,96	514,96m² = Área retirada em projeto, área da quadra	
01.02.002.007	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	514,96	514,96m² = Área retirada em projeto, área da quadra	
01.02.002.010	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	203,87	203,87m² = Área retirada em Projeto, área técnica	
01.02.003	ALAMBRADO				
01.02.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,43	106,70m x 0,25m x 0,30m = 8,43m³	
01.02.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,11	8,43m³ x 1,20 = 10,11m³	
01.02.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,35	10,11m³ x 1,50t x 2km = 30,35	
01.02.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,93	RETIRADO DO PROJETO = 3,93 m³	
01.02.003.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	32,80	MURETA = 32,80m x 1,00m = 32,80m²	
01.02.003.006	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	65,60	32,80m² x 2,00 = 65,60m²	
01.02.003.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	65,60	32,80m² x 2,00 = 65,60m²	
01.02.003.009	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,62	BLOCOS DE CONCRETO = 0,35m x 0,35m x 0,35m x 42und = 1,62m³	
01.02.003.010	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	347,20	RETIRADO DO PROJETO =347,20 m²	
01.02.003.011	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	5,76	RETIRADO DO PROJETO = 5,76 m²	
01.02.004	ARQUIBANCADA				
01.02.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,67	ESCAVAÇÃO DO ENTORNO DA FUNDAÇÃO PARA A ARQUIBANCADA = 4,67m³	

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590


Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.04.30
11:55:20 -03'00'

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2728298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA				MEMORIAL DE CALCULO BM 03		CONTRATO N° 031/2024	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA						CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 24/03/2025			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				
01.02.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	5,60	4,67m³ x 1,20 = 5,60m³			
01.02.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16,81	5,60m³ x 1,50t x 2km = 16,81tkm			
01.02.004.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,13	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA = 4,13m³			
01.02.004.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	23,54	27,70m x 0,85m = 23,54m²			
01.02.004.006	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m2	47,08	23,54m² x 2 = 47,08m²			
01.02.004.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	47,08	23,54m² x 2 = 47,08m²			
01.02.004.008	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	16,90	27,70m x 0,61m² = 16,90m³			
01.02.004.009	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	16,90	27,70m x 0,61m² = 16,90m³			
01.02.004.010	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	36,01	ACENTO DA ARQUIBANCADA = 36,01m²			
01.09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
01.09.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	36,827	(R\$ 10.066,93/2)/R\$136,68 = 36,827h			
01.09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	76,600	(R\$ 10.066,93/2)/R\$65,71 = 76,600h			
JOSE ALMEIDA ANDRADE:0089271459 0			Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2025.04.30 11:55:36 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		
Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398							


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rodson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

CONTRATO 031/2024

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

INICIO - 05/07/2024



PLACA DA OBRA



PLACA DA OBRA



EXECUÇÃO DA MURETA, CHAPISCO, REBOCO, ALAMBRADO E PISO DA QUADRA



EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA, ALAMBRADO, PISO EM CONCRETO E MURETA



EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA, ALAMBRADO, PISO EM CONCRETO E MURETA CHAPISCADA E REBOCADA



EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E PISO DA QUADRA

ELABORADO POR:

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=22882276000111,
OU=videoconferencia, CN=JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.08 14:45:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2726298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

CONTRATO 031/2024

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 05/07/2024



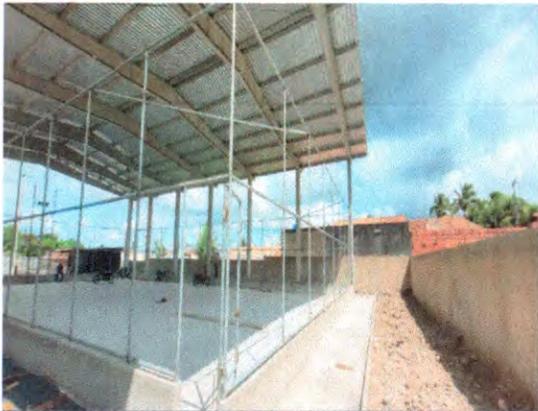
ATERRO; LONA PLÁSTICA PRETA; TELA AÇO SOLDADA



ATERRO; LONA PLÁSTICA PRETA; TELA AÇO SOLDADA;
CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO



CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO;
CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO DESEMPOLADO



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO;
CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO DESEMPOLADO



CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO

ELABORADO POR:

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
ID: C=BR, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111,
OU=videoconferencia, CN=JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.08 14:45:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720299354
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

CONTRATO 031/2024

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 05/07/2024



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO;
CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO DESEMPOLADO



ARQUIBANCADAS; ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO;
CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO DESEMPOLADO



ARQUIBANCADAS; ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO;
CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO DESEMPOLADO



ARQUIBANCADAS; ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO;
CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO DESEMPOLADO

ELABORADO POR:

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil - CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
ND: C=BR, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111,
OU=videoconferencia, CN=JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.08 14:45:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

CONTRATO 031/2024

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 05/07/2024



TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO COM TELA REVESTIDA EM PVC



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO COM TELA REVESTIDA EM PVC



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO COM TELA REVESTIDA EM PVC



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO COM TELA REVESTIDA EM PVC



ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO COM TELA REVESTIDA EM PVC

ELABORADO POR:

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111,
OU=videoconferencia, CN=JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.08 14:45:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 4
