

| PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO) |                                                                                                                                                                           |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                       |            |                            |                       | CONTRATO Nº 157/2024           |                       |            |                            | <div></div> |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |     | B.M.Nº. 03                       |                       |            |                            |                       | ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025 |                       |            |                            |                                                                                                |               |
| CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |     | PERÍODO: 01/02/2026 a 30/04/2026 |                       |            |                            |                       | DATA: 30/04/2026               |                       |            |                            |                                                                                                |               |
| Item                                                                                                                                               | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                | Und | QUANTIDADE                       |                       |            |                            | Preço<br>Unitário R\$ | VALORES R\$                    |                       |            |                            | Saldo<br>Medir                                                                                 | a<br>% Medido |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | Contratada                       | Acumulada<br>Anterior | Do Período | Acumulada<br>até o Período |                       | Contratado                     | Acumulado<br>Anterior | Do Período | Acumulado até<br>o Período |                                                                                                |               |
| 01                                                                                                                                                 | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                         |     |                                  |                       |            |                            |                       | 3.660,00                       | 3.660,00              | 0,00       | 3.660,00                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 01.001                                                                                                                                             | Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                                                          | mês | 5,00                             | 5,00                  |            | 5,00                       | 732,00                | 3.660,00                       | 3.660,00              | 0,00       | 3.660,00                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 02                                                                                                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                     |     |                                  |                       |            |                            |                       | 2.218,74                       | 2.218,74              | 0,00       | 2.218,74                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 02.001                                                                                                                                             | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                        | m2  | 6,00                             | 6,00                  |            | 6,00                       | 369,79                | 2.218,74                       | 2.218,74              | 0,00       | 2.218,74                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03                                                                                                                                                 | TRECHO 1                                                                                                                                                                  |     |                                  |                       |            |                            |                       | 263.130,66                     | 258.720,55            | 0,00       | 258.720,55                 | 4.410,11                                                                                       | 98,32         |
| 03.001                                                                                                                                             | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                              |     |                                  |                       |            |                            |                       | 229.973,91                     | 229.973,91            | 0,00       | 229.973,91                 | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.001.001                                                                                                                                         | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                       | m2  | 2.141,28                         | 2.141,28              |            | 2.141,28                   | 1,35                  | 2.890,73                       | 2.890,73              | 0,00       | 2.890,73                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.001.002                                                                                                                                         | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m                                                                   | m3  | 265,56                           | 265,56                |            | 265,56                     | 13,04                 | 3.462,90                       | 3.462,90              | 0,00       | 3.462,90                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.001.003                                                                                                                                         | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte                                                                          | m3  | 64,66                            | 64,66                 |            | 64,66                      | 14,64                 | 946,62                         | 946,62                | 0,00       | 946,62                     | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.001.004                                                                                                                                         | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3  | 64,66                            | 64,66                 |            | 64,66                      | 12,24                 | 791,44                         | 791,44                | 0,00       | 791,44                     | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.001.005                                                                                                                                         | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                      | tkm | 193,98                           | 193,98                |            | 193,98                     | 1,40                  | 271,57                         | 271,57                | 0,00       | 271,57                     | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.001.006                                                                                                                                         | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico        | m2  | 1.858,73                         | 1.858,73              |            | 1.858,73                   | 96,81                 | 179.943,65                     | 179.943,65            | 0,00       | 179.943,65                 | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.001.007                                                                                                                                         | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                   | m   | 941,84                           | 941,84                |            | 941,84                     | 44,24                 | 41.667,00                      | 41.667,00             | 0,00       | 41.667,00                  | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.002                                                                                                                                             | DRENAGEM SUPERFICIAL                                                                                                                                                      |     |                                  |                       |            |                            |                       | 28.746,64                      | 28.746,64             | -          | 28.746,64                  | -                                                                                              | 100,00        |
| 03.002.001                                                                                                                                         | Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete                                                                                                                     | m2  | 282,55                           | 282,55                |            | 282,55                     | 101,74                | 28.746,64                      | 28.746,64             | 0,00       | 28.746,64                  | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 03.003                                                                                                                                             | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                           |     |                                  |                       |            |                            |                       | 4.410,11                       | -                     | -          | -                          | 4.410,11                                                                                       | 0,00          |
| 03.003.001                                                                                                                                         | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                             | m   | 941,84                           | 0,00                  |            | 0,00                       | 3,50                  | 3.296,44                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                       | 3.296,44                                                                                       | 0,00          |
| 03.003.002                                                                                                                                         | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                                                          | m²  | 2.141,68                         | 0,00                  |            | 0,00                       | 0,52                  | 1.113,67                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                       | 1.113,67                                                                                       | 0,00          |
| 04                                                                                                                                                 | TRECHO 2                                                                                                                                                                  |     |                                  |                       |            |                            |                       | 324.011,16                     | 0,00                  | 318.370,03 | 318.370,03                 | 5.641,13                                                                                       | 98,28         |
| 04.001                                                                                                                                             | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                              |     |                                  |                       |            |                            |                       | 280.980,58                     | 0,00                  | 280.980,58 | 280.980,58                 | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 04.001.001                                                                                                                                         | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                       | m2  | 2.603,13                         | 0,00                  | 2.603,13   | 2.603,13                   | 1,35                  | 3.514,23                       | 0,00                  | 3.514,23   | 3.514,23                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 04.001.002                                                                                                                                         | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m                                                                   | m3  | 434,88                           | 0,00                  | 434,88     | 434,88                     | 13,04                 | 5.670,84                       | 0,00                  | 5.670,84   | 5.670,84                   | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 04.001.003                                                                                                                                         | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte                                                                          | m3  | 37,65                            | 0,00                  | 37,65      | 37,65                      | 14,64                 | 551,20                         | 0,00                  | 551,20     | 551,20                     | 0,00                                                                                           | 100,00        |
| 04.001.004                                                                                                                                         | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3  | 37,65                            | 0,00                  | 37,65      | 37,65                      | 12,24                 | 460,84                         | 0,00                  | 460,84     | 460,84                     | 0,00                                                                                           | 100,00        |

| PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO) |                                                                                                                                                                    |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                             |                       |            |                            | CONTRATO Nº 157/2024                        |             |                       |            | <div></div> |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |     | B.M.Nº. 03                                                                                                     |                       |            |                            | ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025              |             |                       |            |                                                                                                |                |          |
| CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |     | PERÍODO: 01/02/2026 a 30/04/2026                                                                               |                       |            |                            | DATA: 30/04/2026                            |             |                       |            |                                                                                                |                |          |
| Item                                                                                                                                                | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                         | Und | QUANTIDADE                                                                                                     |                       |            |                            | Preço<br>Unitário R\$                       | VALORES R\$ |                       |            |                                                                                                | Saldo<br>Medir | % Medido |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |     | Contratada                                                                                                     | Acumulada<br>Anterior | Do Período | Acumulada<br>até o Período |                                             | Contratado  | Acumulado<br>Anterior | Do Período | Acumulado até<br>o Período                                                                     |                |          |
| 04.001.005                                                                                                                                          | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                               | tkm | 112,95                                                                                                         | 0,00                  | 112,95     | 112,95                     | 1,40                                        | 158,13      | 0,00                  | 158,13     | 158,13                                                                                         | 0,00           | 100,00   |
| 04.001.006                                                                                                                                          | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2  | 2.235,63                                                                                                       | 0,00                  | 2.235,63   | 2.235,63                   | 96,81                                       | 216.431,34  | 0,00                  | 216.431,34 | 216.431,34                                                                                     | 0,00           | 100,00   |
| 04.001.007                                                                                                                                          | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                            | m   | 1.225,00                                                                                                       | 0,00                  | 1.225,00   | 1.225,00                   | 44,24                                       | 54.194,00   | 0,00                  | 54.194,00  | 54.194,00                                                                                      | 0,00           | 100,00   |
| 04.002                                                                                                                                              | DRENAGEM SUPERFICIAL                                                                                                                                               |     |                                                                                                                |                       |            |                            |                                             | 37.389,45   | -                     | 37.389,45  | 37.389,45                                                                                      | -              | 100,00   |
| 04.002.001                                                                                                                                          | Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete                                                                                                              | m2  | 367,50                                                                                                         | 0,00                  | 367,50     | 367,50                     | 101,74                                      | 37.389,45   | 0,00                  | 37.389,45  | 37.389,45                                                                                      | 0,00           | 100,00   |
| 04.003                                                                                                                                              | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                |                       |            |                            |                                             | 5.641,13    | -                     | -          | -                                                                                              | 5.641,13       | 0,00     |
| 04.003.001                                                                                                                                          | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m   | 1.225,00                                                                                                       | 0,00                  |            | 0,00                       | 3,50                                        | 4.287,50    | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                                                                           | 4.287,50       | 0,00     |
| 04.003.002                                                                                                                                          | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                                                   | m²  | 2.603,13                                                                                                       | 0,00                  |            | 0,00                       | 0,52                                        | 1.353,63    | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                                                                           | 1.353,63       | 0,00     |
| 05                                                                                                                                                  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                |     |                                                                                                                |                       |            |                            |                                             | 30.859,40   | 15.429,70             | 15.429,70  | 30.859,40                                                                                      | -              | 100,00   |
| 05.001                                                                                                                                              | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                        | h   | 130,00                                                                                                         | 65,00                 | 65,0000    | 130,00                     | 110,50                                      | 14.365,00   | 7.182,50              | 7.182,50   | 14.365,00                                                                                      | 0,00           | 100,00   |
| 05.002                                                                                                                                              | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                        | h   | 260,00                                                                                                         | 130,00                | 130,0000   | 260,00                     | 63,44                                       | 16.494,40   | 8.247,20              | 8.247,20   | 16.494,40                                                                                      | 0,00           | 100,00   |
| Total geral                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                |                       |            |                            |                                             | 623.879,96  | 280.028,99            | 333.799,73 | 613.828,72                                                                                     | 10.061,24      | 98,39    |
| Engº Civil Paulo César Lima Júnior<br>CREA RN 2719934232                                                                                            |                                                                                                                                                                    |     | Atestamos que os serviços constantes na NF -<br>foram recebidos por nós em perfeita ordem.<br>Data: __/__/____ |                       |            |                            | Aprovado para pagamento<br>Data: __/__/____ |             |                       |            |                                                                                                |                |          |

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO CESAR LIMA JUNIOR  
 Data: 07/05/2026 08:56:45-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DIEGO OLIVEIRA BARROS  
 Data: 07/05/2026 09:42:25-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOAO VITOR REIS DOS SANTOS  
 Data: 07/05/2026 09:53:15-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |          | BOLETIM DE MEDIÇÃO                               |                                                 | CONTRATO Nº 157/2024           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |          | B.M.Nº. 03                                       |                                                 | ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025 |  |                                                                                     |
| CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |          | PERÍODO: 01/02/2026 a 30/04/2026                 |                                                 | DATA: 30/04/2026               |  |                                                                                     |
| ITEM                                                                                                                                               | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                | UND                                                                                                             | MEDIDO   | CÁLCULO                                          |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04                                                                                                                                                 | TRECHO 2                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |          |                                                  |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001                                                                                                                                             | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |          |                                                  |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001.001                                                                                                                                         | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                       | m2                                                                                                              | 2.603,13 | > 612,50 x 4,25 = 2603,13m²                      |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001.002                                                                                                                                         | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m                                                                   | m3                                                                                                              | 434,88   | > 434,88m³ conforme destacado na tabela em anexo |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001.003                                                                                                                                         | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte                                                                          | m3                                                                                                              | 37,65    | > 37,65m³ conforme destacado na tabela em anexo  |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001.004                                                                                                                                         | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3                                                                                                              | 37,65    | > 37,65m³ conforme destacado na tabela em anexo  |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001.005                                                                                                                                         | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade= 1,5t/m³)                                                                     | tkm                                                                                                             | 112,95   | = 37,65 x 1,5 x 2 = 112,95tkm                    |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001.006                                                                                                                                         | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico        | m2                                                                                                              | 2.235,63 | > 612,50 x 3,65 = 2235,63m²                      |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.001.007                                                                                                                                         | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                   | m                                                                                                               | 1.225,00 | > 1225,00m                                       |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.002                                                                                                                                             | DRENAGEM SUPERFICIAL                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |          |                                                  |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 04.002.001                                                                                                                                         | Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete                                                                                                                     | m2                                                                                                              | 367,50   | > 1225,00 x 0,30 = 367,50m²                      |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 05                                                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |          |                                                  |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 05.001                                                                                                                                             | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                               | h                                                                                                               | 65,00    | > 130 x 98% = 65h                                |                                                 |                                |  |                                                                                     |
| 05.002                                                                                                                                             | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                               | h                                                                                                               | 130,00   | > 260 x 98% = 130h                               |                                                 |                                |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.<br>Data: ____/____/____ |          |                                                  | Aprovado para pagamento<br>Data: ____/____/____ |                                |  |                                                                                     |
| Engº Civil Paulo César Lima Júnior<br>CREA RN 2719934232                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |          |                                                  |                                                 |                                |  |                                                                                     |

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO CESAR LIMA JUNIOR  
 Data: 13/05/2025 12:07:38-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DIEGO OLIVEIRA BARROS  
 Data: 13/05/2026 12:11:32-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOAO VITOR REIS DOS SANTOS  
 Data: 13/05/2026 12:14:26-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| SECÇÃO |            |        |                     |        |                    |                     |        | TRECHO 2          |        |
|--------|------------|--------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|
|        | ÁREAS (m²) |        | SOMA DAS ÁREAS (m²) |        | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUME PARCIAL (m³) |        | VOLUME TOTAL (m³) |        |
|        | CORTE      | ATERRO | CORTE               | ATERRO |                    | CORTE               | ATERRO | CORTE             | ATERRO |
| E0     | 0,600      | 0,130  |                     |        |                    |                     |        |                   |        |
| E1     | 0,610      | 0,100  | 1,210               | 0,230  | 10,000             | 12,100              | 2,300  | 12,100            | 2,300  |
| E2     | 0,618      | 0,030  | 1,228               | 0,130  | 10,000             | 12,280              | 1,300  | 24,380            | 3,600  |
| E3     | 0,718      | 0,000  | 1,336               | 0,030  | 10,000             | 13,360              | 0,300  | 37,740            | 3,900  |
| E4     | 0,380      | 0,268  | 1,098               | 0,268  | 10,000             | 10,980              | 2,680  | 48,720            | 6,580  |
| E5     | 0,600      | 0,090  | 0,980               | 0,358  | 10,000             | 9,800               | 3,580  | 58,520            | 10,160 |
| E6     | 0,600      | 0,030  | 1,200               | 0,120  | 10,000             | 12,000              | 1,200  | 70,520            | 11,360 |
| E7     | 0,512      | 0,136  | 1,112               | 0,166  | 10,000             | 11,120              | 1,660  | 81,640            | 13,020 |
| E8     | 0,584      | 0,020  | 1,096               | 0,156  | 10,000             | 10,960              | 1,560  | 92,600            | 14,580 |
| E9     | 0,616      | 0,100  | 1,200               | 0,120  | 10,000             | 12,000              | 1,200  | 104,600           | 15,780 |
| E10    | 0,580      | 0,156  | 1,196               | 0,256  | 10,000             | 11,960              | 2,560  | 116,560           | 18,340 |
| E11    | 0,600      | 0,075  | 1,180               | 0,231  | 10,000             | 11,800              | 2,310  | 128,360           | 20,650 |
| E12    | 0,636      | 0,080  | 1,236               | 0,155  | 10,000             | 12,360              | 1,550  | 140,720           | 22,200 |
| E13    | 0,710      | 0,090  | 1,346               | 0,170  | 10,000             | 13,460              | 1,700  | 154,180           | 23,900 |
| E14    | 0,636      | 0,130  | 1,346               | 0,220  | 10,000             | 13,460              | 2,200  | 167,640           | 26,100 |
| E15    | 0,636      | 0,056  | 1,272               | 0,186  | 10,000             | 12,720              | 1,860  | 180,360           | 27,960 |
| E16    | 0,892      | 0,000  | 1,528               | 0,056  | 10,000             | 15,280              | 0,560  | 195,640           | 28,520 |
| E17    | 1,124      | 0,000  | 2,016               | 0,000  | 10,000             | 20,160              | 0,000  | 215,800           | 28,520 |
| E18    | 0,690      | 0,000  | 1,814               | 0,000  | 10,000             | 18,140              | 0,000  | 233,940           | 28,520 |
| E19    | 1,248      | 0,000  | 1,938               | 0,000  | 10,000             | 19,380              | 0,000  | 253,320           | 28,520 |
| E20    | 1,074      | 0,000  | 2,322               | 0,000  | 10,000             | 23,220              | 0,000  | 276,540           | 28,520 |
| E21    | 0,786      | 0,040  | 1,860               | 0,040  | 10,000             | 18,600              | 0,400  | 295,140           | 28,920 |
| E22    | 0,542      | 0,100  | 1,328               | 0,140  | 10,000             | 13,280              | 1,400  | 308,420           | 30,320 |
| E23    | 0,574      | 0,000  | 1,116               | 0,100  | 10,000             | 11,160              | 1,000  | 319,580           | 31,320 |
| E24    | 0,836      | 0,000  | 1,410               | 0,000  | 10,000             | 14,100              | 0,000  | 333,680           | 31,320 |
| E25    | 0,760      | 0,030  | 1,596               | 0,030  | 10,000             | 15,960              | 0,300  | 349,640           | 31,620 |
| E26    | 0,722      | 0,068  | 1,482               | 0,098  | 10,000             | 14,820              | 0,980  | 364,460           | 32,600 |
| E27    | 0,836      | 0,030  | 1,558               | 0,098  | 11,000             | 17,138              | 1,078  | 381,598           | 33,678 |
| E28    | 0,698      | 0,100  | 1,534               | 0,130  | 12,000             | 18,408              | 1,560  | 400,006           | 35,238 |
| E29    | 0,642      | 0,000  | 1,340               | 0,100  | 13,000             | 17,420              | 1,300  | 417,426           | 36,538 |
| E30    | 0,605      | 0,080  | 1,247               | 0,080  | 14,000             | 17,458              | 1,120  | 434,884           | 37,658 |

Documento assinado digitalmente  
 **JOAO VITOR REIS DOS SANTOS**  
 Data: 13/05/2026 12:14:26-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **DIEGO OLIVEIRA BARROS**  
 Data: 13/05/2026 12:11:32-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **PAULO CESAR LIMA JUNIOR**  
 Data: 13/05/2026 12:07:38-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO  
REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03


PERÍODO: 01/02/2026 A 30/04/2026

CONTRATO Nº 157/2024

ORDEM DE SERVIÇO  
INÍCIO - 05/07/2024



PLACA DA OBRA

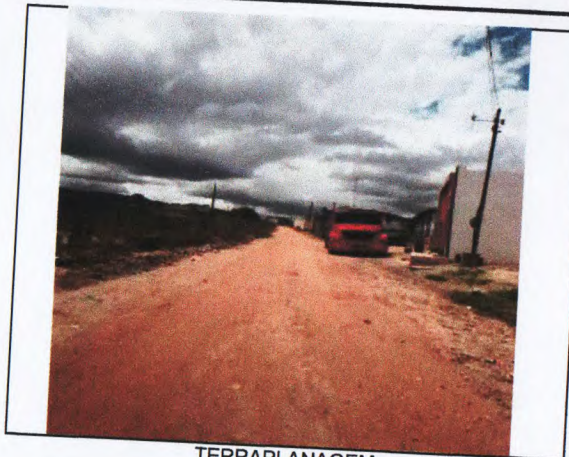


TERRAPLANAGEM



TERRAPLANAGEM



TERRAPLANAGEM

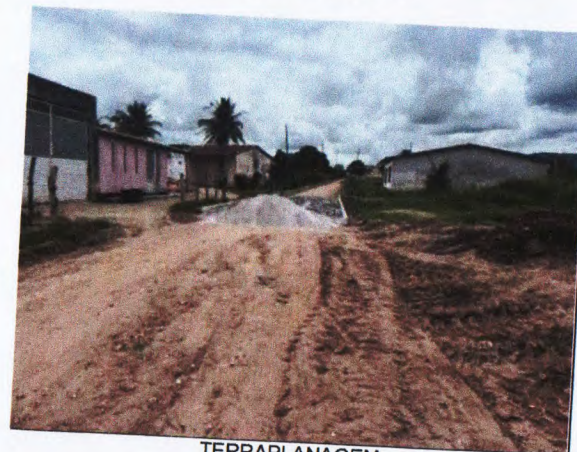

TERRAPLANAGEM



TERRAPLANAGEM

ELABORADO POR:

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

PERÍODO: 01/02/2026 A 30/04/2026

CONTRATO Nº 157/2024

ORDEN DE SERVIÇO  
INÍCIO - 05/07/2024



MEIO FIO, COLCHÃO DE AREIA E PARALELEPÍPEDO



MEIO FIO E COLCHÃO DE AREIA



MEIO FIO E PARALELEPÍPEDO



MEIO FIO, PARALELEPÍPEDO E REJUNTE



MEIO FIO, COLCHÃO DE AREIA E PARALELEPÍPEDO



MEIO FIO E COLCHÃO DE AREIA

ELABORADO POR:

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

PERÍODO: 01/02/2026 A 30/04/2026

CONTRATO Nº 157/2024

ORDEN DE SERVIÇO  
INÍCIO - 05/07/2024



PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA E MEIO FIO



PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA E MEIO FIO



PAVIMENTAÇÃO REJUNTADA E MEIO FIO



MEIO FIO, COLHÃO DE AREIA E PARALELEPÍPEDO



MEIO FIO, PARALELEPÍPEDO E REJUNTE



MEIO FIO, COLHÃO DE AREIA E PARALELEPÍPEDO

ELABORADO POR:

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

PERÍODO: 01/02/2026 A 30/04/2026

CONTRATO Nº 157/2024

ORDEN DE SERVIÇO  
INÍCIO - 05/07/2024



MEIO FIO, COLHÃO DE AREIA E PARALELEPÍPEDO



PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO



PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO



PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO



PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO



PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO CESAR LIMA JUNIOR  
Data: 07/05/2026 08:56:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DIEGO OLIVEIRA BARROS  
Data: 07/05/2026 09:42:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOAO VITOR REIS DOS SANTOS  
Data: 07/05/2026 09:53:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELABORADO POR:
