


Obra:		Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO Nº: 391/2025	
Contratada:		D&C CONSTRUTORA LTDA						B.M.Nº: 03						Data da medição: 24/04/2026	
CNPJ:		04.460.699/0001-23						Período: 07/04/2026 a 24/04/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO								9.080,34	8.300,21	780,13	9.080,34	0,00	100,00%	
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.080,34	8.300,21	780,13	9.080,34	0,00		
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	366,63	4.399,56	4.399,56	0,00	4.399,56	0,00	100,00%	
01.001.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	780,13	4.680,78	3.900,65	780,13	4.680,78	0,00	100,00%	
02	TRECHO 1								986.940,05	0,00	0,00	0,00	986.940,05	0,00%	
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								46.631,49	0,00	0,00	0,00	46.631,49		
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	1,64	10.244,54	0,00	0,00	0,00	10.244,54	0,00%	
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	2,41	15.054,47	0,00	0,00	0,00	15.054,47	0,00%	
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67			0,00	624,67	1,21	755,85	0,00	0,00	0,00	755,85		
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09			0,00	16.866,09	1,22	20.576,63	0,00	0,00	0,00	20.576,63	0,00%	
02.002	PAVIMENTAÇÃO								936.685,49	0,00	0,00	0,00	936.685,49	0,00%	
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	106,01	662.209,49	0,00	0,00	0,00	662.209,49	0,00%	
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24			0,00	2.180,24	42,14	91.875,31	0,00	0,00	0,00	91.875,31	0,00%	
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39			0,00	59,39	42,14	2.502,69	0,00	0,00	0,00	2.502,69	0,00%	
02.002.004	Pintura de meio fio (caliação)	m	2.239,63			0,00	2.239,63	4,81	10.772,62	0,00	0,00	0,00	10.772,62	0,00%	
02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,93			0,00	1.061,93	126,51	134.345,27	0,00	0,00	0,00	134.345,27	0,00%	
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22			0,00	28.672,22	1,22	34.980,11	0,00	0,00	0,00	34.980,11	0,00%	
02.003	LIMPEZA								3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%	
02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67			0,00	6.246,67	0,58	3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%	
03	TRECHO 2								1.973.376,93	262.508,90	400.774,34	663.283,24	1.310.093,69	33,61%	
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								93.137,03	12.391,90	18.866,87	31.258,77	61.878,26	33,56%	
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	12.476,49	1.660,00	2.549,00	4.209,00	8.267,49	1,64	20.461,44	2.722,40	4.180,36	6.902,76	13.558,68	38,74%	
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	12.476,49	1.660,00	2.549,00	4.209,00	8.267,49	2,41	30.068,34	4.000,60	6.143,09	10.143,69	19.924,65	33,74%	
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.247,65	166,00	254,90	420,90	826,75	1,21	1.509,66	200,86	308,42	509,28	1.000,38	33,73%	
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.686,55	4.482,00	6.750,00	11.232,00	22.454,55	1,22	41.097,59	5.468,04	8.235,00	13.703,04	27.394,55	33,34%	
03.002	PAVIMENTAÇÃO								1.873.003,54	249.154,20	380.429,05	629.583,25	1.243.420,29	33,61%	
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12.476,49	1.660,00	2.549,00	4.209,00	8.267,49	106,01	1.322.632,70	175.976,60	270.219,49	446.196,09	876.436,61	33,74%	
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	591,30	890,53	1.481,83	2.962,43	42,14	187.281,12	24.917,38	37.526,93	62.444,31	124.836,81	33,34%	
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	74,95	9,95	15,02	24,97	49,98	42,14	3.158,39	419,29	632,94	1.052,23	2.106,16	33,32%	
03.002.004	Pintura de meio fio (caliação)	m	4.519,21	591,30	890,53	1.481,83	3.037,38	4,81	21.737,40	2.844,15	4.283,44	7.127,59	14.609,81	32,79%	
03.002.005	Colchão de areia	m3	2.121,00	282,20	425,00	707,20	1.413,80	126,51	268.328,09	35.701,12	53.766,75	89.467,87	178.860,22	33,34%	
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	7.619,40	11.475,00	19.094,40	38.172,68	1,22	69.865,84	9.295,66	13.999,50	23.295,16	46.570,68	33,34%	
03.003	LIMPEZA								7.236,36	962,80	1.478,42	2.441,22	4.795,14	33,74%	
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	1.660,00	2.549,00	4.209,00	8.267,49	0,58	7.236,36	962,80	1.478,42	2.441,22	4.795,14	33,74%	
04	TRECHO 3								285.991,69	285.991,67	0,00	285.991,67	0,02	100,00%	

Obra:		D&C Construtora					BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 391/2025			
Contratada:							B.M.Nº: 03				Data da medição: 24/04/2026			
CNPJ:							Período: 07/04/2026 à 24/04/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES													
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	1,64	13.287,70	13.287,70	0,00	13.287,70	0,00	100,00%
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	2,41	2.919,20	2.919,20	0,00	2.919,20	0,00	100,00%
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	178,00	178,00		178,00	0,00	1,21	4.289,80	4.289,80	0,00	4.289,80	0,00	100,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.806,00	4.806,00		4.806,00	0,00	1,22	215,38	215,38	0,00	215,38	0,00	100,00%
04.002	PAVIMENTAÇÃO								5.863,32	5.863,32	0,00	5.863,32	0,00	100,00%
04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	734,60	734,60		734,60	0,00	42,14	271.671,59	271.671,57	0,00	271.671,57	0,02	100,00%
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	5,00		5,00	0,00	42,14	30.956,04	30.956,04	0,00	30.956,04	0,00	100,00%
04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	106,01	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	100,00%
04.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	739,60	739,60		739,60	0,00	4,81	188.697,80	188.697,80	0,00	188.697,80	0,00	100,00%
04.002.005	Colchão de areia	m3	302,60	302,60		302,60	0,00	126,51	3.557,48	3.557,47	0,00	3.557,47	0,01	100,00%
04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.170,20	8.170,20		8.170,20	0,00	1,22	38.281,93	38.281,92	0,00	38.281,92	0,01	100,00%
04.003	LIMPEZA								9.967,64	9.967,64	0,00	9.967,64	0,00	100,00%
04.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	0,58	1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
05	TRECHO 4								1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.058.058,05	0,00	0,00	0,00	1.058.058,05	0,00%
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.809,34			0,00	6.809,34	1,64	50.831,59	0,00	0,00	0,00	50.831,59	0,00%
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.809,34			0,00	6.809,34	2,41	11.167,32	0,00	0,00	0,00	11.167,32	0,00%
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,93			0,00	680,93	1,21	16.410,51	0,00	0,00	0,00	16.410,51	0,00%
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18.385,11			0,00	18.385,11	1,22	823,93	0,00	0,00	0,00	823,93	0,00%
05.002	PAVIMENTAÇÃO								22.429,83	0,00	0,00	0,00	22.429,83	0,00%
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.809,34			0,00	6.809,34	106,01	1.003.278,04	0,00	0,00	0,00	1.003.278,04	0,00%
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.050,70			0,00	2.050,70	42,14	721.858,13	0,00	0,00	0,00	721.858,13	0,00%
05.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	12,00			0,00	12,00	42,14	86.416,50	0,00	0,00	0,00	86.416,50	0,00%
05.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.062,70			0,00	2.062,70	4,81	505,68	0,00	0,00	0,00	505,68	0,00%
05.002.005	Colchão de areia	m3	1.157,58			0,00	1.157,58	126,51	9.921,59	0,00	0,00	0,00	9.921,59	0,00%
05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	31.254,66			0,00	31.254,66	1,22	146.445,45	0,00	0,00	0,00	146.445,45	0,00%
05.003	LIMPEZA								38.130,69	0,00	0,00	0,00	38.130,69	0,00%
05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.809,34			0,00	6.809,34	0,58	3.949,42	0,00	0,00	0,00	3.949,42	0,00%
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								3.949,42	0,00	0,00	0,00	3.949,42	0,00%
06.001	EQUIPE DIRIGENTE								101.372,04	12.783,00	9.224,85	22.007,85	79.364,19	21,71%
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	47,67	34,3980	82,07	295,93	131,94	101.372,04	12.783,00	9.224,85	22.007,85	79.364,19	21,71%
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	95,33	68,7960	164,13	591,87	68,12	49.873,32	6.289,02	4.538,47	10.827,49	39.045,83	21,71%
									51.498,72	6.493,98	4.686,38	11.180,36	40.318,36	21,71%
									4.414.820,10	569.583,78	410.779,32	980.363,10	3.434.457,00	22,21%

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº: 391/2025									
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M.Nº: 03		Data da medição: 24/04/2026									
CNPJ:	04.460.699/0001-23					Período: 07/04/2026 à 24/04/2026													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)										
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido					
Documentado assinado digitalmente gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 04/05/2026 11:03:34-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br								PERCENTUAL		100,00%		12,90%		9,30%		22,21%		77,79%	
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA								ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM DATA: ____/____/____		VALOR DA MEDIÇÃO:									
										R\$ 410.779,32									

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



D&C CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23

Objeto:

Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE

Contratada:

D&C CONSTRUTORA LTDA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 391/2025

B.M.Nº: 03

Período: 07/04/2026 a 24/04/2026

Data da medição: 24/04/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO						
				COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO									
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.001.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00						1,00	1,00
03	TRECHO 2									
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.549,00	526,65		4,84				2.549,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	2.549,00	526,65		4,84				2.549,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	254,90	526,65	0,10	4,84				254,90
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	6.750,00						6.750,00	6.750,00
03.002	PAVIMENTAÇÃO									
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.549,00	526,65		4,84				2.549,00
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	890,53	890,53						890,53
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	15,02	15,02						15,02

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	890,53	890,53						890,53
03.002.005	Colchão de areia	m3	425,00	516,53	0,17	4,84				425,00
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11.475,00						11.475,00	11.475,00
03.003	LIMPEZA									
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.549,00	526,65		4,84				2.549,00
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
06.001	EQUIPE DIRIGENTE									
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	34,3980						34,3980	34,3980
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	68,7960						68,7960	68,7960

D&C CONSTRUTORA LTDA

Documento assinado digitalmente

gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

Data: 27/04/2026 10:07:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

Jhon Lennon Gomes Santos

Eng. Civil CREA - 2721894692

Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos

Eng. Civil CREA - 272335922-0

Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 03

Ref.: Contrato 391/2025

Objeto: Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecnas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Evaldir da Silva Ramos R.G. nº: 40.642.163-8 – SSP/SP e CPF nº: 324.302.278-94, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição nº 03 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 07/04/2026 até 24/04/2026, conforme Boletim de Medição nº 03.**




Travessa José Mecnas Filho
Nº46A – Centro São Domingos – se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltda@gmail.com
João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

o nosso
através
do QR CODE



Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

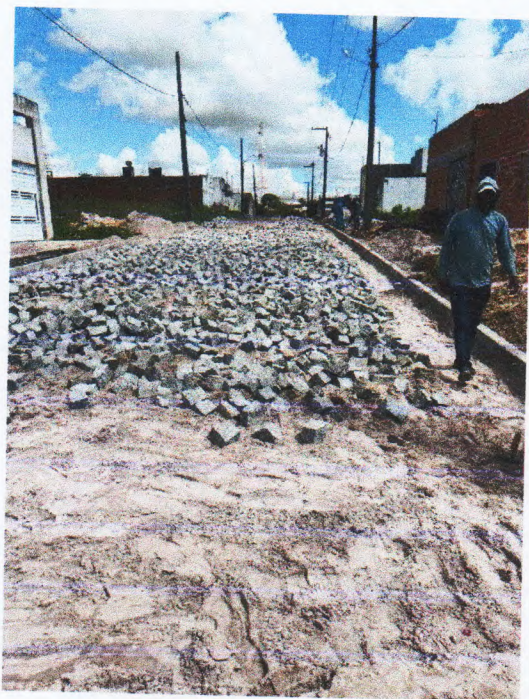

📍 Travessa José Mecnas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itahelana

☎ 79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltda@gmail.com

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

o nosso
através
do QR CODE



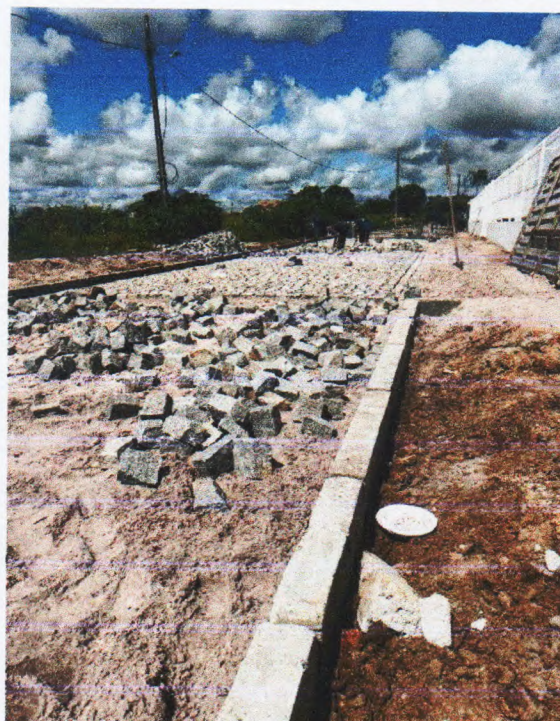

Acesse o nosso
site através
do QR CODE




Travessa José Mecnas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltida@gmail.com

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

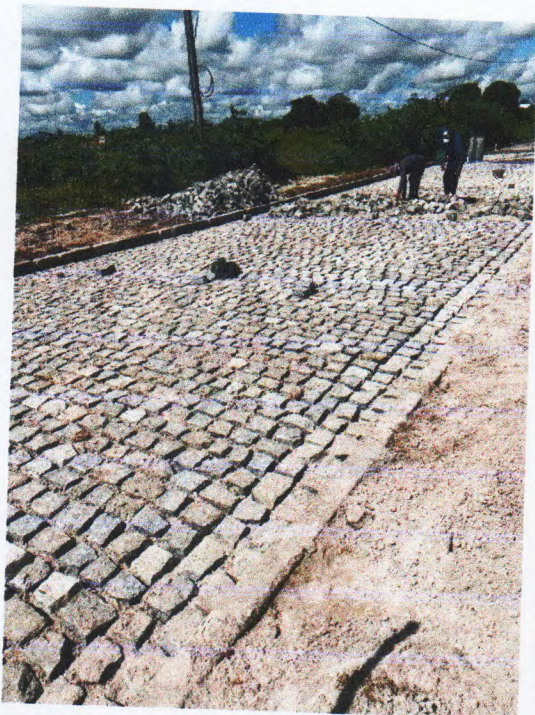

Travessa José Mecnas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE



Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Itabaiana/SE, em 27 de abril de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 27/04/2026 10:07:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro de Assis Ferreira

Engenheiro Civil CREA/SE nº 270963955-6

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

📍 Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

📞 79 9 9154-1021
📧 @deconstrutora
📧 deconstrucoesltida@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE

