

MOBICON CONSTRUTORA		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA															
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM		3		CONTRATO:166/2024								
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)												
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	10.445,64	R\$	10.445,64	R\$	-	R\$	10.445,64	R\$	-	100,00%		
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02.01.2022	m2	12,00	12,00		12,00	R\$	458,67	R\$	5.504,04	R\$	5.504,04	R\$	-	R\$	5.504,04	R\$	-	100,00%
01.002	Locação de container - Almoxtarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02.02.2022	mês	5,00	5,00		5,00	R\$	988,32	R\$	4.941,60	R\$	4.941,60	R\$	-	R\$	4.941,60	R\$	-	100,00%
02	CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"						R\$	79.854,97	R\$	19.437,11	R\$	-	R\$	19.437,11	R\$	60.417,86	24,34%		
02.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$	16.871,76	R\$	16.871,76	R\$	-	R\$	16.871,76	-R\$	0,00	100,00%		
02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno e retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt ate 11m	m2	509,65	509,65		509,65	R\$	2,41	R\$	1.228,26	R\$	1.228,26	R\$	-	R\$	1.228,26	R\$	0,00	100,00%
02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	509,65	509,65		509,65	R\$	1,14	R\$	581,00	R\$	581,00	R\$	-	R\$	581,00	-R\$	0,00	100,00%
02.001.003	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	254,82	254,82		254,82	R\$	14,82	R\$	3.776,43	R\$	3.776,43	R\$	-	R\$	3.776,43	-R\$	0,00	100,00%
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.586,85	4.586,85		4.586,85	R\$	1,07	R\$	4.907,93	R\$	4.907,93	R\$	-	R\$	4.907,93	R\$	0,00	100,00%
02.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	254,82	254,82		254,82	R\$	25,03	R\$	6.378,14	R\$	6.378,14	R\$	-	R\$	6.378,14	-R\$	0,00	100,00%
02.002	PAVIMENTAÇÃO						R\$	9.304,97	R\$	2.565,35	R\$	-	R\$	2.565,35	R\$	6.739,62	27,57%		
02.002.001	Meio-fio pre moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	62,13	62,13		62,13	R\$	41,29	R\$	2.565,35	R\$	2.565,35	R\$	-	R\$	2.565,35	R\$	0,00	100,00%
02.002.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	69,31	0,00		-	R\$	49,95	R\$	3.462,03	R\$	-	R\$	-	R\$	3.462,03		0,00%	
02.002.003	Lona plástica preta	m2	69,31	0,00		-	R\$	7,05	R\$	488,64	R\$	-	R\$	-	R\$	488,64		0,00%	
02.002.004	Piso de blocos (lapota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e e = 8cm concreto sobre cokoção de areia	m2	23,22	0,00		-	R\$	120,11	R\$	2.788,95	R\$	-	R\$	-	R\$	2.788,95		0,00%	
02.003	VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO						R\$	24.467,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.467,92		0,00%	
02.003.001	TIPO 1 (3X)						R\$	10.114,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.114,07		0,00%	
02.003.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78	0,00		-	R\$	2.936,04	R\$	5.226,15	R\$	-	R\$	-	R\$	5.226,15		0,00%	
02.003.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91	0,00		-	R\$	45,39	R\$	1.085,27	R\$	-	R\$	-	R\$	1.085,27		0,00%	
02.003.001.003	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento - areia) - Rev 02.04/2022	m2	23,91	0,00		-	R\$	23,94	R\$	572,41	R\$	-	R\$	-	R\$	572,41		0,00%	
02.003.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demões de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91	0,00		-	R\$	135,10	R\$	3.230,24	R\$	-	R\$	-	R\$	3.230,24		0,00%	
02.003.002	TIPO 2 (3X)						R\$	10.627,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.627,69		0,00%	
02.003.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98	0,00		-	R\$	2.936,04	R\$	5.813,36	R\$	-	R\$	-	R\$	5.813,36		0,00%	
02.003.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55	0,00		-	R\$	45,39	R\$	1.068,93	R\$	-	R\$	-	R\$	1.068,93		0,00%	
02.003.002.003	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento - areia) - Rev 02.04/2022	m2	23,55	0,00		-	R\$	23,94	R\$	563,79	R\$	-	R\$	-	R\$	563,79		0,00%	
02.003.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demões de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55	0,00		-	R\$	135,10	R\$	3.181,61	R\$	-	R\$	-	R\$	3.181,61		0,00%	
02.003.003	TIPO 3 (1X)						R\$	3.726,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.726,16		0,00%	
02.003.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71	0,00		-	R\$	2.936,04	R\$	2.084,59	R\$	-	R\$	-	R\$	2.084,59		0,00%	
02.003.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03	0,00		-	R\$	45,39	R\$	364,48	R\$	-	R\$	-	R\$	364,48		0,00%	
02.003.003.003	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento - areia) - Rev 02.04/2022	m2	8,03	0,00		-	R\$	23,94	R\$	192,24	R\$	-	R\$	-	R\$	192,24		0,00%	
02.003.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demões de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03	0,00		-	R\$	135,10	R\$	1.084,85	R\$	-	R\$	-	R\$	1.084,85		0,00%	
02.004	MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"						R\$	11.113,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.113,14		0,00%	

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522

Rizla Muelne S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA		BM		3		CONTRATO:166/2024							
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana		PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
02.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1 2 8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23	0,00	-	R\$ 120,18	R\$ 2.190,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.190,88	0,00%	
02.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1 2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46	0,00	-	R\$ 45,39	R\$ 1.654,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.654,92	0,00%	
02.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1 3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	36,46	0,00	-	R\$ 23,94	R\$ 872,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 872,85	0,00%	
02.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 04	m³	2,88	0,00	-	R\$ 173,82	R\$ 500,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,60	0,00%	
02.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	3,60	0,00	-	R\$ 1,21	R\$ 4,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,36	0,00%	
02.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82	0,00	-	R\$ 1,07	R\$ 69,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	0,00%	
02.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,31	0,00	-	R\$ 702,31	R\$ 217,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,72	0,00%	
02.004.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Branco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliante ou similar, aplicado com argamassa industrializada A17-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40	0,00	-	R\$ 172,05	R\$ 4.198,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.198,02	0,00%	
02.004.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25	0,00	-	R\$ 624,19	R\$ 1.404,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,43	0,00%	
02.005	MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"						R\$ 3.281,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.281,99	0,00%	
02.005.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1 2 8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00	0,00	-	R\$ 120,18	R\$ 480,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,72	0,00%	
02.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1 2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00	0,00	-	R\$ 45,39	R\$ 363,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,12	0,00%	
02.005.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1 3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	8,00	0,00	-	R\$ 23,94	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,52	0,00%	
02.005.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 04	m³	8,03	0,00	-	R\$ 173,82	R\$ 1.395,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,77	0,00%	
02.005.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	10,04	0,00	-	R\$ 1,21	R\$ 12,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,15	0,00%	
02.005.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72	0,00	-	R\$ 1,07	R\$ 193,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,37	0,00%	
02.005.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,27	0,00	-	R\$ 702,31	R\$ 189,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,62	0,00%	
02.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35	0,00	-	R\$ 48,74	R\$ 455,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,72	0,00%	
02.006	DIVERSOS						R\$ 14.815,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.815,19	0,00%	
02.006.001	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	417,12	0,00	-	R\$ 24,05	R\$ 10.031,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.031,74	0,00%	
02.006.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 05/2021	m2	18,64	0,00	-	R\$ 18,56	R\$ 345,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,96	0,00%	
02.006.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50	0,00	-	R\$ 218,09	R\$ 2.944,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,22	0,00%	
02.006.004	Limpeza geral	m2	509,65	0,00	-	R\$ 2,93	R\$ 1.493,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,27	0,00%	
03	ROTATÓRIA 1						R\$ 234.333,41	R\$ -	R\$ 7.957,83	R\$ 7.957,83	R\$ 226.375,58	3,40%	
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 48.134,54	R\$ -	R\$ 5.161,67	R\$ 5.161,67	R\$ 42.972,87	10,72%	
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dimt ate 1km	m2	1.453,99	0,00	1.453,99	1.453,99	R\$ 2,41	R\$ 3.504,12	R\$ -	R\$ 3.504,12	R\$ 3.504,12	R\$ -	100,00%
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.453,99	0,00	1.453,99	1.453,99	R\$ 1,14	R\$ 1.657,55	R\$ -	R\$ 1.657,55	R\$ 1.657,55	R\$ -	100,00%
03.001.003	Material para sub-base, ebr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	727,00	0,00	-	R\$ 14,82	R\$ 10.774,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.774,14	0,00%	
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	13.085,91	0,00	-	R\$ 1,07	R\$ 14.001,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.001,92	0,00%	
03.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m³	727,00	0,00	-	R\$ 25,03	R\$ 18.196,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.196,81	0,00%	
03.002	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 100.107,53	R\$ -	R\$ 2.796,16	R\$ 2.796,16	R\$ 97.311,37	2,79%	
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44	0,00	-	R\$ 7,05	R\$ 4.458,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.458,70	0,00%	

José Garcia de Oliveira Junior
Eng. CIVIL CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo

Rizla Maíne S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo

MODICON		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA										
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM		3		CONTRATO:166/2024			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
03.002.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	632,44	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 31.590,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.590,38	0,00%	
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	188,74	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 3.503,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,01	0,00%	
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev.01	m²	91,71	0,00		-	R\$ 111,19	R\$ 10.197,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.197,23	0,00%	
03.002.005	Mero-fô pre moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	375,95	0,00	67,72	67,72	R\$ 41,29	R\$ 15.522,98	R\$ -	R\$ 2.796,16	R\$ 2.796,16	R\$ 12.726,82	18,01%	
03.002.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78	0,00		-	R\$ 120,11	R\$ 4.177,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.177,43	0,00%	
03.002.007	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(mm)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada e placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	164,11	0,00		-	R\$ 103,00	R\$ 16.903,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.903,33	0,00%	
03.002.008	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	135,86	0,00		-	R\$ 101,24	R\$ 13.754,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.754,47	0,00%	
03.003	VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO							R\$ 12.453,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.453,31	0,00%	
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.167,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.167,43	0,00%	
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.617,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,70	0,00%	
03.003.003	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.02/04/2022	m2	35,64	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 853,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,22	0,00%	
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p. demão - R1	m2	35,64	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 4.814,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.814,96	0,00%	
03.004	MARCO "SÍMBOLO ITABAIANA"							R\$ 18.881,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.881,81	0,00%	
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10	0,00		-	R\$ 120,18	R\$ 1.934,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,90	0,00%	
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.461,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.461,56	0,00%	
03.004.003	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.02/04/2022	m2	32,20	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 770,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,87	0,00%	
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	16,56	0,00		-	R\$ 173,82	R\$ 2.878,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.878,46	0,00%	
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70	0,00		-	R\$ 1,21	R\$ 25,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,05	0,00%	
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção / densidade=1,5t/m³)	tkm	372,60	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 398,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,68	0,00%	
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05	0,00		-	R\$ 702,31	R\$ 1.439,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.439,74	0,00%	
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	41,10	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 762,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,82	0,00%	
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p. demão - R1	m2	16,10	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.175,11	0,00%	
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27	0,00		-	R\$ 624,19	R\$ 7.034,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.034,62	0,00%	
03.005	CANTEIRO "PERGOLADOS"							R\$ 29.733,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.733,77	0,00%	
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(mm)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada e placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	24,94	0,00		-	R\$ 110,95	R\$ 2.767,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.767,09	0,00%	

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador do Núcleo

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo

MODICON		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM	3	CONTRATO:166/2024				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(mn)=35MPa, sob covam areia grossa compactada e placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado e areia fina	m2	25,82	0,00		-	R\$ 103,00	R\$ 2.659,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,46	0,00%
03.005.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 775,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,85	0,00%
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo af_11/2021	m2	56,57	0,00		-	R\$ 328,07	R\$ 18.558,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.558,92	0,00%
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22,80	0,00		-	R\$ 218,09	R\$ 4.972,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.972,45	0,00%
03.006	DIVERSOS							R\$ 25.022,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.022,45	0,00%
03.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	395,09	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 9.501,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.501,91	0,00%
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	32,89	0,00		-	R\$ 218,09	R\$ 7.172,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.172,98	0,00%
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck= 25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	0,00		-	R\$ 410,89	R\$ 1.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232,67	0,00%
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af_05/2021	m2	112,79	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 2.093,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,38	0,00%
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.453,99	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 4.260,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.260,19	0,00%
04	ROTATORIA 2							R\$ 280.134,49	R\$ 6.536,21	R\$ 6.970,43	R\$ 13.506,64	R\$ 266.627,85	4,82%
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 65.001,68	R\$ -	R\$ 6.970,43	R\$ 6.970,43	R\$ 58.031,25	10,72%
04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno e retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt ate 1km	m2	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ 4.732,04	R\$ 4.732,04	R\$ -	100,00%
04.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ 2.238,39	R\$ 2.238,39	R\$ -	100,00%
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%
04.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.573,20	0,00%
04.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 138.300,65	R\$ 6.536,21	R\$ -	R\$ 6.536,21	R\$ 131.764,44	4,73%
04.002.001	Mex-flo pre moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	580,20	158,30	-	158,30	R\$ 41,29	R\$ 23.956,46	R\$ 6.536,21	R\$ -	R\$ 6.536,21	R\$ 17.420,25	27,28%
04.002.002	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 1.556,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.556,10	0,00%
04.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.890,00	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 2.022,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.022,30	0,00%
04.002.004	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 2.628,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628,15	0,00%
04.002.005	Lona plástica preta	m2	957,60	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 6.751,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.751,08	0,00%
04.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	957,60	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 47.832,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.832,12	0,00%
04.002.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos incluso fundo preparador af_05/2021	m2	957,60	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 17.773,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.773,06	0,00%
04.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(mn)=35MPa, sob covam areia grossa compactada e placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado e areia fina	m2	322,50	0,00	-	-	R\$ 110,95	R\$ 35.781,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.781,38	0,00%
04.003	ALVENARIA DE PEDRA							R\$ 16.971,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.971,42	0,00%
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade ate 1,50m	m3	7,04	0,00	-	-	R\$ 64,72	R\$ 455,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,63	0,00%
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40	0,00	-	-	R\$ 12,91	R\$ 108,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,44	0,00%
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,40	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 32,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,53	0,00%

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. CIVIL CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo

Riziane Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MOBICON		CONSTRUTORA		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.				PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA								BM		3		CONTRATO:166/2024					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana								PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)									
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido				
04.003.004	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1.5) - 1 saco cimento 50kg - 5 pedras areia dm - 0.3520-450,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	19,47	0,00		-	R\$ 636,19	R\$ 12.386,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.386,62	0,00%			
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1.3 (cimento - areia) - Rev.02.08/2015	m2	39,10	0,00		-	R\$ 8,12	R\$ 317,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,49	0,00%			
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1.5 - 1.2.8 (cimento - cal - areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10	0,00		-	R\$ 42,28	R\$ 1.653,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,15	0,00%			
04.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com levantamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev. 03	m2	39,10	0,00		-	R\$ 51,60	R\$ 2.017,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.017,56	0,00%			
04.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO							R\$ 17.900,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.900,25	0,00%			
04.004.001	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço 1 - 1.3 (cimento - areia) - Rev.02.04/2022	m2	36,72	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 879,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,08	0,00%			
04.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1.5 - 1.2.8 (cimento - cal - areia), espessura 2,5 cm	m2	36,72	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.666,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666,72	0,00%			
04.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p. demão - R1	m2	36,72	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 4.960,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.960,87	0,00%			
04.004.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,54	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 10.393,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.393,58	0,00%			
04.005	DIVERSOS							R\$ 41.960,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.960,49	0,00%			
04.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	608,30	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 14.629,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.629,62	0,00%			
04.005.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	73,10	0,00		-	R\$ 218,09	R\$ 15.942,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.942,38	0,00%			
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%			
04.005.004	Letra em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	0,00		-	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,56	0,00%			
04.005.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	174,06	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 3.230,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,55	0,00%			
04.005.006	Limpeza geral	m2	1.963,50	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,06	0,00%			
05	RÓTULA 3							R\$ 312.182,52	R\$ -	R\$ 22.041,28	R\$ 22.041,28	R\$ 290.141,24	7,06%				
05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 65.001,68	R\$ -	R\$ 6.970,43	R\$ 6.970,43	R\$ 58.031,25	10,72%				
05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt ate 1km	m2	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ 4.732,04	R\$ 4.732,04	R\$ -	100,00%				
05.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ 2.238,39	R\$ 2.238,39	R\$ -	100,00%				
05.001.003	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%				
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%				
05.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.573,20	0,00%				
05.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 136.913,26	R\$ -	R\$ 15.070,85	R\$ 15.070,85	R\$ 121.842,41	11,01%				
05.002.001	Mexo-fio pre moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1.3	m	365,00	0,00	365,00	365,00	R\$ 41,29	R\$ 15.070,85	R\$ -	R\$ 15.070,85	R\$ 15.070,85	R\$ -	100,00%				
05.002.002	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	114,06	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 1.690,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690,37	0,00%				
05.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 183,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,07	0,00%				
05.002.004	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 2.854,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.854,92	0,00%				
05.002.005	Lona plastica preta	m2	858,61	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 6.053,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.053,20	0,00%				
05.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 42.887,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.887,57	0,00%				
05.002.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	858,61	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 15.935,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.935,80	0,00%				

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MOBICON CONSTRUTORA		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM	3	CONTRATO:166/2024				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
05.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 10x20cm, e= 8cm, 46un/m2, NBR0781, Fck(mn)=35MPa, sob c/oxim areia grossa compactada e/ placa vibratória, etcomp =6cm, rejuntado e/ areia fina.	m2	470,82	0,00	-	R\$ 110,95	R\$ 52.237,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.237,48	0,00%	
05.003	ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO						R\$ 22.394,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.394,77	0,00%	
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00	0,00	-	R\$ 64,72	R\$ 970,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,80	0,00%	
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	0,00	-	R\$ 1,21	R\$ 21,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,78	0,00%	
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	0,00	-	R\$ 1,07	R\$ 57,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,78	0,00%	
05.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg - 5 pedras areia dim 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	15,00	0,00	-	R\$ 636,19	R\$ 9.542,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.542,85	0,00%	
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1 2 8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev 06	m2	43,64	0,00	-	R\$ 80,17	R\$ 3.498,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,62	0,00%	
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1 2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	87,28	0,00	-	R\$ 45,39	R\$ 3.961,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.961,64	0,00%	
05.003.007	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço 11 - 1 3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	87,28	0,00	-	R\$ 23,94	R\$ 2.089,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.089,48	0,00%	
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,64	0,00	-	R\$ 51,60	R\$ 2.251,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,82	0,00%	
05.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO						R\$ 28.682,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.682,63	0,00%	
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1 2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	64,33	0,00	-	R\$ 45,39	R\$ 2.919,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.919,94	0,00%	
05.004.002	Chapisco em parede, rustico, com argamassa traço 11 - 1 3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	64,33	0,00	-	R\$ 23,94	R\$ 1.540,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,06	0,00%	
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,29	0,00	-	R\$ 2.936,04	R\$ 15.531,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.531,65	0,00%	
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p' demão - R1	m2	64,33	0,00	-	R\$ 135,10	R\$ 8.690,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.690,98	0,00%	
05.005	DIVERSOS						R\$ 59.190,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.190,18	0,00%	
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo af_11/2021	m2	58,80	0,00	-	R\$ 328,07	R\$ 19.290,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.290,52	0,00%	
05.005.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	558,70	0,00	-	R\$ 24,05	R\$ 13.436,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.436,74	0,00%	
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00	0,00	-	R\$ 218,09	R\$ 11.776,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.776,86	0,00%	
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00	-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%	
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	0,00	-	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,56	0,00%	
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	un	4,00	0,00	-	R\$ 1.123,95	R\$ 4.495,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.495,80	0,00%	
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af_05/2021	m2	109,50	0,00	-	R\$ 18,56	R\$ 2.032,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,32	0,00%	
05.005.008	Limpeza geral	m2	1.963,50	0,00	-	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,06	0,00%	
06	CANTEIRO 1						R\$ 134.864,64	R\$ 57.021,89	R\$ -	R\$ 57.021,89	R\$ 77.842,75	42,28%	
06.001	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						R\$ 45.957,82	R\$ 45.957,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	100,00%	
06.001.001	Limpeza mecanizada do terreno e retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt ate 11km	m2	1.388,25	1.388,25	1.388,25	R\$ 2,41	R\$ 3.345,68	R\$ 3.345,68	R\$ -	R\$ 3.345,68	R\$ 0,00	100,00%	
06.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.388,25	1.388,25	1.388,25	R\$ 1,14	R\$ 1.582,61	R\$ 1.582,61	R\$ -	R\$ 1.582,61	R\$ 0,01	100,00%	
06.001.003	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	694,12	694,12	694,12	R\$ 14,82	R\$ 10.286,86	R\$ 10.286,86	R\$ -	R\$ 10.286,86	R\$ 0,00	100,00%	
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12.494,25	12.494,25	12.494,25	R\$ 1,07	R\$ 13.368,85	R\$ 13.368,85	R\$ -	R\$ 13.368,85	R\$ 0,00	100,00%	

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522

Rizla Menezes Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana		BM		3		CONTRATO:166/2024					
				PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
06.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	694,12	694,12		694,12	R\$ 25,03	R\$ 17.373,82	R\$ 17.373,82	R\$ -	R\$ 17.373,82	-R\$ 0,00	100,00%
06.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 71.164,67	R\$ 11.064,07	R\$ -	R\$ 11.064,07	R\$ 60.100,60	15,55%
06.002.001	Mexo-fio pre moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	461,25	267,96		267,96	R\$ 41,29	R\$ 19.045,01	R\$ 11.064,07	R\$ -	R\$ 11.064,07	R\$ 7.980,94	58,09%
06.002.002	Lona plástica preta	m2	372,47	0,00		-	R\$ 7,05	R\$ 2.625,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.625,91	0,00%
06.002.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	372,47	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 18.604,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.604,88	0,00%
06.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev: 01	m²	214,67	0,00		-	R\$ 143,89	R\$ 30.888,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.888,87	0,00%
06.003	DIVERSOS							R\$ 17.742,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.742,15	0,00%
06.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 3.907,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.907,40	0,00%
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck= 25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	464,72	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 8.625,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.625,20	0,00%
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 4.067,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.067,57	0,00%
07	CANTEIRO 2							R\$ 554.117,37	R\$ 213.885,35	R\$ -	R\$ 213.885,35	R\$ 340.232,02	38,60%
07.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 125.207,21	R\$ 100.165,80	R\$ -	R\$ 100.165,80	R\$ 25.041,41	80,00%
07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.782,13	3025,70		3.025,70	R\$ 2,41	R\$ 9.114,93	R\$ 7.291,94	R\$ -	R\$ 7.291,94	R\$ 1.822,99	80,00%
07.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.782,13	3025,70		3.025,70	R\$ 1,14	R\$ 4.311,63	R\$ 3.449,30	R\$ -	R\$ 3.449,30	R\$ 862,33	80,00%
07.001.003	Material para sub-base, cbr > 20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.891,06	1512,85		1.512,85	R\$ 14,82	R\$ 28.025,51	R\$ 22.420,44	R\$ -	R\$ 22.420,44	R\$ 5.605,07	80,00%
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade= 1,5t/m³	tkm	34.039,17	27231,30		27.231,30	R\$ 1,07	R\$ 36.421,91	R\$ 29.137,49	R\$ -	R\$ 29.137,49	R\$ 7.284,42	80,00%
07.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.891,06	1512,85		1.512,85	R\$ 25,03	R\$ 47.333,23	R\$ 37.866,64	R\$ -	R\$ 37.866,64	R\$ 9.466,59	80,00%
07.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 355.309,34	R\$ 113.719,55	R\$ -	R\$ 113.719,55	R\$ 241.589,79	32,01%
07.002.001	Mexo-fio pre moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.755,14	930,00		930,00	R\$ 41,29	R\$ 113.759,73	R\$ 38.399,70	R\$ -	R\$ 38.399,70	R\$ 75.360,03	33,76%
07.002.002	Lona plastica preta	m2	1.718,35	499,01		499,01	R\$ 7,05	R\$ 12.114,37	R\$ 3.518,02	R\$ -	R\$ 3.518,02	R\$ 8.596,35	29,04%
07.002.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.718,35	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 85.831,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.831,58	0,00%
07.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plastica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev: 01	m²	998,01	499,01		499,01	R\$ 143,89	R\$ 143.603,66	R\$ 71.801,83	R\$ -	R\$ 71.801,83	R\$ 71.801,83	50,00%
07.003	DIVERSOS							R\$ 73.600,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.600,82	0,00%
07.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	784,90	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 18.876,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.876,85	0,00%
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck= 25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 1.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,64	0,00%
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m2	2.269,38	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 42.119,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.119,69	0,00%
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.782,13	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 11.081,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.081,64	0,00%
08	CANTEIRO 3							R\$ 350.960,48	R\$ 54.895,14	R\$ 68.074,79	R\$ 122.969,93	R\$ 227.990,55	35,04%
08.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 85.015,75	R\$ 42.508,14	R\$ 42.507,61	R\$ 85.015,75	-R\$ 0,00	100,00%
08.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.568,07	1284,04	1.284,03	2.568,07	R\$ 2,41	R\$ 6.189,05	R\$ 3.094,54	R\$ 3.094,51	R\$ 6.189,05	R\$ 0,00	100,00%
08.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.568,07	1284,04	1.284,03	2.568,07	R\$ 1,14	R\$ 2.927,60	R\$ 1.463,81	R\$ 1.463,79	R\$ 2.927,60	R\$ 0,00	100,00%
08.001.003	Material para sub-base cbr > 20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.284,03	642,02	642,01	1.284,03	R\$ 14,82	R\$ 19.029,32	R\$ 9.514,74	R\$ 9.514,59	R\$ 19.029,33	R\$ 0,00	100,00%

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo

Rízia Múene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.						PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA								BM		3		CONTRATO:166/2024				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana								PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)								
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido			
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	23.112,63	11556,36	11.556,27	23.112,63	R\$ 1,07	R\$ 24.730,51	R\$ 12.365,31	R\$ 12.365,21	R\$ 24.730,52	R\$ 0,00	100,00%			
08.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m³	1.284,03	642,02	642,01	1.284,03	R\$ 25,03	R\$ 32.139,27	R\$ 16.069,76	R\$ 16.069,51	R\$ 32.139,27	R\$ 0,00	100,00%			
08.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 217.628,52	R\$ 12.387,00	R\$ 25.567,18	R\$ 37.954,18	R\$ 179.674,34	17,44%			
08.002.001	Mexo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.633,71	309,00	619,21	919,21	R\$ 41,29	R\$ 67.455,89	R\$ 12.387,00	R\$ 25.567,18	R\$ 37.954,18	R\$ 29.501,71	56,27%			
08.002.002	Lona plástica preta	m²	1.183,54	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 8.343,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.343,96	0,00%			
08.002.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	1.183,54	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 59.117,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.117,82	0,00%			
08.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev.01	m²	574,82	0,00	-	-	R\$ 143,89	R\$ 82.710,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.710,85	0,00%			
08.003	DIVERSOS							R\$ 48.316,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.316,21	0,00%			
08.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	467,29	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 11.238,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.238,32	0,00%			
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	0,00	-	-	R\$ 380,66	R\$ 1.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,64	0,00%			
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m²	1.510,28	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 28.030,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.030,80	0,00%			
08.003.004	Limpeza geral	m²	2.568,07	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 7.524,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.524,45	0,00%			
09	CANTEIRO 4							R\$ 166.550,30	R\$ -	R\$ 22.067,85	R\$ 22.067,85	R\$ 144.482,45	13,25%			
09.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 52.977,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.977,26	0,00%			
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 11km	m²	1.600,28	0,00	-	-	R\$ 2,41	R\$ 3.856,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.856,67	0,00%			
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	1.600,28	0,00	-	-	R\$ 1,14	R\$ 1.824,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.824,32	0,00%			
09.001.003	Material para sub-base, cbr = 20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusiv e transporte	m³	800,14	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 11.858,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.858,07	0,00%			
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.402,52	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 15.410,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.410,70	0,00%			
09.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m³	800,14	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 20.027,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.027,50	0,00%			
09.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 88.915,12	R\$ -	R\$ 22.067,85	R\$ 22.067,85	R\$ 66.847,27	24,82%			
09.002.001	Mexo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.523,60	0,00	534,46	534,46	R\$ 41,29	R\$ 62.909,44	R\$ -	R\$ 22.067,85	R\$ 22.067,85	R\$ 40.841,59	35,08%			
09.002.002	Lona plástica preta	m²	456,24	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 3.216,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,49	0,00%			
09.002.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	456,24	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 22.789,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.789,19	0,00%			
09.003	DIVERSOS							R\$ 24.657,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.657,92	0,00%			
09.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	195,58	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 4.703,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.703,70	0,00%			
09.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	0,00	-	-	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%			
09.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af. 05/2021	m²	760,96	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 14.123,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.123,42	0,00%			
09.003.004	Limpeza geral	m²	1.600,28	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 4.688,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.688,82	0,00%			
10	IRRIGAÇÃO							R\$ 418.510,21	R\$ 15.921,10	R\$ -	R\$ 15.921,10	R\$ 402.589,11	3,80%			
10.001	POÇOS ARTESIANOS							R\$ 79.681,98	R\$ 15.921,10	R\$ -	R\$ 15.921,10	R\$ 63.760,88	19,98%			
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária - Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	300,00	60,00	-	60,00	R\$ 127,25	R\$ 38.175,00	R\$ 7.635,00	R\$ -	R\$ 7.635,00	R\$ 30.540,00	20,00%			
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	300,00	60,00	-	60,00	R\$ 137,01	R\$ 41.103,00	R\$ 8.220,60	R\$ -	R\$ 8.220,60	R\$ 32.882,40	20,00%			
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	3,00	1,00	-	1,00	R\$ 65,50	R\$ 196,50	R\$ 65,50	R\$ -	R\$ 65,50	R\$ 131,00	33,33%			
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00	0,00	-	-	R\$ 69,16	R\$ 207,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,48	0,00%			
10.002	CASA DE BOMBAS							R\$ 8.143,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.143,73	0,00%			

José Garcia de Oliveira Junior
Eng. Civil/CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo


Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo

MODICON		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA				BM		3		CONTRATO:166/2024					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana				PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", diâmetro 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadendo - Rev. 01	un	3,00	0,00		-	R\$ 523,57	R\$ 1.570,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,71	0,00%
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46	0,00		-	R\$ 2.671,96	R\$ 6.573,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.573,02	0,00%
10.003	REDE DE IRRIGAÇÃO							R\$ 330.684,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.684,50	0,00%
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider B0'S4'5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00	0,00		-	R\$ 6.939,83	R\$ 20.819,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.819,49	0,00%
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49	0,00		-	R\$ 16,44	R\$ 52.418,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.418,78	0,00%
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC e/ou borboleta, d = 1"	un	6,00	0,00		-	R\$ 53,68	R\$ 322,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,08	0,00%
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscaável diâmetro 1" x 3/4"	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 21,71	R\$ 35.061,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.061,65	0,00%
10.003.005	Adaptador head d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 18,73	R\$ 30.248,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.248,95	0,00%
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 18,62	R\$ 30.071,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.071,30	0,00%
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 100,15	R\$ 161.742,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.742,25	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 857.232,45	R\$ 431.341,68	R\$ 217.944,46	R\$ 649.286,14	R\$ 207.946,31	75,74%
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril Rev. 03	un	6,00	0,00		-	R\$ 545,34	R\$ 3.272,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,04	0,00%
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0.6Kv 1Kv/90°	m	200,00	0,00		-	R\$ 17,04	R\$ 3.408,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.408,00	0,00%
11.003	Caixa pre moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15cm, padrão Energisa)	un	6,00	0,00		-	R\$ 20,90	R\$ 125,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	0,00%
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	70,00	0,00		-	R\$ 148,57	R\$ 10.399,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.399,90	0,00%
11.005	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00	0,00		-	R\$ 64,30	R\$ 643,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,00	0,00%
11.006	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) curva C, corrente 5KA	un	1,00	0,00		-	R\$ 116,29	R\$ 116,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,29	0,00%
11.007	Armação secundária, com 3 estrabos e 3 isoladores - fornecimento e instalação af. 07/2020	un	3,00	0,00		-	R\$ 145,00	R\$ 435,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,00	0,00%
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00	0,00		-	R\$ 457,80	R\$ 2.746,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.746,80	0,00%
11.009	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) curva B	un	11,00	0,00		-	R\$ 66,87	R\$ 735,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,57	0,00%
11.010	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	0,00		-	R\$ 24,77	R\$ 49,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,54	0,00%
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) curva C, corrente 5KA	un	6,00	0,00		-	R\$ 91,58	R\$ 549,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,48	0,00%
11.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5 SX1 ou similar	un	2,00	0,00		-	R\$ 21,06	R\$ 42,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,12	0,00%
11.013	Contator tripolar nominal 38a - fornecimento e instalação af. 10/2020	un	6,00	0,00		-	R\$ 363,18	R\$ 2.179,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,08	0,00%
11.014	Rele fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação af. 08/2020	un	6,00	0,00		-	R\$ 38,14	R\$ 228,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,84	0,00%
11.015	Fornecimento de base fixa para rele fotoelétrico	un	6,00	0,00		-	R\$ 9,20	R\$ 55,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,20	0,00%
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâmetro 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	64,00	23,00	41,00	64,00	R\$ 183,09	R\$ 11.717,76	R\$ 4.211,07	R\$ 7.506,69	R\$ 11.717,76	R\$ -	100,00%
11.017	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 32mm (1")	m	330,00	330,00		330,00	R\$ 17,39	R\$ 5.738,70	R\$ 5.738,70	R\$ -	R\$ 5.738,70	R\$ -	100,00%
11.018	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 40mm (1.1/4")	m	1.083,00	0,00		-	R\$ 23,29	R\$ 25.223,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.223,07	0,00%
11.019	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	322,00	0,00		-	R\$ 14,47	R\$ 4.659,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.659,34	0,00%
11.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 40mm (1.1/4")	un	362,00	0,00		-	R\$ 4,95	R\$ 1.791,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791,90	0,00%
11.021	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 32mm (1")	un	121,00	121,00		121,00	R\$ 3,71	R\$ 448,91	R\$ 448,91	R\$ -	R\$ 448,91	R\$ -	100,00%
11.022	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 25mm (3/4")	un	126,00	0,00		-	R\$ 2,29	R\$ 288,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,54	0,00%
11.023	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido (3/4")	un	64,00	0,00		-	R\$ 317,29	R\$ 20.306,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.306,56	0,00%
11.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm² 150, 750v / 70°C	m	2.480,00	0,00		-	R\$ 9,56	R\$ 23.708,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.708,80	0,00%

José Garcia de Oliveira Junior
Eng.º Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MOBICON CONSTRUTORA LTDA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA							BM	3	CONTRATO:166/2024				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana							PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
11 025	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90º 5000k, 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref. RFMAILED-DC/DPS-90-150-50-30-C-ME, da G-light ou similar	un	18,00	0,00		-	R\$ 1.972,46	R\$ 35.504,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.504,28	0,00%
11 026	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob. g-light ou similar	un	30,00	0,00		-	R\$ 129,17	R\$ 3.875,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.875,10	0,00%
11 027	Poste aço galv. cônico ornamental modelo ref. PORTO/FINO, h total=12m, base flangeada, c/ suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/ suporte p/ 2 luminárias, exceto luminárias e lâmpadas, Compost ou similar	un	57,00	40,00	17,00	57,00	R\$ 8.215,99	R\$ 468.311,43	R\$ 328.639,60	R\$ 139.671,83	R\$ 468.311,43	R\$ -	100,00%
11 028	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP ~0,95, 160lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	114,00	60,00	46,00	106,00	R\$ 1.538,39	R\$ 175.376,46	R\$ 92.303,40	R\$ 70.765,94	R\$ 163.069,34	R\$ 12.307,12	92,98%
11 029	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.200,00	0,00		-	R\$ 11,07	R\$ 13.284,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.284,00	0,00%
11 030	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	60,00	0,00		-	R\$ 18,31	R\$ 1.098,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.098,60	0,00%
11 031	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70 °c	m	3.600,00	0,00		-	R\$ 9,56	R\$ 34.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.416,00	0,00%
11 032	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 petalas, encaxe em poste com topo de Ø de 48mm 60,3mm, encaxe da luminária de Ø de 48mm 60,3mm	un	14,00	0,00		-	R\$ 349,83	R\$ 4.897,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.897,62	0,00%
11 033	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90º	m	60,00	0,00		-	R\$ 23,71	R\$ 1.422,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.422,60	0,00%
11 034	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00	0,00		-	R\$ 58,84	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,52	0,00%
12	ARBORIZAÇÃO						R\$ 129.338,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.338,16	0,00%
12 001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m af. 05/2018	un	1,00	0,00		-	R\$ 522,38	R\$ 522,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,38	0,00%
12 002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00	0,00		-	R\$ 72,49	R\$ 26.676,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.676,32	0,00%
12 003	Planta - Isora rei vermelha (isora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00	0,00		-	R\$ 26,78	R\$ 9.185,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.185,54	0,00%
12 004	Planta - Isora amarela (isora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00	0,00		-	R\$ 24,31	R\$ 2.139,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.139,28	0,00%
12 005	Planta - Moreira (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00	0,00		-	R\$ 55,20	R\$ 19.651,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.651,20	0,00%
12 006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00	0,00		-	R\$ 749,70	R\$ 37.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.485,00	0,00%
12 007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00	0,00		-	R\$ 103,56	R\$ 4.142,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.142,40	0,00%
12 008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00	0,00		-	R\$ 98,83	R\$ 9.092,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.092,36	0,00%
12 009	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00	0,00		-	R\$ 107,27	R\$ 5.578,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.578,04	0,00%
12 010	Planta - Ipê rosa (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00	0,00		-	R\$ 101,09	R\$ 4.447,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.447,96	0,00%
12 011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00	0,00		-	R\$ 14,10	R\$ 42,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,30	0,00%
12 012	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	63,00	0,00		-	R\$ 23,08	R\$ 1.454,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454,04	0,00%
12 013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00	0,00		-	R\$ 42,21	R\$ 126,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,63	0,00%
12 014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	0,00		-	R\$ 94,92	R\$ 2.562,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.562,84	0,00%
12 015	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	0,00		-	R\$ 230,81	R\$ 6.231,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.231,87	0,00%
13	DIVERSOS						R\$ 3.421,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.421,36	0,00%
13 001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00		-	R\$ 868,73	R\$ 868,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,73	0,00%
13 002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.50 x 0.70 m	un	1,00	0,00		-	R\$ 2.552,63	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552,63	0,00%


José Garcez de Oliveira Junior
 Eng. Civil CREA - 2704457522
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.				PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA						BM		3		CONTRATO: 166/2024			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana						PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 156.054,00	R\$ 34.862,46	R\$ 16.125,58	R\$ 50.988,04	R\$ 105.065,96	32,67%
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	600,00	134,04	62,00	196,04	R\$ 140,83	R\$ 88.098,00	R\$ 19.681,09	R\$ 9.103,46	R\$ 28.784,55	R\$ 59.313,45	32,67%
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	268,08	124,00	392,08	R\$ 56,63	R\$ 67.956,00	R\$ 15.181,37	R\$ 7.022,12	R\$ 22.203,49	R\$ 45.752,51	32,67%
TOTAL DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO								R\$ 3.688.000,00	R\$ 844.346,58	R\$ 361.182,22	R\$ 1.205.528,80	R\$ 2.482.471,20	32,69%
								9,79%		32,69%		67,31%	
			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:								APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:		

José Garcez de Oliveira Junior
 Eng. Civil CREA - 2704457522
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por
 MILTON SALES
 SANTANA:81309147191
 Dados: 2025.08.11 09:31:32
 -03'00'

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
BM 03

CONTRATO N° 166/2024



ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
03	ROTATÓRIA 1			
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1453,99	Área medida in loco
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1453,99	Área medida in loco
03.002	PAVIMENTAÇÃO			
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	67,72	PERIMETRO EXECUTADO
04	ROTATÓRIA 2			
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1963,50	Área medida in loco
04.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1963,50	Área medida in loco
05	RÓTULA 3			
05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1963,50	Área medida in loco
05.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1963,50	Área medida in loco
05.002	PAVIMENTAÇÃO			
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	365,00	Perimetro executado = 526,25 m. Aditar 161,25 m
08	CANTEIRO 3			
08.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
08.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1284,03	Área medida in loco
08.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1284,03	Área medida in loco
08.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	642,01	1284,02 m² x 0,5m
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11556,27	642,015m³ x 1,5t/m³ x 12km = 11.556,27
08.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	642,01	1284,02 m² x 0,5m
08.002	PAVIMENTAÇÃO			
08.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	619,21	Perimetro executado = 619,21 m
09	CANTEIRO 4			
09.002	PAVIMENTAÇÃO			
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	534,46	Perimetro executado = 534,46 m
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	41,00	Medidas e Unidades de acordo com o projeto elétrico
11.027	Poste aço galv. cônico ornamental, modelo ref. PORTOFINO, h total=12m, base flangeada, c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminarias e lâmpadas, Conipost ou similar	un	17,00	
11.028	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	46,00	
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	62,00	Administração local corresponde a aproximadamente o percentual medido
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	124,00	

Assinado de forma digital por
MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2025.08.11 09:28:24 -03'00'

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana


FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS

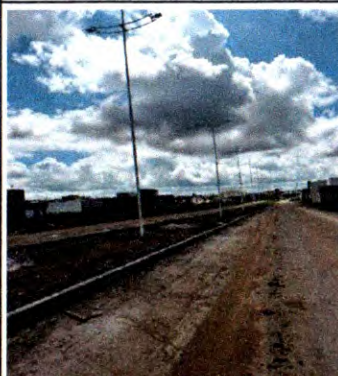

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO

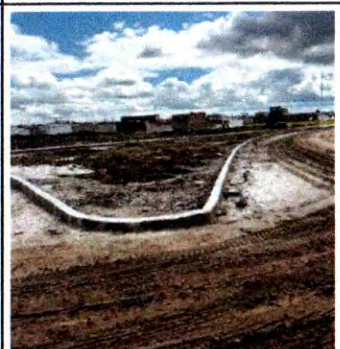

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO

DATA:

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA		CONTRATO: 166/2024		PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03		FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL				
MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO			
MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO			
			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: _____ José Garcez de Oliveira Junior Eng. Civil CREA - 2704457522 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: _____		

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL

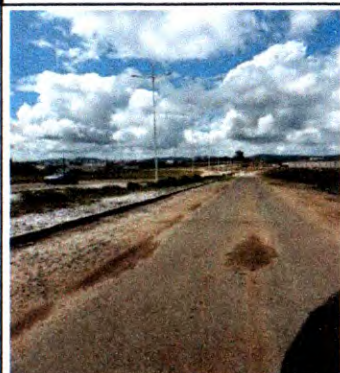

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO

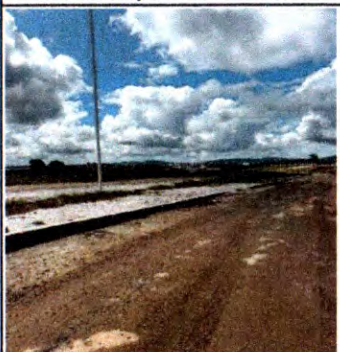


MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO

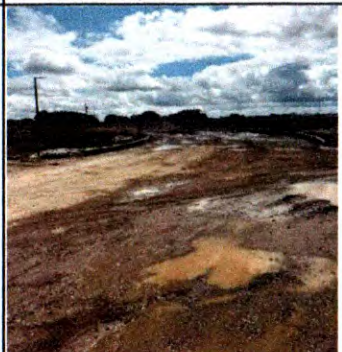

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO

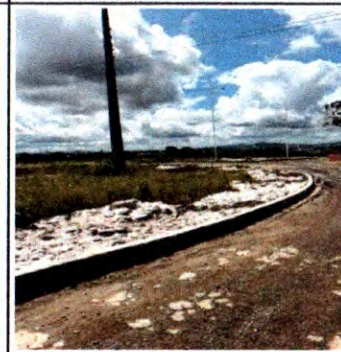

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL

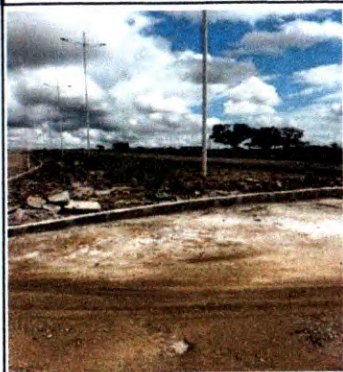

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

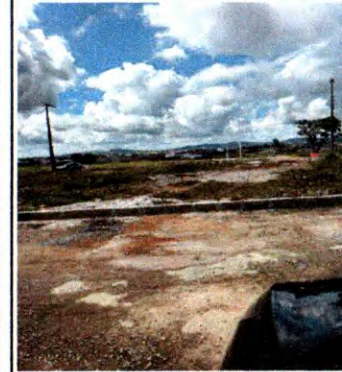

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

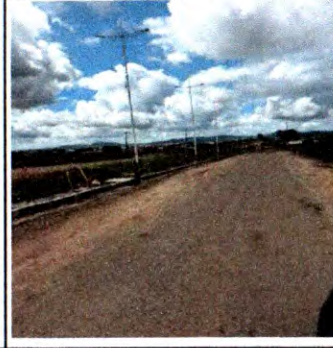

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

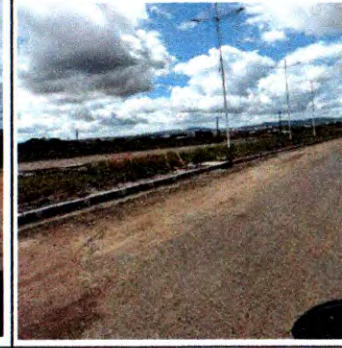

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL

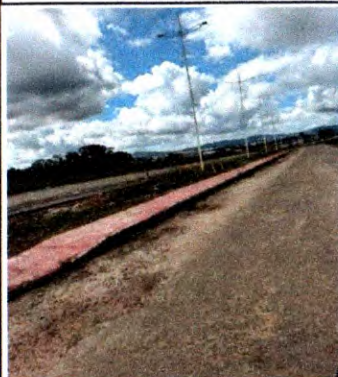


MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

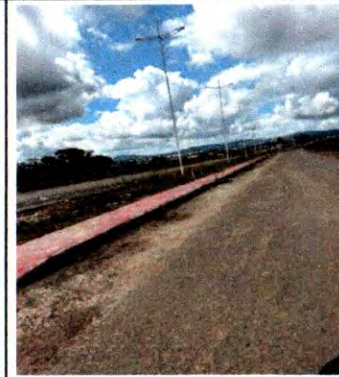

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

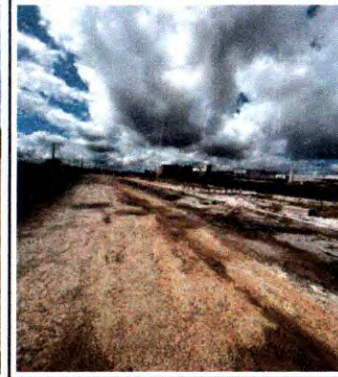

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA




MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO

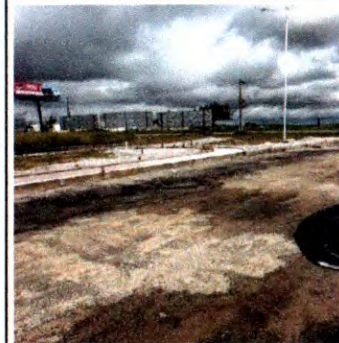

MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS,
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

José Garcez de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA - 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA		CONTRATO:166/2024		PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025	
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03			
		FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL			
MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO	
MEIO FIO, POSTES E LUMINÁRIAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ATERRO					
	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:			APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:	
	José Garcez de Oliveira Junior Eng. Civil CREA - 2704457522 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			Riza Milene S. Rodrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2025.08.11 09:32:35 -03'00'
