

	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310 CNPJ : 29.889.275/0001-00														
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO															
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT, MARIANGA E LOT.JARDIM SERRANO).				ORDEM DE SERVIÇO 13/10/2025	CONTRATO 280/2025	PERÍODO CONTRATO 12 MESES	BOLETIM Nº 03	PERÍODO DE MEDIÇÃO 08/12/2025 A 05/02/2026	DATA:	06/02/2026				
					CONTRATO		MEDIÇÃO								[%] MEDIDA
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR		
01.004.005.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.437,92	108,14	155.496,67		954,60	954,60	483,32	-	103.230,44	103.230,44	52.266,23	66,39%	
01.004.005.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	7.037,10	0,72	5.066,71		4.058,67	4.058,67	2.978,43	-	2.922,24	2.922,24	2.144,47	57,68%	
01.004.005.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	419,59	38,08	15.977,99		242,00	242,00	177,59	-	9.215,36	9.215,36	6.762,63	57,68%	
01.004.005.007	Pintura de meio fio (caliação)	m	419,59	4,95	2.076,97		-	-	419,59	-	-	-	2.076,97	0,00%	
01.004.006	DRENAGEM				13.612,66		-	-	-		8.370,04	8.370,04	5.242,62		
01.004.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	125,88	108,14	13.612,66		77,40	77,40	48,48	-	8.370,04	8.370,04	5.242,62	61,49%	
01.005	TRAVESSA PAULO DIAS DE TRINDADE				54.044,80		-	-	-		-	-	54.044,80		
01.005.001	PAVIMENTAÇÃO				52.033,40		-	-	-		-	-	52.033,40		
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	468,10	1,34	627,25		-	-	468,10	-	-	-	627,25	0,00%	
01.005.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	468,10	0,82	383,83		-	-	468,10	-	-	-	383,83	0,00%	
01.005.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	449,50	108,14	48.608,93		-	-	449,50	-	-	-	48.608,93	0,00%	
01.005.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	912,75	0,72	657,18		-	-	912,75	-	-	-	657,18	0,00%	
01.005.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	30,00	38,08	1.142,40		-	-	30,00	-	-	-	1.142,40	0,00%	
01.005.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	124,00	4,95	613,80		-	-	124,00	-	-	-	613,80	0,00%	
01.005.002	DRENAGEM				2.011,40		-	-	-		-	-	2.011,40		
01.005.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	18,60	108,14	2.011,40		-	-	18,60	-	-	-	2.011,40	0,00%	
01.006	LIMPEZA				2.713,50		-	-	-		-	-	2.713,50		
01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.427,00	0,50	2.713,50		-	-	5.427,00	-	-	-	2.713,50	0,00%	
01.007	ADMINISTRAÇÃO				29.857,72		-	-	-		9.496,38	788,82	10.285,20	19.572,52	
01.007.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,00	100,51	12.262,22	39,00	3,00	42,00	80,00	3.919,96	301,56	4.221,52	8.040,70	34,43%	
01.007.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00	54,14	17.595,50	103,00	9,00	112,00	213,00	5.576,42	487,26	6.063,68	11.531,82	34,46%	
					TOTAIS	712.000,00				267.661,50	180.803,69	448.465,19	263.534,81		
					PORCENTAGENS (%):	100,00%				37,59%	25,39%	62,99%	37,01%		
 Documento assinado digitalmente DINESH KUMAR Data: 12/02/2026 16:42:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					Atesto que os serviços acima foram executados, ITABAIANA/SE / /2025					Valor Contratado 712.000,00					
CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ. 29.889.275/0001-00					SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - ITABAIANA/SE					OBSERVAÇÕES					



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 13/02/2026 08:49:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CRB- 272035922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:		3º BOLETIM DE MEDIÇÃO															
		ORDEN DE SERVIÇO		CONTRATO		PERÍODO CONTRATO		BOLETIM Nº		PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA:		06/02/2026			
		13/10/2025		280/2025		12 MESES		03		08/12/2025 A 05/02/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO				QUANTIDADE				MEDIÇÃO				CONTÁBIL		A MEDIR	A MEDIR
		UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR				
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE																
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				712.000,00												
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022				1.959,46												
01.002	RUA ELENANDRO DO NASCIMENTO SILVA	m2	6,00	326,58	1.959,46	6,00	-	6,00	-	1.959,46	-	448.465,04	263.534,81				
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO				59.684,06												
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	493,46	1,34	661,24												
01.002.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	493,46	0,82	404,64												
01.002.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	461,10	108,14	49.863,35		447,20	447,20	46,26	-	54.047,67	54.047,67	5.636,40				100,00%
01.002.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50/m³)	tkm	853,05	0,72	614,20		447,20	447,20	46,26	-	54.047,67	54.047,67	2.136,97				90,63%
01.002.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	107,86	38,08	4.107,31		447,20	447,20	13,90	-	599,25	599,25	61,99				90,62%
01.002.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	107,86	4,95	533,91		853,05	853,05	-	-	48.360,21	48.360,21	1.503,14				96,99%
01.002.002	DRENAGEM	m	107,86	4,95	533,91		107,86	107,86	-	-	614,20	614,20	0,00				100,00%
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	32,36	108,14	3.499,41		-	-	107,86	-	4.107,31	4.107,31	0,00				100,00%
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA				3.499,41												
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO				258.702,39												
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.128,89	1,34	2.852,71		-	-	-	-	-	-	3.499,41				0,00%
01.003.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.128,89	0,82	1.745,69		-	-	-	-	-	-	3.499,41				0,00%
01.003.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.956,66	108,14	211.593,21		2.128,89	2.128,89	-	256.205,50	-	256.205,51	2.496,88				99,03%
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50/m³)	tkm	4.151,25	1,07	4.441,84		2.128,89	2.128,89	-	2.852,71	-	239.841,77	2.496,88				98,97%
01.003.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	504,42	38,08	19.208,31		1.956,66	1.956,66	-	1.745,69	-	2.852,71	-				100,00%
01.003.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	504,42	4,95	2.496,88		4.151,25	4.151,25	-	4.441,84	-	211.593,21	-				100,00%
01.003.002	DRENAGEM	m	504,42	4,95	2.496,88		504,42	504,42	-	19.208,31	-	4.441,84	-				100,00%
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	151,32	108,14	16.363,74		151,32	151,32	-	16.363,74	-	2.496,88	0,00%				0,00%
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO				306.038,08												
01.004.001	TRECHO 01				97.468,02												
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO				91.513,83												
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	772,75	1,34	1.035,48		-	-	-	-	-	-	179.070,88				
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	772,75	0,82	633,66		-	-	-	-	-	-	97.468,02				
01.004.002.003	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	26,94	112,74	3.037,22		-	-	-	-	-	-	91.513,83				
01.004.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50/m³)	tkm	296,34	0,72	213,36		-	-	-	-	-	-	1.035,48				0,00%
01.004.002.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	717,69	108,14	77.611,00		-	-	-	-	-	-	633,66				0,00%
01.004.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50/m³)	tkm	1.506,90	0,72	1.084,97		-	-	-	-	-	-	3.037,22				0,00%
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	183,55	38,08	6.989,58		-	-	-	-	-	-	213,36				0,00%
01.004.002.008	Pintura de meio fio (caiação)	m	183,55	4,95	908,57		-	-	-	-	-	-	77.611,00				0,00%
01.004.003	DRENAGEM	m	183,55	4,95	908,57		-	-	-	-	-	-	1.084,97				0,00%
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	55,06	108,14	5.954,19		-	-	-	-	-	-	6.989,58				0,00%
01.004.004	TRECHO 02				193.957,40												
01.004.005	PAVIMENTAÇÃO				207.570,06												
01.004.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.563,80	1,34	2.095,49		-	-	-	-	-	-	908,57				0,00%
01.004.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.563,80	0,82	1.282,32		-	-	-	-	-	-	5.954,19				0,00%
01.004.005.003	Colchão de areia	m3	100,65	118,84	11.961,25		-	-	-	-	-	-	5.954,19				0,00%
							1.032,00	1.032,00	531,80	-	125.967,20	125.967,20	81.602,86				65,99%
							1.032,00	1.032,00	531,80	-	1.382,88	1.382,88	76.360,24				65,99%
							-	-	-	-	712,61	712,61	436,08				65,99%
							-	-	-	-	846,24	846,24	436,08				65,99%
							-	-	-	-	11.961,25	11.961,25	0,00%				0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

		SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310, CNPJ : 29.889.275/0001-00									
MEMORIAL DE CÁLCULO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO											
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).									
ORDEM DE SERVIÇO:		13/10/2025									
CONTRATO:		280/2015									
PERÍODO DE CONTRATO:		12 meses									
BOLETIM DE MEDIÇÃO:		Nº 03									
PERÍODO DE MEDIÇÃO:		08/12/2025 À 05/02/2026									
DATA:		06/02/2026									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X		Y		Z		TOTAL	UNID	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE										
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	0,00		m	x	m	=	0,00	m2	
01.002	RUA ELEANRO DO NASCIMENTO SILVA										
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO										
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		55,90	m	x	8,00	m	= 447,20 m2	
01.002.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		55,90	m	x	8,00	m	= 447,20 m2	
01.002.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		55,90	m	x	8,00	m	= 447,20 m2	
01.002.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm			(107,86X 50/1000) X 158,16				=	853,05 tkm	
01.002.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		72,21	m	x	2,00	lado	= 107,86 m	
01.002.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00		m	x	0,00	lado	=	0,00 m	
01.002.002	DRENAGEM										
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		m	x		m	=	m2	
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA										
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO										
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00						=	m2	
01.003.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00						=	m2	
01.003.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00						=	m2	
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm							=	tkm	
01.003.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00						=	m	
01.003.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00						=	m	
01.003.002	DRENAGEM										
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00						=	m2	
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO										
01.004.001	TRECHO 01										
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO										
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		m	x		m	=	0,00 m2	
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		m	x		m	=	0,00 m2	
01.004.002.003	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	0,00		m	x		m	=	0,00 m3	
01.004.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00		m	x		m	=	0,00 tkm	
01.004.002.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		m	x		lado	=	0,00 m	
01.004.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00		m	x		lado	=	0,00 m	
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		m	x		lado	=	0,00 m	
01.004.002.008	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00		m	x		m	=	0,00 m	
01.004.003	DRENAGEM										
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		m	x		m	=	0,00 m2	
01.004.004	TRECHO 02										
01.004.005	PAVIMENTAÇÃO										
01.004.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		129,00	m	x	8,00	m	= 1032,00 m2	
01.004.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		129,00	m	x	8,00	m	= 1032,00 m2	
01.004.005.003	Colchão de areia	m3	0,00			m	x		m	= m3	
01.004.005.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		129,00	m	x	7,40	m	= 954,60 m2	
01.004.005.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00		(242X 50/1000) X 335,43				=	4.058,67 tkm	
01.004.005.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		121,00	m	x	2,00	lado	= 242,00 m	
01.004.005.007	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00			m	x	0,00	lado	= 0,00 m	
01.004.006	DRENAGEM										
01.004.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		129,00	m	x	0,3 x 2	m	= 77,40 m2	
01.005	TRAVESSA PAULINO DIAS DE TRINDADE										

 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310, CNPJ : 29.889.275/0001-00												
MEMORIAL DE CÁLCULO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).												
ORDEM DE SERVIÇO: 13/10/2025												
CONTRATO: 280/2015												
PERÍODO DE CONTRATO: 12 meses												
BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 03												
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/12/2025 À 05/02/2026												
DATA: 06/02/2026												
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X		Y		Z		TOTAL	UNID		
01.005.001	PAVIMENTAÇÃO											
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		m	x	m	=	0,00	m2		
01.005.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		m	x	m	=	0,00	m2		
01.005.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		m	x	lado	=	0,00	m2		
01.005.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00		m	x	lado	=	0,00	tkm		
01.005.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		m	x	lado	=	0,00	m		
01.005.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00		m	x	m	=	0,00	m		
01.005.002	DRENAGEM											
01.005.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		m	x	lado	=	0,00	m2		
01.006	LIMPEZA											
01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,00		m	x	lado	=	0,00	m2		
01.007	ADMINISTRAÇÃO											
01.007.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,00		3,00	x	1,00 un	=	3,00	h		
01.007.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00		9,00	x	1,00 un	=	9,00	h		
 DINESH KUMAR Data: 12/02/2026 16:42:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO Data: 13/02/2026 08:49:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br										
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)		RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)										

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itaberaia




SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO E RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO- TRECHO 2

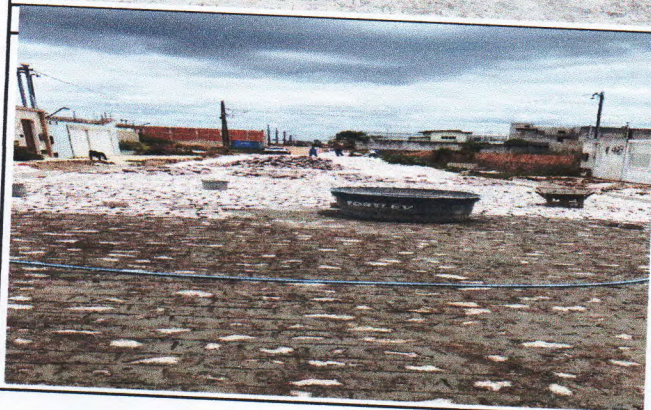

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabuna

**SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	
	
	
	
	
	
 Documento assinado digitalmente DINESH KUMAR Data: 12/02/2026 16:42:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 13/02/2026 08:49:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)	RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335927-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Aracaju
