





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 43/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 22/03/2024 AO 26/03/2024				DATA: 26/03/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.542.292,91	25.286,84	1.567.579,75		714.652,75	68,69
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	33.925,49	557,41	34.482,90	44,52	2.226.000,00	1.510.362,84	24.815,89	1.535.178,73		690.821,27	68,97
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	33,90	0,50	34,40	941,89	47.094,50	31.930,07	470,95	32.401,02		14.693,48	68,80
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	80.910,49	1.192,20	82.102,69		37.117,31	68,87
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	339,28	5,00	344,28	123,60	61.800,00	41.935,01	618,00	42.553,01		19.246,99	68,86
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	814,53	12,00	826,53	47,85	57.420,00	38.975,48	574,20	39.549,68		17.870,32	68,88
Total geral								2.401.452,50	1.623.203,40	26.479,04	1.649.682,44		751.770,06	68,70
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.03.27 09:56:48 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.03.27 09:56:48 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___					

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 43/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 22/03/2024 AO 26/03/2024	DATA: 26/03/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	22/03/2024	RUA PROJETADA	POV. RIO DAS PEDRAS	2,00	3,80	7,60
2	22/03/2024	RUA PROJETADA	POV. RIO DAS PEDRAS	1,50	3,70	5,55
3	22/03/2024	RUA PROJETADA	POV. RIO DAS PEDRAS	1,00	1,00	1,00
4	22/03/2024	RUA PROJETADA	POV. RIO DAS PEDRAS	2,00	2,40	4,80
5	22/03/2024	RUA PROJETADA	POV. RIO DAS PEDRAS	6,10	1,00	6,10
6	22/03/2024	RUA PROJETADA	POV. RIO DAS PEDRAS	5,30	4,00	21,20
7	22/03/2024	RUA PROJETADA	POV. RIO DAS PEDRAS	1,50	1,50	2,25
8	22/03/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	9,00	4,20	37,80
9	22/03/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	4,20	2,50	10,50
10	22/03/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	10,00	3,20	32,00
11	25/03/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	24,00	7,00	168,00
12	25/03/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	10,50	5,50	57,75
13	26/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	8,40	5,40	45,36
14	26/03/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	8,50	3,00	25,50
15	26/03/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	24,50	2,80	68,60
16	26/03/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	8,80	3,00	26,40
17	26/03/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	10,00	2,50	25,00
18	26/03/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	4,00	3,00	12,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						557,41


 José Robson Santos da Paiva
 Eng. Civil CREA 272028395-4
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Ivan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil CREA 1515638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06641211525
 11525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2024.03.27
 09:56:12 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 43/2024



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.27 09:55:07
-03'00'



RUA PROJETADA



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO




RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA




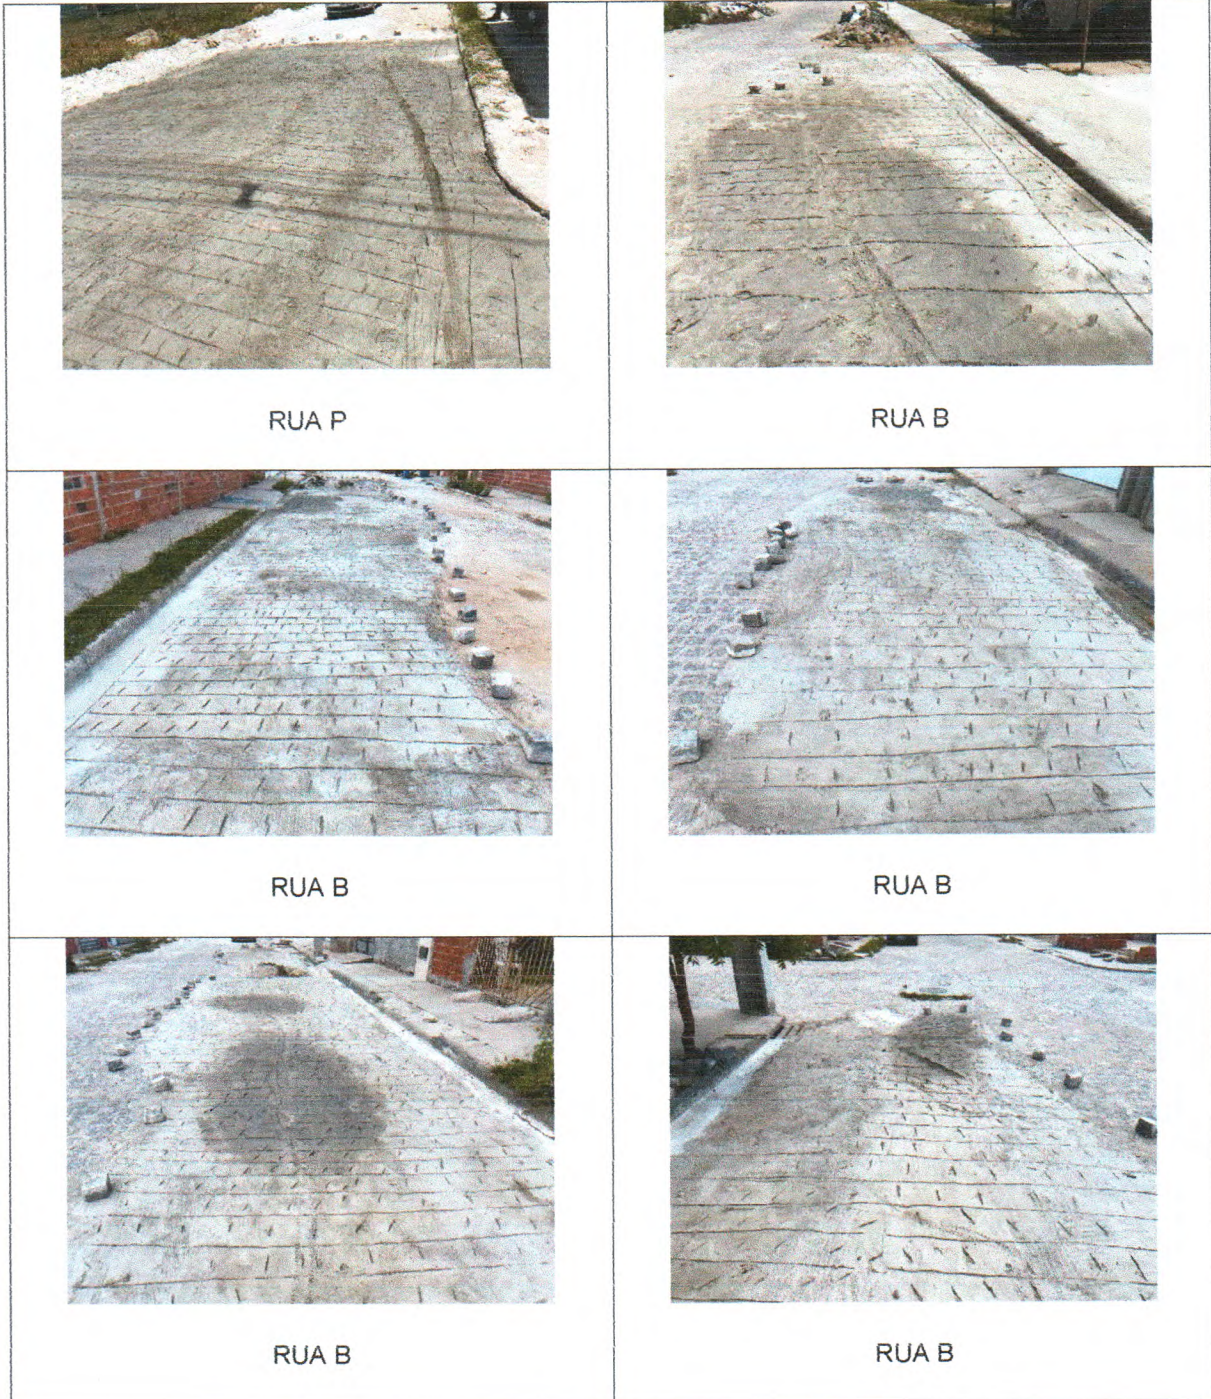
RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA


MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525


Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.03.27
09:55:19 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2720638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2713638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:0664121
 1525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2024.03.27
 09:55:31 -03'00'
