

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 230/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. Nº. 04/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP					
								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026					DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
1	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Agrovila)							1.019.507,42	560.385,95	231.727,41	792.113,36	227.394,06	77,70
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							32.071,20	16.997,73	7.921,59	24.919,32	7.151,88	77,70
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE							32.071,20	16.997,73	7.921,59	24.919,32	7.151,88	77,70
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	63,60	29,64	93,24	144,62	17.354,40	9.197,83	4.286,54	13.484,37	3.870,03	77,70
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	127,20	59,28	186,48	61,32	14.716,80	7.799,90	3.635,05	11.434,95	3.281,85	77,70
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES							68.808,60	61.803,82	1.592,10	63.395,92	5.412,68	92,13
01.02.001	PLACA DE OBRA							1.661,17	1.661,17	-	1.661,17	-	100,00
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	4,50	4,50		4,50	369,15	1.661,17	1.661,17	-	1.661,17	-	100,00
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS							61.078,89	54.074,11	1.592,10	55.666,21	5.412,68	91,14
01.02.002.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00			-	636,38	636,38	-	-	-	636,38	0,00
01.02.002.002	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	1.818,37	1.818,37	1.818,37	-	1.818,37	-	100,00
01.02.002.003	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00		2,00	2,00	796,05	6.368,40	-	1.592,10	1.592,10	4.776,30	25,00
01.02.002.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.028,04	3.028,04		3.028,04	2,09	6.328,60	6.328,60	-	6.328,60	-	100,00
01.02.002.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	285,51	285,51		285,51	160,86	45.927,14	45.927,14	-	45.927,14	-	100,00
01.02.003	LOCAÇÃO							6.068,54	6.068,54	-	6.068,54	-	100,00
01.02.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	752,64	752,64		752,64	6,00	4.515,84	4.515,84	-	4.515,84	-	100,00
01.02.003.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.186,90	2.186,90		2.186,90	0,71	1.552,70	1.552,70	-	1.552,70	-	100,00
01.03	GALPÃO PRÉ MOLDADO							326.842,79	326.842,79	-	326.842,79	-	100,00
01.03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							234,66	234,66	-	234,66	-	100,00
01.03.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	12,00	12,00		12,00	12,52	150,24	150,24	-	150,24	-	100,00
01.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	18,00		18,00	1,21	21,78	21,78	-	21,78	-	100,00
01.03.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	54,00		54,00	1,16	62,64	62,64	-	62,64	-	100,00
01.03.002	ESTRUTURAS							226.755,38	226.755,38	-	226.755,38	-	100,00
01.03.002.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	752,64	752,64		752,64	301,28	226.755,38	226.755,38	-	226.755,38	-	100,00

Rafael
Rafael Menezes S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon
Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894/692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 230/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. Nº. 04/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP						
								ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025						
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026					DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %	Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.03.003	COBERTURA							99.852,75	99.852,75	-	99.852,75	-		100,00
01.03.003.001	Telhamento com telha em aço galvanume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar - Rev 02 10/2022	m2	752,64	752,64		752,64	132,67	99.852,75	99.852,75	-	99.852,75	-		100,00
01.04	QUADRA POLIESPORTIVA							83.841,51	40.052,41	41.170,19	81.222,60	2.618,91		96,88
01.04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							9.594,88	9.594,88	-	9.594,88	-		100,00
01.04.001.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	125,98	125,98		125,98	16,86	2.124,02	2.124,02	-	2.124,02	-		100,00
01.04.001.002	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	125,98	125,98		125,98	20,50	2.582,59	2.582,59	-	2.582,59	-		100,00
01.04.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m², em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.214,03	4.214,03		4.214,03	1,16	4.888,27	4.888,27	-	4.888,27	-		100,00
01.04.002	PISO QUADRA							71.627,72	30.457,53	41.170,19	71.627,72	-		100,00
01.04.002.001	Lona plástica preta	m2	503,93	503,93		503,93	5,76	2.902,64	2.902,64	-	2.902,64	-		100,00
01.04.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	503,93	503,93		503,93	18,58	9.363,02	9.363,02	-	9.363,02	-		100,00
01.04.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	503,93	503,93		503,93	36,10	18.191,87	18.191,87	-	18.191,87	-		100,00
01.04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	503,93		503,93	503,93	41,30	20.812,31	-	20.812,31	20.812,31	-		100,00
01.04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93		503,93	503,93	34,11	17.189,05	-	17.189,05	17.189,05	-		100,00
01.04.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,37		55,37	55,37	57,23	3.168,83	-	3.168,83	3.168,83	-		100,00
01.04.003	PINTURA DE DEMARCAÇÃO							2.618,91	-	-	-	2.618,91		0,00
01.04.003.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	282,82			-	9,26	2.618,91	-	-	-	2.618,91		0,00
01.05	ALAMBRADO E MURETA							122.808,81	14.677,21	96.143,57	110.820,78	11.988,03		90,24
01.05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							890,96	890,96	-	890,96	-		100,00
01.05.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52	11,52		11,52	60,99	702,60	702,60	-	702,60	-		100,00
01.05.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,82	13,82		13,82	10,15	140,27	140,27	-	140,27	-		100,00
01.05.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	41,46	41,46		41,46	1,16	48,09	48,09	-	48,09	-		100,00
01.05.002	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)							5.575,45	5.575,45	-	5.575,45	-		100,00
01.05.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	11,52	11,52		11,52	483,98	5.575,45	5.575,45	-	5.575,45	-		100,00
01.05.003	ALVENARIA							2.787,00	2.787,00	-	2.787,00	-		100,00

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 230/2025						
			B. M. Nº. 04/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025						
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026					DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a %	Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.05.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	56,52	56,52		56,52	49,31	2.787,00	2.787,00	-	2.787,00	-		100,00
01.05.004	REVESTIMENTO DE PAREDES							5.423,80	5.423,80	-	5.423,80	-		100,00
01.05.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	127,17	127,17		127,17	4,87	619,32	619,32	-	619,32	-		100,00
01.05.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	127,17	127,17		127,17	37,78	4.804,48	4.804,48	-	4.804,48	-		100,00
01.05.005	ALAMBRADO							99.133,45	-	96.143,57	96.143,57	2.989,88		96,98
01.05.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,97		1,97	1,97	639,09	1.259,01	-	1.259,01	1.259,01	-		100,00
01.05.005.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg. malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	337,92		337,92	337,92	280,79	94.884,56	-	94.884,56	94.884,56	-		100,00
01.05.005.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,96			-	755,02	2.989,88	-	-	-	2.989,88		0,00
01.05.006	PINTURA							5.824,39	-	-	-	5.824,39		0,00
01.05.006.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	127,17			-	45,80	5.824,39	-	-	-	5.824,39		0,00
01.05.007	DIVERSOS							3.173,76	-	-	-	3.173,76		0,00
01.05.007.001	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	144,00			-	22,04	3.173,76	-	-	-	3.173,76		0,00
01.06	ARQUIBANCADA							44.172,55	34.756,33	3.225,15	37.981,48	6.191,07		85,98
01.06.001	MOVIMENTO DE TERRA							5.960,91	5.960,91	-	5.960,91	-		100,00
01.06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,96	16,96		16,96	60,99	1.034,39	1.034,39	-	1.034,39	-		100,00
01.06.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	20,34	20,34		20,34	10,15	206,45	206,45	-	206,45	-		100,00
01.06.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	61,02	61,02		61,02	1,16	70,78	70,78	-	70,78	-		100,00
01.06.001.004	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	21,97	21,97		21,97	199,75	4.388,51	4.388,51	-	4.388,51	-		100,00
01.06.001.005	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	21,97	21,97		21,97	11,87	260,78	260,78	-	260,78	-		100,00
01.06.002	ESTRUTURA							17.297,59	17.297,59	-	17.297,59	-		100,00
01.06.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	31,26	31,26		31,26	483,98	15.129,21	15.129,21	-	15.129,21	-		100,00
01.06.002.002	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	0,80	0,80		0,80	2.710,48	2.168,38	2.168,38	-	2.168,38	-		100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 230/2025					
			B. M. Nº. 04/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026					DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.06.003	ALVENARIA							3.958,06	3.958,06	-	3.958,06	-	100,00
01.06.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	77,67	77,67		77,67	50,96	3.958,06	3.958,06	-	3.958,06	-	100,00
01.06.004	REVESTIMENTO DE PAREDES							4.242,82	4.242,82	-	4.242,82	-	100,00
01.06.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	99,48	99,48		99,48	4,87	484,47	484,47	-	484,47	-	100,00
01.06.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	99,48	99,48		99,48	37,78	3.758,35	3.758,35	-	3.758,35	-	100,00
01.06.005	PAVIMENTAÇÃO							3.296,95	3.296,95	-	3.296,95	-	100,00
01.06.005.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	63,66	63,66		63,66	51,79	3.296,95	3.296,95	-	3.296,95	-	100,00
01.06.006	PINTURA							6.191,07	-	-	-	6.191,07	0,00
01.06.006.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	128,10			-	48,33	6.191,07	-	-	-	6.191,07	0,00
01.06.007	DIVERSOS							3.225,15	-	3.225,15	3.225,15	-	100,00
01.06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00		15,00	15,00	215,01	3.225,15	-	3.225,15	3.225,15	-	100,00
01.07	ÁREA EXTERNA							206.655,55	47.140,67	75.762,04	122.902,71	83.752,84	59,47
01.07.001	MEIO-FIO							34.545,71	13.930,50	17.015,16	30.945,66	3.600,05	89,58
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	821,93	370,00	451,93	821,93	37,65	30.945,66	13.930,50	17.015,16	30.945,66	-	100,00
01.07.001.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	821,93			-	4,38	3.600,05	-	-	-	3.600,05	0,00
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO							112.153,06	3.610,36	56.189,50	59.799,86	52.353,20	53,32
01.07.002.001	Lona plástica preta	m2	824,14		824,14	824,14	5,76	4.747,05	-	4.747,05	4.747,05	-	100,00
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	82,41	24,72	57,69	82,41	146,05	12.035,98	3.610,36	8.425,62	12.035,98	-	100,00
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	82,41		82,41	82,41	11,87	978,21	-	978,21	978,21	-	100,00
01.07.002.004	Lastro de brita 1	m3	22,41		22,41	22,41	192,16	4.306,31	-	4.306,31	4.306,31	-	100,00
01.07.002.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	448,11			-	95,78	42.919,98	-	-	-	42.919,98	0,00
01.07.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	824,14		659,31	659,31	57,23	47.165,53	-	37.732,31	37.732,31	9.433,22	80,00
01.07.003	ACESSIBILIDADE							2.031,01	-	-	-	2.031,01	0,00

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 230/2025					
			B. M. Nº. 04/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026					DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.003.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00			-	470,53	1.882,12	-	-	-	1.882,12	0,00
01.07.003.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	6,24			-	23,86	148,89	-	-	-	148,89	0,00
01.07.004	ESCADARIAS							14.422,32	11.864,94	2.557,38	14.422,32	-	100,00
01.07.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,49	8,48	0,01	8,49	60,99	517,81	517,20	0,61	517,81	-	100,00
01.07.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,19	10,19		10,19	10,15	103,43	103,43	-	103,43	-	100,00
01.07.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,57	30,57		30,57	1,16	35,46	35,46	-	35,46	-	100,00
01.07.004.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	19,85	19,85		19,85	483,98	9.607,00	9.607,00	-	9.607,00	-	100,00
01.07.004.005	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	21,23	21,23		21,23	51,79	1.099,50	1.099,50	-	1.099,50	-	100,00
01.07.004.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,93	10,93		10,93	8,18	89,41	89,41	-	89,41	-	100,00
01.07.004.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	10,93	10,93		10,93	37,78	412,94	412,94	-	412,94	-	100,00
01.07.004.008	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	9,13		9,13	9,13	280,04	2.556,77	-	2.556,77	2.556,77	-	100,00
01.07.005	CONTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO							17.734,87	17.734,87	-	17.734,87	-	100,00
01.07.005.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,60	11,60		11,60	60,99	707,48	707,48	-	707,48	-	100,00
01.07.005.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,92	13,92		13,92	10,15	141,29	141,29	-	141,29	-	100,00
01.07.005.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	41,76	41,76		41,76	1,16	48,44	48,44	-	48,44	-	100,00
01.07.005.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	34,79	34,79		34,79	483,98	16.837,66	16.837,66	-	16.837,66	-	100,00
01.07.006	PAISAGISMO							25.768,58	-	-	-	25.768,58	0,00
01.07.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	780,98			-	23,70	18.509,23	-	-	-	18.509,23	0,00
01.07.006.002	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	7,00			-	101,21	708,47	-	-	-	708,47	0,00
01.07.006.003	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	5,00			-	88,96	444,80	-	-	-	444,80	0,00


Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 230/2025					
			B. M. Nº. 04/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026					DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.006.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	10,00			-	104,10	1.041,00	-	-	-	1.041,00	0,00
01.07.006.005	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	47,00			-	45,75	2.150,25	-	-	-	2.150,25	0,00
01.07.006.006	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	12,00			-	106,57	1.278,84	-	-	-	1.278,84	0,00
01.07.006.007	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	69,00			-	23,71	1.635,99	-	-	-	1.635,99	0,00
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							57.513,99	8.844,08	-	8.844,08	58.669,91	13,10
01.08.001	PADRÃO DE ENTRADA							8.275,84	-	-	-	8.275,84	0,00
01.08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			-	568,76	568,76	-	-	-	568,76	0,00
01.08.001.002	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00			-	162,38	162,38	-	-	-	162,38	0,00
01.08.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00			-	582,72	582,72	-	-	-	582,72	0,00
01.08.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	3,00			-	17,78	53,34	-	-	-	53,34	0,00
01.08.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00			-	21,35	64,05	-	-	-	64,05	0,00
01.08.001.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00			-	155,03	465,09	-	-	-	465,09	0,00
01.08.001.007	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	50,00			-	12,25	612,50	-	-	-	612,50	0,00
01.08.001.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90º C	m	160,00			-	25,34	4.054,40	-	-	-	4.054,40	0,00
01.08.001.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	60,00			-	26,17	1.570,20	-	-	-	1.570,20	0,00
01.08.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =	un	20,00			-	7,12	142,40	-	-	-	142,40	0,00
01.08.002	QUADRO DE COMANDO - GDEL							1.972,57	-	-	-	1.972,57	0,00
01.08.002.001	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			-	426,61	426,61	-	-	-	426,61	0,00
01.08.002.002	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00			-	162,38	162,38	-	-	-	162,38	0,00
01.08.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			-	21,35	21,35	-	-	-	21,35	0,00
01.08.002.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			-	155,03	155,03	-	-	-	155,03	0,00
01.08.002.005	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00			-	55,77	223,08	-	-	-	223,08	0,00
01.08.002.006	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00			-	120,46	120,46	-	-	-	120,46	0,00
01.08.002.007	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação, af_10/2020	un	2,00			-	371,87	743,74	-	-	-	743,74	0,00
01.08.002.008	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00			-	20,55	82,20	-	-	-	82,20	0,00
01.08.002.009	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação, af_02/2025	un	1,00			-	37,72	37,72	-	-	-	37,72	0,00
01.08.003	ILUMINAÇÃO QUADRA							57.265,58	8.844,08	-	8.844,08	48.421,50	15,44


 Riza Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 - Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 230/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. Nº. 04/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP					
								ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026					DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	66,00			-	23,28	1.536,48	-	-	-	1.536,48	0,00
01.08.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	22,00			-	5,11	112,42	-	-	-	112,42	0,00
01.08.003.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	1.300,00			-	16,59	21.567,00	-	-	-	21.567,00	0,00
01.08.003.004	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	4,00		4,00	2.211,02	8.844,08	8.844,08	-	8.844,08	-	100,00
01.08.003.005	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00			-	248,94	995,76	-	-	-	995,76	0,00
01.08.003.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	2,00			-	408,69	817,38	-	-	-	817,38	0,00
01.08.003.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	2,00			-	40,50	81,00	-	-	-	81,00	0,00
01.08.003.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	9,00			-	578,74	5.208,66	-	-	-	5.208,66	0,00
01.08.003.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00			-	155,03	1.240,24	-	-	-	1.240,24	0,00
01.08.003.010	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00			-	1.889,21	15.113,68	-	-	-	15.113,68	0,00
01.08.003.011	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00			-	145,74	1.748,88	-	-	-	1.748,88	0,00
01.09	DRENAGEM PLUVIAL							18.331,22	9.270,91	-	9.270,91	9.060,31	50,57
01.09.001	TUBULAÇÃO PVC							6.882,96	-	-	-	6.882,96	0,00
01.09.001.001	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	96,31			-	49,00	4.719,19	-	-	-	4.719,19	0,00
01.09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	53,40			-	29,87	1.595,06	-	-	-	1.595,06	0,00
01.09.001.003	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	m	53,40			-	10,65	568,71	-	-	-	568,71	0,00
01.09.002	CAIXAS DE PASSAGEM							2.177,35	-	-	-	2.177,35	0,00
01.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	7,00			-	311,05	2.177,35	-	-	-	2.177,35	0,00
01.09.003	CALHAS							9.270,91	9.270,91	-	9.270,91	-	100,00
01.09.003.001	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	67,20	67,20		67,20	137,96	9.270,91	9.270,91	-	9.270,91	-	100,00


 Rízia Mendes S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 230/2025				 ANDRADE ENGENHARIA		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B. M. Nº. 04/2026				CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP						
CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026				ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025						
							DATA MEDIÇÃO: 28/04/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.10	DIVERSOS							22.735,52	-	5.912,77	5.912,77	16.822,75	26,01
01.10.001	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							11.919,27	-	-	-	11.919,27	0,00
01.10.001.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00			-	3.857,80	3.857,80	-	-	-	3.857,80	0,00
01.10.001.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00			-	3.271,42	6.542,84	-	-	-	6.542,84	0,00
01.10.001.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00			-	1.224,70	1.224,70	-	-	-	1.224,70	0,00
01.10.001.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00			-	293,93	293,93	-	-	-	293,93	0,00
01.10.002	MOBILIÁRIO URBANO							10.816,25	-	5.912,77	5.912,77	4.903,48	54,67
01.10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	27,50		27,50	27,50	215,01	5.912,77	-	5.912,77	5.912,77	-	100,00
01.10.002.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	2,00			-	874,66	1.749,32	-	-	-	1.749,32	0,00
01.10.002.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00			-	394,27	3.154,16	-	-	-	3.154,16	0,00
01.11	ESTACIONAMENTO							15.001,27	-	-	-	15.001,27	0,00
01.11.001	PAVIMENTAÇÃO							15.001,27	-	-	-	15.001,27	0,00
01.11.001.001	Lastro de brita 1	m3	12,51			-	192,16	2.403,92	-	-	-	2.403,92	0,00
01.11.001.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	m2	125,16			-	100,65	12.597,35	-	-	-	12.597,35	0,00
01.12	SERVIÇOS FINAIS							10.724,41	-	-	-	10.724,41	0,00
01.12.001	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA							6.790,34	-	-	-	6.790,34	0,00
01.12.001.001	Limpeza geral	m2	2.939,54			-	2,31	6.790,34	-	-	-	6.790,34	0,00
01.12.002	DIVERSOS							3.934,07	-	-	-	3.934,07	0,00
01.12.002.001	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00			-	1.450,98	1.450,98	-	-	-	1.450,98	0,00
01.12.002.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			-	2.483,09	2.483,09	-	-	-	2.483,09	0,00
Total geral								1.019.507,42	560.385,97	231.727,42	792.113,39	227.394,03	77,70
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2026.05.07 09:37:51 -03'00'			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____					Aprovado para pagamento Data: __/__/____ 					
Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398													


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)				MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO Nº 239/2025	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B. M. Nº. 04/2026		CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				PERÍODO: 01/02/2026 A 31/03/2026		ORDEN DE SERVIÇOS: 13/10/2025	
						DATA MEDIÇÃO: 26/04/2026	
Item	Discriminação dos Serviços	Und					
1	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Agrovila)						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE						
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	29,64	ADM = (784.191,79 - 16.997,74) / (1.019.507,42 - 32.071,20) = 0,7770			
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	59,28	ENG = 0,777 X 126 = 99,24H - 63,60H = 29,64H			
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS						
01.02.002.003	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	2,00	MESTRE = 0,777 X 240 = 186,48H - 127,20H = 59,28H			
01.04	QUADRA POLIESPORTIVA						
01.04.002	PISO QUADRA						
01.04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	503,93	(31,61 x 16,51) = 521,88m² ... Medido = 503,93m²			
01.04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93	(31,61 x 16,51) = 521,88m² ... Medido = 503,93m²			
01.04.002.006	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,37	(3,45x2,52) + (1,15x9,79) + (0,50x9,79) + (0,50x9,79) + (3,45x5,85) + (0,50x12,20) + (1,15x12,20) + (3,45x1,06) = 69,53m² ... Medido = 55,37m²			
01.05	ALAMBRADO E MURETA						
01.05.005	ALAMBRADO						
01.05.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,97	Pilares = (50cm x 1,20x0,16x0,20) = 1,92m³ + Cintamento = (1,56x0,20x0,16) = 0,05m³ ... Total = 1,97m³			
01.05.005.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 b/wg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	337,92	(31,61x4,45x2) + (16,51x4,45x2) + (4 17 postes) = 429,27m² ... Medido = 337,92m²			
01.06	ARQUIBANCADA						
01.06.007	DIVERSOS						
01.06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	Banco jogadores = 15,00m			
01.07	ÁREA EXTERNA						
01.07.001	MEIO-FIO						
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), at 01/2024	m	451,93	(28,97+7,50+28,97+69,36+52,51+5,01+28,22+5,01+28,16+5,00+5,00+14,49+19,26+29,23+4,91+7,1+8,8+29,24+3,85+13,46) = 451,93m			
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO						
01.07.002.001	Lona plástica preta	m2	824,14	(189,69+160,18+193,15+21,26+25,62+95,66+42,16+26,94) = 824,14m²			
01.07.002.002	Coelhão de areia	m3	57,69	(576,90x0,10) = 57,69m³			
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	62,41	(624,14x0,10) = 62,41m³			
01.07.002.004	Lastro de brita 1	m3	22,41	(449,03x0,05) = 22,45m³ ... Medido = 22,41m³			
01.07.002.006	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	699,31	(189,69+160,18+189,15+91,20+30,01) = 699,31m²			
01.07.004	ESCADARIAS						
01.07.004.001	Escavação manual de vala cu cava em material de 1ª categoria	m3	0,01	(0,02x0,80x0,60) = 0,01m³			
01.07.004.002	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	9,13	9,13m			
01.10	DIVERSOS						
01.10.002	MOBILIÁRIO URBANO						
01.10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	27,50	(11,00und x 2,50m) = 27,50m			
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133399				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____		Aprovado para pagamento Data: ____/____/____  Riza Milene S. Rodrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 2715918424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

Documento assinado digitalmente

JHON LENNON COMES SANTOS
 Data: 29/04/2026 09:25:51-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B.M. Nº. 04/2026

CONTRATO Nº 230/2025

CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP
1.093.754-65/2024/MESP

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025



MEIO-FIO; PISO DE CONCRETO; CORRIMÃOS;



CONCRETO SIMPLES; ALAMBRADO;



ALAMBRADO;



EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA;



EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA;



CONCRETO SIMPLES; ALAMBRADO

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590

ELABORADO POR:

Assinado de forma
digital por JOSE
ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.05.14
09:36:33 -03'00'

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B.M. Nº. 04/2026

CONTRATO Nº 230/2025

CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP
1.093.754-65/2024/MESP

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025



MEIO-FIO; PISO DE CONCRETO;



PISO DE CONCRETO;



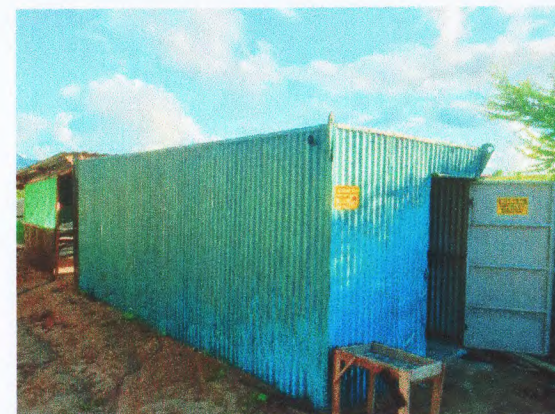
BANCO DE CONCRETO;



BANCO DE CONCRETO;




BANCO DE CONCRETO;




CONTAINER;

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.05.14
09:36:48 -03'00'


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FOLHA 2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

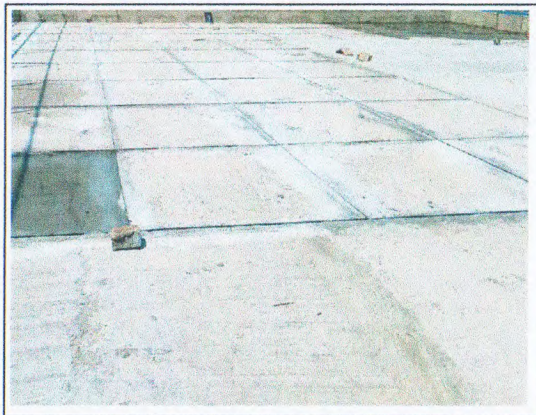
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
B.M. N°. 04/2025

CONTRATO N° 230/2025

CONTRATO DE REPASSE N° 959754-OP
1.093.754-65/2024/MESP

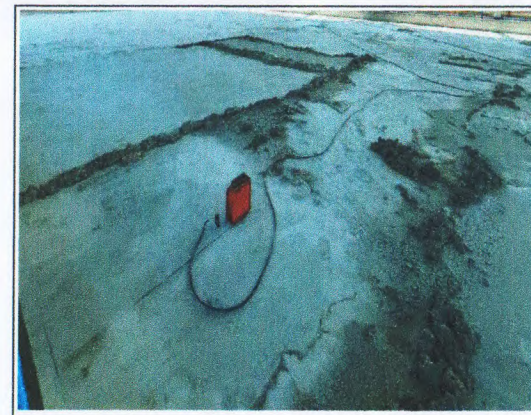
ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025



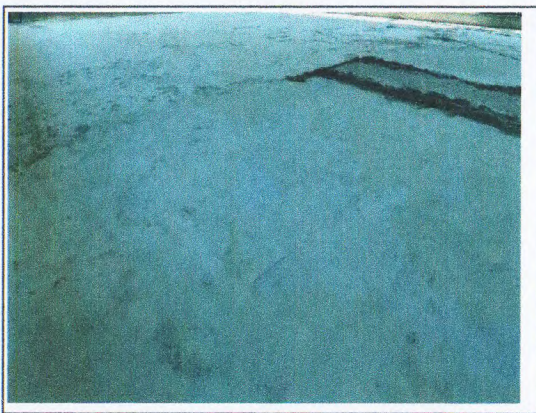
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - EXECUÇÃO



PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - EXECUÇÃO



PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - EXECUÇÃO



PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - EXECUÇÃO



PIS ODE ALTA RESISTÊNCIA - POLIMENTO



PIS ODE ALTA RESISTÊNCIA - POLIMENTO

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008

Assinado de forma
digital por JOSE
ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.05.14
09:36:59 -03'00'

ELABORADO POR: 92714590

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 3
