



Campo do Brito (SE), 01 de Julho de 2026.

A João
Fiscal de Obras da Prefeitura Municipal de Itabaiana
Prezado Senhor,

A CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa de direito privado, sediada na Avenida José Carlos Ribeiro de Oliveira nº 471, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 16458507/0001-23, através do seu responsável legal, vem pelo presente encaminhar Boletim de nº 04 (VESTIÁRIO), período de 01/04/2026 à 30/04/2026, no valor de R\$ 38.060,11 (Trinta e oito mil, sessenta reais e onze centavos), referente a CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP. Conforme documentos em anexo.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA SOL	Assinado de forma
E	digital por
EMPREENDIMENTOS	CONSTRUTORA SOL E
LTDA:164585070001	EMPREENDIMENTOS
23	LTDA:16458507000123
	Dados: 2026.07.01
	09:56:35 -03'00'

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				CONTRATO: Nº 258/2025				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
	Vestiário								178.398,82	63.210,05	38.060,11	101.270,16	77.128,66	56,76	
02.01	VESTIÁRIO								178.398,82	63.210,10	38.060,11	101.270,21	77.128,61	56,76	
02.01.001	LOCAÇÃO								777,03	777,03	-	777,03	-	100,00	
02.01.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	88,50	88,50		88,50	-	8,78	777,03	777,03	-	777,03	-	100,00	
02.01.002	MOVIMENTO DE TERRA								2.321,06	2.321,06	-	2.321,06	-	100,00	
02.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,84	11,84		11,84	-	55,70	659,49	659,49	-	659,49	-	100,00	
02.01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	14,21	14,21		14,21	-	9,81	139,40	139,40	-	139,40	-	100,00	
02.01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade= 1,5t/m³	tkm	42,63	42,63		42,63	-	1,03	43,91	43,91	-	43,91	-	100,00	
02.01.002.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	8,71	8,71		8,71	-	169,72	1.478,26	1.478,26	-	1.478,26	-	100,00	
02.01.003	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)								11.840,10	11.840,10	-	11.840,10	-	100,00	
02.01.003.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,49	10,49		10,49	-	460,83	4.834,11	4.834,11	-	4.834,11	-	100,00	
02.01.003.002	Concreto magro para lastro, traço 1-4,5-4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 05/2021	m3	0,15	0,15		0,15	-	380,96	57,14	57,14	-	57,14	-	100,00	
02.01.003.003	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	3,05	3,05		3,05	-	2.278,31	6.948,85	6.948,85	-	6.948,85	-	100,00	
02.01.004	SUPER-ESTRUTURA								8.588,74	8.588,74	-	8.588,74	-	100,00	
02.01.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,90	3,90		3,90	-	2.202,24	8.588,74	8.588,74	-	8.588,74	-	100,00	
02.01.005	LAJES TRELIÇADAS								17.428,17	4.714,02	12.714,15	17.428,17	-	100,00	
02.01.005.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	77,94	23,39	54,55	77,94	-	201,54	15.708,03	4.714,02	10.994,01	15.708,03	-	100,00	
02.01.005.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2.45x6.0m, Telcon ou similar	m2	77,94	-	77,94	77,94	-	22,07	1.720,14	-	1.720,14	1.720,14	-	100,00	
02.01.006	IMPERMEABILIZAÇÃO								1.430,03	-	-	-	1.430,03	-	
02.01.006.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	47,18	-	-	-	47,18	30,31	1.430,03	-	-	-	1.430,03	-	
02.01.007	PAREDES								15.333,57	13.346,93	-	13.346,93	1.986,64	87,04	
02.01.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	263,33	263,33		263,33	-	46,13	12.147,41	12.147,41	-	12.147,41	-	100,00	
02.01.007.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	8,70	-	-	-	8,70	228,35	1.986,64	-	-	-	1.986,64	-	
02.01.007.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	33,20	33,20		33,20	-	36,13	1.199,52	1.199,52	-	1.199,52	-	100,00	
02.01.008	COBERTURA								8.939,47	-	8.939,47	8.939,47	-	100,00	
02.01.008.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m2	69,80	-	69,80	69,80	-	19,46	1.358,31	-	1.358,31	1.358,31	-	100,00	
02.01.008.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev.02	m2	69,80	-	69,80	69,80	-	49,91	3.483,72	-	3.483,72	3.483,72	-	100,00	
02.01.008.003	Ruífo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	40,44	-	40,44	40,44	-	51,85	2.096,81	-	2.096,81	2.096,81	-	100,00	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04					CONTRATO: Nº 258/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026		RECURSO:							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 10/06/2026									
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
02.01.008.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais= 15 cm, bordas=3 cm)	m	18,64	-	18,64	18,64	-	107,33	2.000,63	-	2.000,63	2.000,63	-	100,00	
02.01.009	REVESTIMENTO DE TETOS								3.004,93	-	3.004,93	3.004,93	-	100,00	
02.01.009.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual, af 10/2022	m2	68,59	-	68,59	68,59	-	11,32	776,44	-	776,44	776,44	-	100,00	
02.01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	68,59	-	68,59	68,59	-	32,49	2.228,49	-	2.228,49	2.228,49	-	100,00	
02.01.010	REVESTIMENTO DE PAREDES								31.008,65	9.808,70	5.929,02	15.737,72	15.270,93	50,75	
02.01.010.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	512,91	461,63	51,28	512,91	-	6,03	3.092,85	2.783,63	309,22	3.092,85	-	100,00	
02.01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	262,95	131,50	105,20	236,70	26,25	28,82	7.578,22	3.789,83	3.031,86	6.821,69	756,53	90,01	
02.01.010.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	207,50	103,76	83,00	186,76	20,74	31,18	6.469,85	3.235,24	2.587,94	5.823,18	646,67	90,00	
02.01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	215,93	-	-	-	215,93	54,74	11.820,01	-	-	-	11.820,01	-	
02.01.010.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	27,94	-	-	-	27,94	73,29	2.047,72	-	-	-	2.047,72	-	
02.01.011	PISOS INTERNOS								8.990,66	2.439,06	-	2.439,06	6.551,60	27,12	
02.01.011.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm, af 07/2021	m2	54,44	27,30	-	27,30	27,14	48,76	2.654,49	1.331,15	-	1.331,15	1.323,34	50,14	
02.01.011.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	72,08	36,10	-	36,10	35,98	30,69	2.212,14	1.107,91	-	1.107,91	1.104,23	50,08	
02.01.011.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	55,52	-	-	-	55,52	74,28	4.124,03	-	-	-	4.124,03	-	
02.01.012	SOLEIRAS E PEITORIS								1.845,06	-	-	-	1.845,06	-	
02.01.012.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	-	-	-	6,30	91,82	578,47	-	-	-	578,47	-	
02.01.012.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,60	-	-	-	10,60	119,49	1.266,59	-	-	-	1.266,59	-	
02.01.013	ESQUADRIAS DE MADEIRA								9.416,77	-	3.840,19	3.840,19	5.576,58	40,78	
02.01.013.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	-	1,00	1,00	2,00	1.736,39	5.209,17	-	1.736,39	1.736,39	3.472,78	33,33	
02.01.013.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	-	1,00	1,00	1,00	2.103,80	4.207,60	-	2.103,80	2.103,80	2.103,80	50,00	
02.01.014	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO								9.589,04	-	-	-	9.589,04	-	
02.01.014.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	10,88	-	-	-	10,88	326,62	3.553,63	-	-	-	3.553,63	-	
02.01.014.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	6,72	-	-	-	6,72	567,53	3.813,80	-	-	-	3.813,80	-	
02.01.014.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	6,72	-	-	-	6,72	220,45	1.481,42	-	-	-	1.481,42	-	
02.01.014.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	1,76	-	-	-	1,76	420,56	740,19	-	-	-	740,19	-	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04					CONTRATO: Nº 258/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
02.01.015	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								7.547,38	7.547,38	-	7.547,38	-	100,00	
02.01.015.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	14,00		14,00	-	82,29	1.152,06	1.152,06	-	1.152,06	-	100,00	
02.01.015.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	2,00	2,00		2,00	-	159,77	319,54	319,54	-	319,54	-	100,00	
02.01.015.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un	7,00	7,00		7,00	-	90,59	634,13	634,13	-	634,13	-	100,00	
02.01.015.004	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	2,00		2,00	-	47,40	94,80	94,80	-	94,80	-	100,00	
02.01.015.005	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	4,00	4,00		4,00	-	69,01	276,04	276,04	-	276,04	-	100,00	
02.01.015.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/sgoto predial, d = 50mm	m	12,00	12,00		12,00	-	26,48	317,76	317,76	-	317,76	-	100,00	
02.01.015.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/sgoto predial, d = 75mm	m	18,70	18,70		18,70	-	28,13	526,03	526,03	-	526,03	-	100,00	
02.01.015.008	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/sgoto predial, d = 100mm	m	19,20	19,20		19,20	-	39,15	751,68	751,68	-	751,68	-	100,00	
02.01.015.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	3,00	3,00		3,00	-	304,02	912,06	912,06	-	912,06	-	100,00	
02.01.015.010	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	1,00		1,00	-	1.059,62	1.059,62	1.059,62	-	1.059,62	-	100,00	
02.01.015.011	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00	1,00		1,00	-	1.503,66	1.503,66	1.503,66	-	1.503,66	-	100,00	
02.01.016	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								5.459,43	1.827,08	3.632,35	5.459,43	-	100,00	
02.01.016.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	21,00	-	21,00	21,00	-	134,97	2.834,37	-	2.834,37	2.834,37	-	100,00	
02.01.016.002	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	4,00	-	4,00	4,00	-	98,32	393,28	-	393,28	393,28	-	100,00	
02.01.016.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	-	2,00	2,00	-	172,00	344,00	-	344,00	344,00	-	100,00	
02.01.016.004	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	-	2,00	2,00	-	30,35	60,70	-	60,70	60,70	-	100,00	
02.01.016.005	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	44,00	44,00		44,00	-	11,59	509,96	509,96	-	509,96	-	100,00	
02.01.016.006	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	20,00	20,00		20,00	-	18,47	369,40	369,40	-	369,40	-	100,00	
02.01.016.007	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	2,00	2,00		2,00	-	473,86	947,72	947,72	-	947,72	-	100,00	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				CONTRATO: Nº 258/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026			Período: 01/04/2026 a 30/04/2026		RECURSO:					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026			Data da Medição: 10/06/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.01.017	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								7.306,93	-	-	-	7.306,93	-
02.01.017.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1,00	284,23	284,23	-	-	-	284,23	-
02.01.017.002	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00	-		-	1,00	101,52	101,52	-	-	-	101,52	-
02.01.017.003	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	-		-	1,00	21,58	21,58	-	-	-	21,58	-
02.01.017.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af 10/2020	un	1,00	-		-	1,00	10,01	10,01	-	-	-	10,01	-
02.01.017.005	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	4,00	-		-	4,00	65,22	260,88	-	-	-	260,88	-
02.01.017.006	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	9,00	-		-	9,00	329,85	2.968,65	-	-	-	2.968,65	-
02.01.017.007	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00	-		-	7,00	233,38	1.633,66	-	-	-	1.633,66	-
02.01.017.008	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	4,00	-		-	4,00	335,51	1.342,04	-	-	-	1.342,04	-
02.01.017.009	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	un	9,00	-		-	9,00	76,04	684,36	-	-	-	684,36	-
02.01.018	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS								16.091,70	-	-	-	16.091,70	-
02.01.018.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	-		-	2,00	283,86	567,72	-	-	-	567,72	-
02.01.018.002	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	6,00	-		-	6,00	513,63	3.081,78	-	-	-	3.081,78	-
02.01.018.003	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares	un	2,00	-		-	2,00	1.375,15	2.750,30	-	-	-	2.750,30	-
02.01.018.004	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação, af 01/2020	un	5,00	-		-	5,00	450,35	2.251,75	-	-	-	2.251,75	-
02.01.018.005	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação, af 01/2020	un	2,00	-		-	2,00	612,01	1.224,02	-	-	-	1.224,02	-
02.01.018.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,53	-		-	2,53	574,68	1.453,94	-	-	-	1.453,94	-
02.01.018.007	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	1,43	-		-	1,43	604,27	864,11	-	-	-	864,11	-
02.01.018.008	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	6,00	-		-	6,00	33,34	200,04	-	-	-	200,04	-
02.01.018.009	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação, af 01/2020	un	4,00	-		-	4,00	115,55	462,20	-	-	-	462,20	-
02.01.018.010	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	7,00	-		-	7,00	6,63	46,41	-	-	-	46,41	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO					BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				CONTRATO: Nº 258/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026		RECURSO:									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 10/06/2026											
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido			
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir				
02.01.018.011	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	7,00	-		-	7,00	29,15	204,05	-	-	-	204,05	-			
02.01.018.012	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	-		-	2,00	166,28	332,56	-	-	-	332,56	-			
02.01.018.013	Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	607,28	1.214,56	-	-	-	1.214,56	-			
02.01.018.014	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	2,00	-		-	2,00	719,13	1.438,26	-	-	-	1.438,26	-			
02.01.019	PINTURA TETOS E PAREDES								9.811,85	-	-	-	9.811,85	-			
02.01.019.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	m2	68,59	-		-	68,59	4,36	299,05	-	-	-	299,05	-			
02.01.019.002	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	195,79	-		-	195,79	3,07	601,08	-	-	-	601,08	-			
02.01.019.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	90,90	-		-	90,90	16,36	1.487,12	-	-	-	1.487,12	-			
02.01.019.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	173,48	-		-	173,48	17,42	3.022,02	-	-	-	3.022,02	-			
02.01.019.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	90,90	-		-	90,90	19,31	1.755,28	-	-	-	1.755,28	-			
02.01.019.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	173,48	-		-	173,48	15,26	2.647,30	-	-	-	2.647,30	-			
02.01.020	PINTURA MADEIRA								1.486,82	-	-	-	1.486,82	-			
02.01.020.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	23,95	-		-	23,95	62,08	1.486,82	-	-	-	1.486,82	-			
02.01.021	SERVIÇOS FINAIS								181,43	-	-	-	181,43	-			
02.01.021.001	Limpeza geral	m2	88,50	-		-	88,50	2,05	181,43	-	-	-	181,43	-			
TOTAL:									178.398,82	63.210,05	38.080,11	101.270,16	77.128,66	56,76%			
PERCENTUAL										35,43%	21,33%	56,76%	43,24%				
		ASSINATURA DA EMPRESA						Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Dados: 2026.06.30 10:07:04 -03'00'						FISCAL DO CONTRATO		ENGº. JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS - CREA 2723359220	

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 30/06/2026 08:33:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 30/06/2026 08:41:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP <u>VESTIÁRIO</u>				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04 Período 01/04/2026 a 30/04/2026	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 10/06/2026	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
02.01.005 LAJES TRELIÇADAS					
02.01.005.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	54,55	13,99 m x 3,90 m = 54,55 m²	
02.01.005.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	77,94	19,98 m x 3,90 m = 77,94 m²	
02.01.008 COBERTURA					
02.01.008.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	69,80	19,39 m x 3,60 m = 69,80 m²	
02.01.008.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	69,80	19,39 m x 3,60 m = 69,80 m²	
02.01.008.003	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	40,44	8,60 + 3,60 + 3,60 + 6,20 + 3,60 + 3,60 + 3,85 + 4,30 + 3,10 = 40,44 metros	
02.01.008.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	18,64	8,57 + 3,85 + 6,22 = 18,64 metros	
02.01.009 REVESTIMENTO DE TETOS					
02.01.009.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022	m2	68,59	3,10x2,20 + 5,72x3,10 + 2,00x1,85x2 + 5,70x3,10 + 2,00x2,15x2 + 3,90x0,50x2 + 6,47x0,50x2 = 68,59 m²	
02.01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	68,59	3,10x2,20 + 5,72x3,10 + 2,00x1,85x2 + 5,70x3,10 + 2,00x2,15x2 + 3,90x0,50x2 + 6,47x0,50x2 = 68,59 m²	
02.01.010 REVESTIMENTO DE PAREDES					
02.01.010.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	51,28	3,50x3,60 + 4,00x3,14 + 2,50x2,80 + 3,20x3,50 + 2,60x3,00 = 51,28 m²	
02.01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	105,20	6,67x1,50 + 6,00x2,00 + 5,60x2,50 + 5,00x3,00 + 5,00x3,20 + 5,06x3,40 + 6,00x3,50 = 105,20 m²	
02.01.010.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	83,00	3,50x4,80 + 3,40x4,90 + 3,50x4,70 + 3,20x5,10 + 3,35x5,00 = 83,00 m²	
02.01.013 ESQUADRIAS DE MADEIRA					
02.01.013.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00 unidade	
02.01.013.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00 unidade	
02.01.016 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
02.01.016.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	21,00	21,00 unidades	
02.01.016.002	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	4,00	4,00 unidades	
02.01.016.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	2,00 unidades	
02.01.016.004	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	2,00 unidades	
		Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.			
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		Data: / /			

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.06.30 10:09:10 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 30/06/2026 08:33:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 30/06/2026 08:41:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO Nº 258/2025


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

ORDEM DE SERVIÇO


INICIO - 25/08/2025

Período - 01/04/2026 a 30/04/2026

Medição - 10/06/2026

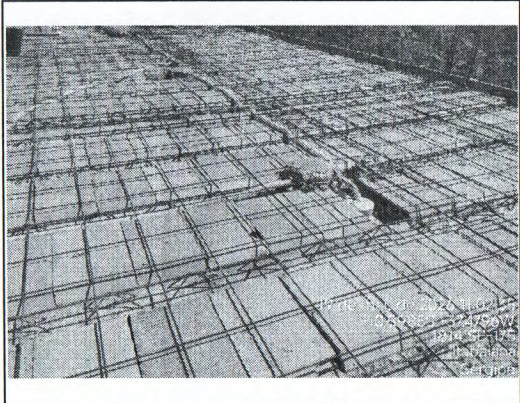


INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO - LAJE

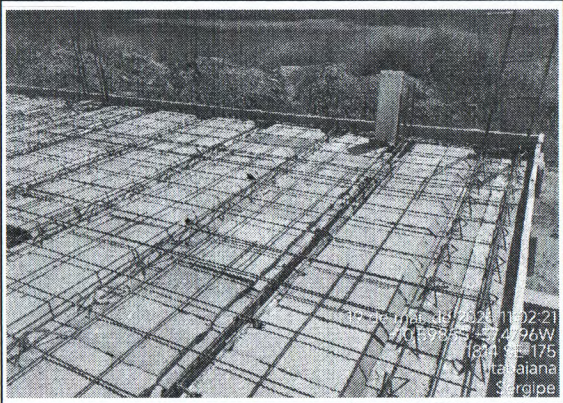


EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA




EXECUÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA

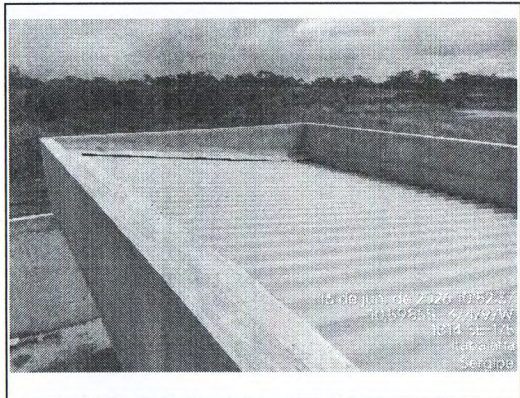

TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO

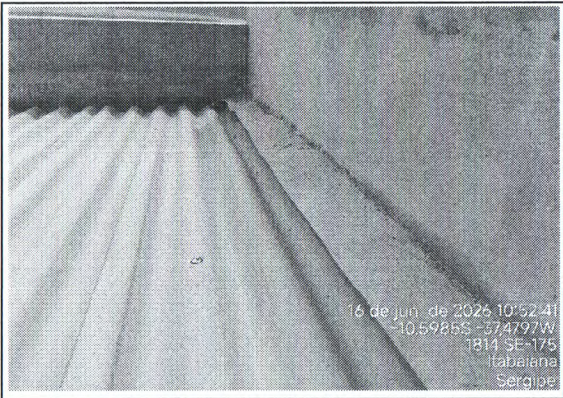

EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO

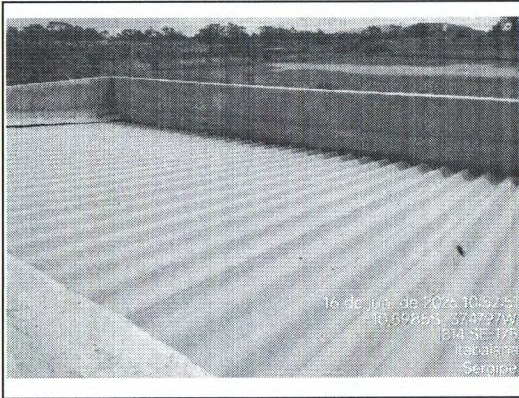


EXECUÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO

ELABORADO POR:


OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO Nº 258/2025
ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 25/08/2025
Período - 01/04/2026 a 30/04/2026
Medição - 10/06/2026

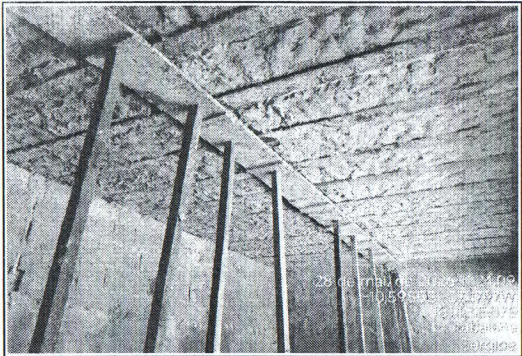

CHAPISCO DE TETO

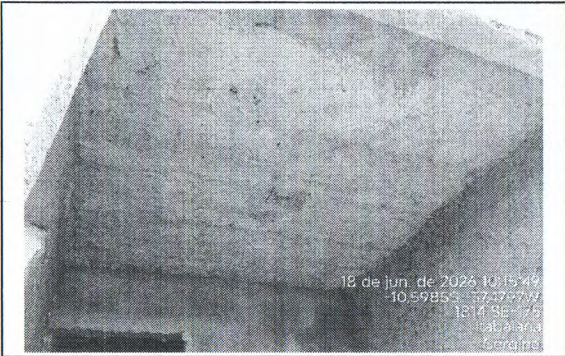

REBOCO DE TETO




CHAPISCO EM PAREDE



REBOCO INTERNO



REBOCO EXTERNO

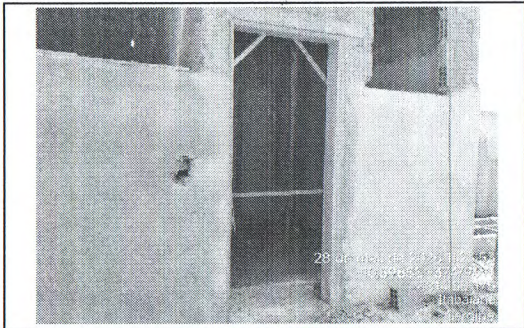

PORTAS DE MADEIRA

ELABORADO POR:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO Nº 258/2025

ORDEM DE SERVIÇO


INICIO - 25/08/2025

Período - 01/04/2026 a 30/04/2026


Medição - 10/06/2026




PORTAS DE MADEIRA

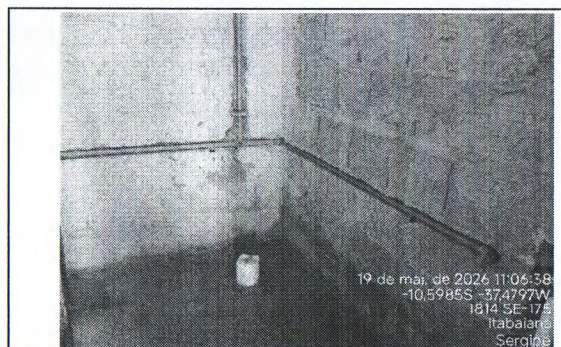


INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

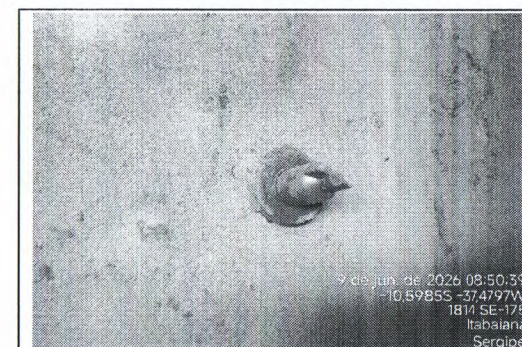


INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

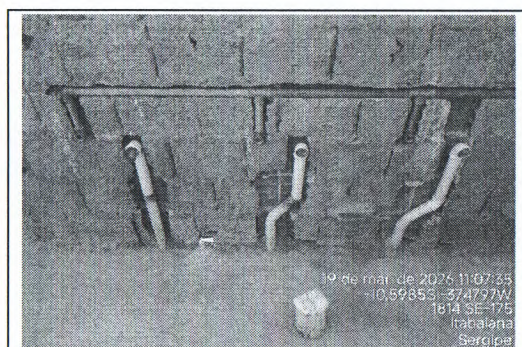

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

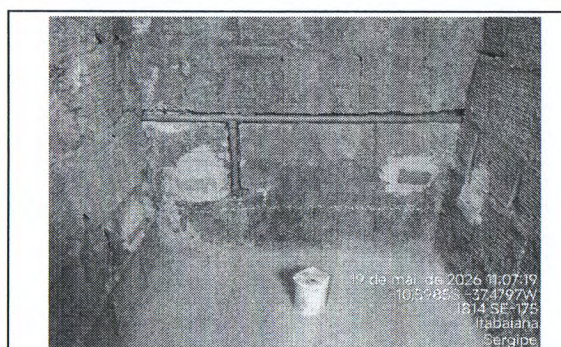

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

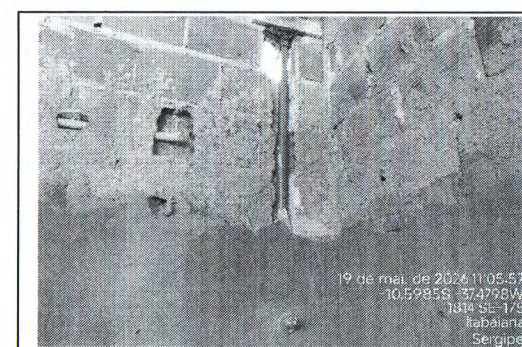

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

ELABORADO POR:

FOLHA 2 de 2

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:7904588
0563

Assinado de forma digital
por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.06.30 10:11:22
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 30/06/2026 08:33:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 30/06/2026 08:41:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
