

PERIODO:

01/04/2026 A 31/05/2026

R\$ 1.687.205,31

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PE DO VEADO

CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	QUANTIDADE	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1.1	CANTEIRO														
1.1.1.1	Picra de obra em chapta aço galvanizado, instalada - Rev 02 - 01/2022	m²	0,00	17,100	17,100	36,000	448,90	RS 0,00	RS 0,00	RS 7,676,19	RS 7,676,19	RS 16,160,40	RS 8,484,21	RS 4,880,00	RS 4,880,00
1.1.1.2	Locação de contâiner - Almoxxarado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 - 02/2022	mês	2,00	3,00	5,00	10,00	976,00	RS 1,952,00	RS 1,952,00	RS 2,928,00	RS 4,880,00	RS 9,760,00	RS 4,880,00	RS 9,760,00	RS 9,760,00
1.1.1.3	Locação de contâiner - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 - 02/2022	mês	2,00	3,00	5,00	10,00	1,952,00	RS 1,904,00	RS 3,856,00	RS 5,760,00	RS 9,760,00	RS 19,520,00	RS 9,760,00	RS 9,760,00	RS 9,760,00
1.1.1.4	Locação de contâiner - Refeição sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 - 02/2022	mês	2,00	3,00	5,00	10,00	2,196,00	RS 4,392,00	RS 6,588,00	RS 10,980,00	RS 21,960,00	RS 10,980,00	RS 10,980,00	RS 10,980,00	RS 10,980,00
1.1.1.5	Tapume em chapta galvanizada n°30, esp=0,35mm, t=2,00m, exclusive pintura	m	0,00	60,000	60,000	60,000	208,17	RS 0,00	RS 12,490,20	RS 12,490,20	RS 12,490,20	RS 12,490,20	RS 4,080,00	RS 4,080,00	RS 4,080,00
1.1.1.6	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mes	2,00	3,00	5,00	10,00	816,00	RS 1,632,00	RS 2,448,00	RS 4,080,00	RS 5,712,00	RS 11,424,00	RS 5,712,00	RS 5,712,00	RS 5,712,00
1.1.1.7	Aluguel de betoneira 400 l com motor a diesel (com carregador)	mes	0,00	3,000	3,000	3,000	649,00	RS 0,00	RS 1,647,00	RS 1,647,00	RS 1,647,00	RS 1,647,00	RS 1,647,00	RS 1,647,00	RS 1,647,00
1.1.1.8	Vibrador de missão (com mangote)	h	0,00	220,000	220,000	220,000	1,53	RS 0,00	RS 336,60	RS 336,60	RS 336,60	RS 336,60	RS 336,60	RS 336,60	RS 336,60
1.1.1.9	Martetele rompedor elétrico, 220V, 16kg	dia	0,00	60,000	60,000	60,000	85,40	RS 0,00	RS 5,124,00	RS 5,124,00	RS 5,124,00	RS 5,124,00	RS 5,124,00	RS 5,124,00	RS 5,124,00
1.1.2	MURROS E CERCCAS														
1.1.2.1	Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 08/2023	m	0,00	490,000	490,000	490,000	11,20	RS 0,00	RS 5,488,00	RS 5,488,00	RS 5,488,00	RS 5,488,00	RS 5,488,00	RS 5,488,00	RS 5,488,00
1.1.2.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (carga de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t), af. 07/2020	t	0,00	5,510	5,510	5,510	7,12	RS 0,00	RS 39,23	RS 39,23	RS 39,23	RS 39,23	RS 39,23	RS 39,23	RS 39,23
1.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm), af. 07/2020	tkm	0,00	110,200	110,200	110,200	1,00	RS 0,00	RS 110,20	RS 110,20	RS 110,20	RS 110,20	RS 110,20	RS 110,20	RS 110,20
1.1.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,00	5,510	5,510	5,510	36,60	RS 0,00	RS 201,67	RS 201,67	RS 201,67	RS 201,67	RS 201,67	RS 201,67	RS 201,67
1.2	TERRAPLENAGEM CORTEE/ATERRO														
1.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	12,439,400	49,439,400	49,439,400	49,439,400	1,61	RS 20,077,43	RS 29,597,43	RS 29,597,43	RS 29,597,43	RS 29,597,43	RS 29,597,43	RS 29,597,43	RS 29,597,43
1.2.2	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m³	3,731,310	11,100,000	14,831,310	14,831,310	3,07	RS 11,455,12	RS 34,077,00	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12
1.2.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	4,850,703	14,430,000	19,280,703	19,280,703	4,487	RS 11,455,12	RS 34,077,00	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12	RS 45,542,12
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm), af. 07/2020	tkm	109,140,817	324,675,000	433,815,817	433,815,817	1,00	RS 109,140,82	RS 324,675,00	RS 433,815,82	RS 433,815,82	RS 433,815,			

RESUMO

MEDIDA: 4ª MEDIÇÃO PARCIAL

PERÍODO: 01/04/2026 A 31/05/2026

R\$ 1.687.205,31

CONTRATO: 427 / 2025
CONTRATA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
VALORES EM R\$													
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO												
1.1.2	BASE GRADUADA COM BRITA												
1.1.2.1	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pa carregadeira (carga de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). at 07/2020	m³	698,625	3.881.250	4.579.875	5.192.130	612.255	199,99	337.945	139.718,01	776.211,19	915.929,20	1038.374,08
1.1.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pa carregadeira (carga de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). at 07/2020	m³	978,075	5.433.750	6.411.825	6.749.770	337.945	9,98	761,19	54.228,83	63.990,01	736,702,70	833.372,69
1.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: t.km). at 07/2020	t.km	46.109,250	256.162,500	302.271.750	303.739,610	1.467.860	1,00	46.109,25	256.162,50	303.739,61	303.739,61	1.467,86
1.1.3	CAPA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO												
1.1.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	4.320,000	24.000,000	28.320,000	34.164,200	5.844,200	1,76	603,20	438.943,10	2.438.572,80	2.877.515,90	3.493.016,48
1.1.3.2	Implicação - execução com fornecimento de material	m²	4.636,000	25.200,000	29.736,000	34.614,200	4.878,200	13,43	918,48	338.436,00	309.354,48	464.868,71	65.514,23
1.1.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	8.640,000	48.000,000	56.640,000	69.228,400	12.588,400	1,94	761,60	93.120,00	109.881,60	134.303,10	24.421,50
1.1.3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, at 11/2019	m³	216,000	1.200,000	1.416,000	1.730,710	314.710	1.500,01	774,46	324.002,16	1.800.012,00	2.124.014,16	2.596.082,31
1.1.3.5	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 l/h e descarga em vibracabadora	t	518,400	2.880,000	3.398,400	4.153,700	755,300	9,21	474,46	26.524,80	31.299,26	38.255,58	6.956,32
1.1.3.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: t.km). at 07/2020	t.km	15.552,000	86.400,000	101.952,000	124.611,120	22.659,120	1,00	101.952,00	86.400,00	101.952,00	124.611,12	22.659,12
1.1.3.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: t.km). at 07/2020	t.km	15.552,000	86.400,000	101.952,000	124.611,120	22.659,120	0,60	9.331,20	51.840,00	61.171,20	74.766,67	13.595,47
1.4	SINALIZAÇÃO												
1.4.1	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p aspersão) - Rev 05	m²	0,000	0,000	1.825,840	1.825,840	1.825,840	90,56	0,000	0,000	0,000	165.348,07	165.348,07
1.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnt diam = 0,75m, com poste de madeira 3,50m	un	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000	750,61	0,000	0,000	0,000	12.009,76	12.009,76
1.4.3	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,000	0,000	0,000	29,000	29,000	1.225,97	0,000	0,000	0,000	35.553,13	35.553,13
1.4.4	Defensa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação, inclusive pintura	m	0,000	0,000	0,000	600,000	600,000	499,99	0,000	0,000	0,000	299.994,00	299.994,00
1.4.5	Terminal de ancoragem para defesa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação, inclusive pintura	un	0,000	0,000	0,000	12,000	12,000	601,31	0,000	0,000	0,000	7.215,72	7.215,72
1.4.6	Taça refletiva (luchão) hidrefletora confeccionada em resina poliéster com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm	un	0,000	0,000	0,000	565,000	565,000	127,40	0,000	0,000	0,000	71.981,00	71.981,00
1.4.7	Taça refletiva hidrefletora confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	0,000	0,000	0,000	4.800,000	4.800,000	25,00	0,000	0,000	0,000	120.000,00	120.000,00
1.5	DIVERSOS												
1.5.1	Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,0m, altura útil 1,60m, c/ 7 fios arame-farpado	m	0,000	490,000	490,000	0,000	64,73	0,000	31.717,70	31.717,70	31.717,70	55.947,64	24.229,94
1.5.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,000	0,000	0,000	34.614,200	34.614,200	0,70	0,000	0,000	0,000	24.229,94	24.229,94
1.6	DRENAGEM - PONTO CRÍTICO 02 - REDE COLETORA												
1.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.6.1.1	Locação de rede de drenagem	m	0,000	126,000	126,000	126,000	1,99	0,000	250,74	250,74	250,74	250,74	250,74
1.6.1.2	Sinalização (Jurna) com 1 tela tapume em pvc - 10 usos	m	0,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	5,81	0,000	9.296,00	9.296,00	9.296,00	9.296,00	9.296,00
1.6.1.3	Sinalização noturna com tela tapume pvc, batede plástico faixa e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	0,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	4,20	0,000	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
1.6.1.4	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	0,000	126,000	126,000	126,000	3,98	0,000	501,48	501,48	501,48	501,48	501,48
1.6.2	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO												
1.6.2.1	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	0,000	24,000	24,000	24,000	521,55	0,000	12.517,20	12.517,20	12.517,20	12.517,20	12.517,20
1.6.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pa carregadeira (carga de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). at 07/2020	m³	0,000	24,000	24,000	24,000	9,98	0,000	239,52	239,52	239,52	239,52	239,52
1.6.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: t.km). at 07/2020	t.km	0,000	576,000	576,000	576,000	1,00	0,000	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
1.6.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,000	24,000	24,000	24,000	36,60	0,000	878,40	878,40	878,40	878,40	878,40

Eng.º Civil CREA - 2722482487
Diego Oliveira Barros
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng.º Civil
Paulo Silveira Deda Neto
CREA nº 2702882056

Eng. Civil CREA - 2721894692
Leon Lemos Gomes Santos
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO: 427 / 2025

CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO PARCIAL
PERÍODO: 01/04/2026 A 31/05/2026

R\$ 1.687.205,31

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					UNITÁRIO	VALORES EM R\$				
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO		EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO								R\$ 1.687.205,31	R\$ 8.690.492,71	R\$ 10.377.896,02	R\$ 12.714.716,00	R\$ 2.337.017,98
1.6.3	ABERTURA DE VALA								R\$ 0,00	R\$ 113.268,26	R\$ 113.268,26	R\$ 113.268,26	R\$ 0,00
1.6.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m³	0,000	822,500	822,500	822,500	0,000	120,00	R\$ 0,00	R\$ 98.700,00	R\$ 98.700,00	R\$ 98.700,00	R\$ 0,00
1.6.3.2	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	0,000	822,500	822,500	822,500	0,000	3,45	R\$ 0,00	R\$ 2.837,63	R\$ 2.837,63	R\$ 2.837,63	R\$ 0,00
1.6.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_ 07/2020	tkm	0,000	11.720,625	11.720,625	11.720,630	0,005	1,00	R\$ 0,00	R\$ 11.720,63	R\$ 11.720,63	R\$ 11.720,63	R\$ 0,00
1.6.4	ESCORAMENTO DE VALAS								R\$ 0,00	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 0,00
1.6.4.1	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_ 08/2020	m²	0,000	690,480	690,480	690,480	0,000	111,51	R\$ 0,00	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 0,00
1.6.5	REBAIXAMENTO DE VALAS								R\$ 0,00	R\$ 21.246,98	R\$ 21.246,98	R\$ 21.246,98	R\$ 0,00
1.6.5.1	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)	m	0,000	52,500	52,500	52,500	0,000	36,11	R\$ 0,00	R\$ 1.895,78	R\$ 1.895,78	R\$ 1.895,78	R\$ 0,00
1.6.5.2	Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_ 03/2016	chp	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	79,69	R\$ 0,00	R\$ 17.531,80	R\$ 17.531,80	R\$ 17.531,80	R\$ 0,00
1.6.5.3	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia	h	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	8,27	R\$ 0,00	R\$ 1.819,40	R\$ 1.819,40	R\$ 1.819,40	R\$ 0,00
1.6.6	FUNDAÇÃO								R\$ 0,00	R\$ 19.522,45	R\$ 19.522,45	R\$ 19.522,45	R\$ 0,00
1.6.6.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_ 08/2020	m³	0,000	22,120	22,120	22,120	0,000	285,15	R\$ 0,00	R\$ 6.307,52	R\$ 6.307,52	R\$ 6.307,52	R\$ 0,00
1.6.6.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_ 08/2020	m³	0,000	33,180	33,180	33,180	0,000	398,28	R\$ 0,00	R\$ 13.214,93	R\$ 13.214,93	R\$ 13.214,93	R\$ 0,00
1.6.7	EXECUÇÃO DE BUEIROS								R\$ 0,00	R\$ 431.276,99	R\$ 431.276,99	R\$ 622.869,69	R\$ 191.592,70
1.6.7.1	Corpo de BSTC D=0,80m (Padrão DNIT)	m	0,000	70,000	70,000	70,000	0,000	1.023,69	R\$ 0,00	R\$ 71.658,30	R\$ 71.658,30	R\$ 71.658,30	R\$ 0,00
1.6.7.2	Corpo de BSTC D=1,00m (Padrão DNIT)	m	0,000	14,000	14,000	14,000	0,000	1.452,40	R\$ 0,00	R\$ 20.333,60	R\$ 20.333,60	R\$ 20.333,60	R\$ 0,00
1.6.7.3	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	0,000	0,000	14,000	14,000	5.865,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.118,82	R\$ 82.118,82
1.6.7.4	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	12,700	12,700	14,000	1,300	7.394,59	R\$ 0,00	R\$ 93.911,29	R\$ 93.911,29	R\$ 103.524,26	R\$ 9.612,97
1.6.7.5	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	11,000	11,000	14,000	3,000	10.166,33	R\$ 0,00	R\$ 111.829,63	R\$ 111.829,63	R\$ 142.328,62	R\$ 30.498,99
1.6.7.6	Boca para bueiro simples celular 250 x 250 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_ 07/2021	un	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	34.680,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.361,92	R\$ 69.361,92
1.6.7.7	Boca para bueiro duplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_ 07/2021	un	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	30.282,95	R\$ 0,00	R\$ 60.565,90	R\$ 60.565,90	R\$ 60.565,90	R\$ 0,00
1.6.7.8	Boca para bueiro triplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_ 07/2021	un	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	35.696,68	R\$ 0,00	R\$ 71.393,36	R\$ 71.393,36	R\$ 71.393,36	R\$ 0,00
1.6.7.9	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_ 07/2020	t	0,000	22,960	22,960	22,960	0,000	54,23	R\$ 0,00	R\$ 1.245,12	R\$ 1.245,12	R\$ 1.245,12	R\$ 0,00
1.6.7.10	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_ 07/2020	t	0,000	15,680	15,680	15,680	0,000	21,67	R\$ 0,00	R\$ 339,79	R\$ 339,79	R\$ 339,79	R\$ 0,00
1.7	DISPOSITIVOS								R\$ 32.362,67	R\$ 0,00	R\$ 32.362,67	R\$ 174.232,55	R\$ 141.869,88
1.7.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	12,600	0,000	12,600	64,850	52,250	67,91	R\$ 855,67	R\$ 0,00	R\$ 855,67	R\$ 4.403,96	R\$ 3.548,29
1.7.2	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	700,000	0,000	700,000	3.443,000	2.743,000	45,01	R\$ 31.507,00	R\$ 0,00	R\$ 31.507,00	R\$ 154.969,43	R\$ 123.462,43
1.7.3	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	m	0,000	0,000	0,000	48,000	48,000	244,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.722,08	R\$ 11.722,08
1.7.4	Apiloamento manual	m³	0,000	0,000	0,000	29,040	29,040	33,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,68	R\$ 980,68
1.7.5	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	un	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000	83,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.334,40	R\$ 1.334,40
1.7.6	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	un	0,000	0,000	0,000	8,000	8,000	102,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 822,00
1.8	FECHAMENTO DE VALAS								R\$ 0,00	R\$ 15.268,85	R\$ 15.268,85	R\$ 15.410,65	R\$ 141,80
1.8.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_ 08/2020	m²	0,000	128,700	128,700	128,800	0,100	7,59	R\$ 0,00	R\$ 976,83	R\$ 976,83	R\$ 977,59	R\$ 0,76
1.8.2	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	0,000	98,896	98,896	99,170	0,274	45,24	R\$ 0,00	R\$ 4.474,06	R\$ 4.474,06	R\$ 4.486,45	R\$ 12,39
1.8.3	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_ 08/2023	m³	0,000	75,060	75,060	75,430	0,370	31,92	R\$ 0,00	R\$ 2.395,92	R\$ 2.395,92	R\$ 2.407,73	R\$ 11,81
1.8.4	Colchão de areia	m³	0,000	34,320	34,320	34,860	0,540	159,26	R\$ 0,00	R\$ 5.465,80	R\$ 5.465,80	R\$ 5.551,80	R\$ 86,00
1.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_ 07/2020	tkm	0,000	1.956,240	1.956,240	1.987,080	30,840	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.956,24	R\$ 1.956,24	R\$ 1.987,08	R\$ 30,84

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025

MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO PARCIAL


CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

PERÍODO: 01/04/2026 A 31/05/2026

R\$ 1.687.205,31

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					UNITÁRIO	VALORES EM R\$				
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO		EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO								R\$ 1.687.205,31	R\$ 8.690.492,71	R\$ 10.377.696,02	R\$ 12.714.716,00	R\$ 2.337.017,98
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 0,00	R\$ 190.504,35	R\$ 190.504,35	R\$ 190.504,35	R\$ 0,00
1.9.1	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	0,000	6,000	6,000	6,000	0,000	280,60	R\$ 0,00	R\$ 1.683,60	R\$ 1.683,60	R\$ 1.683,60	R\$ 0,00
1.9.2	Rip-Rap - saco solo cimento, com capacidade para 0,07m³ de material adensado, nas dimensões aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento, inclusive fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e transp	un	0,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	0,000	32,03	R\$ 0,00	R\$ 96.090,00	R\$ 96.090,00	R\$ 96.090,00	R\$ 0,00
1.9.3	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno. af. 11/2014	chp	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	271,78	R\$ 0,00	R\$ 59.791,60	R\$ 59.791,60	R\$ 59.791,60	R\$ 0,00
1.9.4	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diurno. af. 11/2014	chi	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	136,98	R\$ 0,00	R\$ 30.135,60	R\$ 30.135,60	R\$ 30.135,60	R\$ 0,00
1.9.5	Passadiço de madeira	m²	0,000	15,750	15,750	15,750	0,000	99,71	R\$ 0,00	R\$ 1.570,43	R\$ 1.570,43	R\$ 1.570,43	R\$ 0,00
1.9.6	Passadiço metálico	m²	0,000	10,500	10,500	10,500	0,000	117,44	R\$ 0,00	R\$ 1.233,12	R\$ 1.233,12	R\$ 1.233,12	R\$ 0,00
1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 108.539,20	R\$ 162.808,80	R\$ 271.348,00	R\$ 542.696,00	R\$ 271.348,00
1.10.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	440,000	660,000	1.100,000	2.200,000	1.100,000	156,23	R\$ 68.741,20	R\$ 103.111,80	R\$ 171.853,00	R\$ 343.706,00	R\$ 171.853,00
1.10.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	440,000	660,000	1.100,000	2.200,000	1.100,000	38,05	R\$ 16.742,00	R\$ 25.113,00	R\$ 41.855,00	R\$ 83.710,00	R\$ 41.855,00
1.10.3	Almoxarife com encargos complementares	h	440,000	660,000	1.100,000	2.200,000	1.100,000	26,22	R\$ 11.536,80	R\$ 17.305,20	R\$ 28.842,00	R\$ 57.684,00	R\$ 28.842,00
1.10.4	Vigia diurno com encargos complementares	h	440,000	660,000	1.100,000	2.200,000	1.100,000	26,18	R\$ 11.519,20	R\$ 17.278,80	R\$ 28.798,00	R\$ 57.596,00	R\$ 28.798,00
VALOR									R\$ 1.687.205,31	R\$ 8.690.492,71	R\$ 10.377.696,02	R\$ 12.714.716,00	R\$ 2.337.017,98


Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056


Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.1.1.2 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 5,00	mês	5,000
		mês	5,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	3,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	2,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026			
PREFEITURA DE ITABAIANA		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.1.1.3 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 5,00	mês	5,000
		mês	5,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	3,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	2,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 270288205F			
DATA: 13/7/2026			
PREFEITURA DE ITABAIANA		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722432437
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO PARCIAL		PERÍODO 01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.1.1.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 5 00	mês	5 000
		mês	5,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	3,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	2,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ron Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 771894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.1.1.6 Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 5.00	mês	5,000
		mês	5,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	3,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	2,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026			
PREFEITURA DE ITABAIANA		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.2.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis			
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO			

ESTACAS						DIMENSÕES			UNID.	QUANT.	
2	+	13,00	A	60	+	0,00	Comp	x	Larg		
							1 147,00	x	10,20	m2	11 699,400
60	+	0,00	A	245	+	0,00	3 700,00	x	10,20	m2	37 740,000
										m2	49.439,400
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR										m2	37.000,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO										m2	12.439,400


Paulo Silva Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA n° 2702882056

DATA: 13/7/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA DE ITABAIANA	
CONTRATO: 427 / 2025	

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PE DO VEADO


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



John Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
4ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/04/2026 A 31/05/2026
CONTRATADA:	
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	
SERVIÇO: 1.2.2 Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO	

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
133 + 3.00 A 245 + 0.00	Comp x Larg. Média x Esp. Média 2 237,00 x 10,20 x 0,65	m³	14.831,310
		m³	14.831,310
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	11.100,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	3.731,310


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056

DATA: 13/7/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA DE ITABAIANA	
CONTRATO: 427 / 2025 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO	



Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennen Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
4ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/04/2026 A 31/05/2026
CONTRATADA:	
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	

SERVIÇO: 1.2.3 Carga mecânica de material de 1ª categoria
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO


ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Vol. 1.2.2 x Emp. 14 831,31 x 1,30	m³	19 280,703
		m³	19.280,703
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	14.430,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	4.850,703


Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056


DATA: 13/7/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA DE ITABAIANA	
CONTRATO: 427 / 2025 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÊ DO VEADO	


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Leon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO PARCIAL					PERÍODO: 01/04/2026 A 31/05/2026		
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda							
SERVIÇO: 1.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020							
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO							
ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Carga 1.2.3	x	Dens	x	Dmt		
	19.280 70	x	1,50	x	15,00	tkm	433.815,818
						txkm	433.815,818
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					txkm	324.675,000
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					txkm	109.140,817
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056							
DATA: 13/7/2026					CÁLCULO EXPLICATIVO		
PREFEITURA DE ITABAIANA							
CONTRATO: 427 / 2025							
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO							



Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO										PERÍODO:			
4ª MEDIÇÃO PARCIAL										01/04/2026 A 31/05/2026			
CONTRATADA:													
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda													
SERVIÇO 1.2.6 Reforço do sub-leito													
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO													
ESTACAS						DIMENSÕES				UNID.	QUANT.		
TRECHO						Comp	x	Larg	x	Esp			
0	+	0.00	A	50	+	0.00	1.000,00	x	9,00	x	0,21	m3	1.890,000
50	+	0.00	A	60	+	0.00	200,00	x	10,20	x	0,21	m3	428,400
60	+	0.00	A	245	+	0.00	3.700,00	x	10,20	x	0,21	m3	7.925,400
												m³	10.243,800
						A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						m³	7.925,400
						TOTAL DESTA MEDIÇÃO						m³	2.318,400
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056													
DATA: 13/7/2026										CÁLCULO EXPLICATIVO			
PREFEITURA DE ITABAIANA													
CONTRATO: 427 / 2025													
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO													



Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721594692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO										PERÍODO		
4ª MEDIÇÃO PARCIAL										01/04/2026 A 31/05/2026		
CONTRATADA												
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda												
SERVIÇO 1.2.7 Colchão de areia												
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO												
ESTACAS						DIMENSÕES				UNID.	QUANT.	
TRECHO						Comp	x	Larg Média	x	Esp		
0	+	0,00	A	50	+ 0,00	1 000,00	x	9,00	x	0,09	m3	810,000
50	+	0,00	A	60	+ 0,00	200,00	x	10,20	x	0,09	m3	183,600
60	+	0,00	A	245	+ 0,00	3 700,00	x	10,20	x	0,09	m3	3 396,600
											m³	4.390,200
						A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					m³	3.396,600
						TOTAL DESTA MEDIÇÃO					m³	993,600
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA n° 2702882056												
DATA: 13/7/2026										CÁLCULO EXPLICATIVO		
PREFEITURA DE ITABAIANA												
CONTRATO: 427 / 2025												
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PE DO VEADO												


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.2.8 Carga mecânica de material de 1ª categoria			
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Volume		
Reforço 1.2.6	10 243,80	m³	10 243,800
Colchão de Areia 1.2.7	4 390,20	m³	4 390,200
		m³	14.634,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	11.322,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	3.312,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO			PERÍODO			
4ª MEDIÇÃO PARCIAL			01/04/2026 A 31/05/2026			
CONTRATADA						
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda						
SERVIÇO 1.2.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020						
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO						
ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.	
	Carga 1.2.8	x	Dens	x	Dmt	
	14 634.00	x	1,50	x	30,00	
					tkm	658.530,000
					txkm	658.530,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					txkm	509.490,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO					txkm	149.040,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA n° 2702882056						
DATA: 13/7/2026						
PREFEITURA DE ITABAIANA			CÁLCULO EXPLICATIVO			
CONTRATO: 427 / 2025						
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO AO POVOADO PE DO VEADO						


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.2.10 Argila para Aterro - (Jazida FFM - Santo Amaro das Brotas)			
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Vol 1.2.13 x Emp 14 634,00 x 1,300	m³	19.024,196
		m³	19.024,196
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	m³	14.718,598
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	4.305,598
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA n° 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ron Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2221894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO		PERÍODO		
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026		
CONTRATADA				
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda				
SERVIÇO 1.2.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020				
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO				
ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	1.2.10 Carga x	Dens x	Dmt	
	19 024.20 x	1.500 x	30.00	tkm
				856.088,838
			txkm	856.088,838
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		txkm	662.336,954
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO		txkm	193.751,883
Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056				
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO		
PREFEITURA DE ITABAIANA				
CONTRATO: 427 / 2025				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO				


Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 7721894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


MEDICÃO		PERÍODO	01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda				
SERVIÇO	1.2.12 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024			
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO				
ESTACAS		DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
		1.2.13 Compact		
0	+ 0,00 a 245 + 0,00	14 634,00	m³	14 633,997
			m³	14.633,997
		A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	m³	11.321,998
		TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	3.311,998
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056				
DATA:		13/7/2026		
PREFEITURA DE ITABAIANA		CÁLCULO EXPLICATIVO		
CONTRATO: 427 / 2025				
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO				


Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 270288/2056


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Ipatinga


MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO PARCIAL		PERÍODO 01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.3.1.1.2 Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
55 + 0,00 a 245 + 0,00	Vol 1.3.1.1.1 x % 5 172,75 x 0,60	m³	3 103,650
		m³	3.103,650
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	3.021,98
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	81,675
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO PARCIAL		PERÍODO 01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.3.1.1.3 Carga mecânica de material de 1ª categoria			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS	DIMENSÕES		UNID. QUANT.
55 + 0,00 a 245 + 0,00	Vol 1.3.1.1.1 x 5 172,75 x	Dens 1,30	m³ 6 724,575
			m³ 6.724,575
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			m³ 6.547,61
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			m³ 176,963
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA n° 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO			PERÍODO			
4ª MEDIÇÃO PARCIAL			01/04/2026 A 31/05/2026			
CONTRATADA						
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda						
SERVIÇO 1.3.1.1.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020						
1.3 PAVIMENTAÇÃO						
ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.	
	Carga 1.3.1.1.3	x	Dens	x	Dmt	
	6.724,58	x	1,50	x	30,00	
					tkm	302.605,875
					txkm	302.605,875
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR					txkm	294.642,54
TOTAL DESTA MEDIÇÃO					txkm	7.963,335
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056						
DATA: 13/7/2026						
PREFEITURA DE ITABAIANA			CÁLCULO EXPLICATIVO			
CONTRATO: 427 / 2025						
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO						


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO PARCIAL	PERÍODO: 01/04/2026 A 31/05/2026
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	
SERVIÇO: 1.3.1.2.2 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	
1.3 PAVIMENTAÇÃO	

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	1.3.1.2.1 Base x Dens		
68 + 0,00 a 245 + 0,00	4.579,88 X 1,40	m³	6.411,825
		m³	-
		m³	-
		m³	-
		m³	-
		m³	6.411,825
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	5.433,75
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	978,075


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056

DATA: 13/7/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA DE ITABAIANA	

MEDIÇÃO:		PERÍODO:	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS		DIMENSÕES	
TRECHO		UNID.	
QUANT.			
68	+	0,00	a
245	+	0,00	
1.3.1.2.2 Carga x		Dens	x Dmt
4.579,88 x		2,20	x 30,00
		txkm	302.271,750
		txkm	302.271,750
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		txkm	256.162,50
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		txkm	46.109,250
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026			
PREFEITURA DE ITABAIANA		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
4ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/04/2026 A 31/05/2026
CONTRATADA:	
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	

SERVIÇO: 1.3.1.3.1 Locação de serviços de pavimentação

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS							DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg		
68	+	0,00	a	95	+	0,00	540,00	x	8,00	m2	4.320,000
95	+	0,00	a	245	+	0,00	3.000,00	x	8,00	m2	24.000,000
										m2	28.320,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR										m²	24.000,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO										m2	4.320,000



Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

DATA: 13/7/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482437
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:		PERÍODO:	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.3.2 Imprimação - execução com fornecimento de material			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS		DIMENSÕES	UNID.
TRECHO		Comp x Larg	QUANT.
68	+ 0,00 a 95 + 0,00	540,00 x 8,40	m2 4.536,000
95	+ 0,00 a 245 + 0,00	3.000,00 x 8,40	m2 25.200,000
			m2 29.736,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			m2 25.200,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			m2 4.536,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

DATA: 13/7/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thon Lennon
Thon Lennon Soares Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO PARCIAL	PERÍODO: 01/04/2026 A 31/05/2026
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	


SERVIÇO: 1.3.1.3.3 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS							DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
TRECHO							Comp	x	Larg	x	Veze		
68	+	0.00	a	95	+	0.00	540.00	x	8.00	x	2.00	m2	8.640.000
95	+	0.00	a	245	+	0.00	3.000.00	x	8.00	x	2.00	m2	48.000.000
												m2	56.640.000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR												m2	48.000,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO												m2	8.640,000



Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056


Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA n.º 2702882056


DATA: 13/7/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ron Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:		PERÍODO:	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.3.4 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte.			
af_11/2019			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS		DIMENSÕES	
TRECHO		UNID.	
QUANT.			
68	+	0,00	a
95	+	0,00	a
245	+	0,00	
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m3	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m3	

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA n.º 2702882056

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Abon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO: 4º MEDIÇÃO PARCIAL		PERÍODO: 01/04/2026 A 31/05/2026
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda		
SERVIÇO: 1.3.1.3.5 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora		
1.3 PAVIMENTAÇÃO		
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID. QUANT.
TRECHO	1.3.1.3.4 CAUQ x Dens	
68 + 0,00 a 245 + 0,00	1.416,00 x 2,40	t 3.398,400
		t 3.398,400
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		t 2.880,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		t 518,40
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056		
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA DE ITABAIANA		
CONTRATO: 427 / 2025		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO		

MEDIÇÃO:		PERÍODO:	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.3.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.
TRECHO	1.3.1.3.5 Carga x	Dmt	QUANT.
68 + 0,00 a 245 + 0,00	3.398,40	30,00	101.952,000
		txkm	101.952,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		txkm	86.400,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		txkm	15.552,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PE DO VEADO		 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722462487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
4ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/04/2026 A 31/05/2026
CONTRATADA:	
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	

SERVIÇO: 1.3.1.3.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	1.3.1.3.5 Carga x		
68 + 0,00 a 245 + 0,00	3.398,40	Dmt	101.952,000
		30,00	
		txkm	101.952,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		txkm	86.400,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		txkm	15.552,000


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056

DATA:	13/7/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO 
PREFEITURA DE ITABAIANA		
CONTRATO: 427 / 2025		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO		


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:		PERÍODO:					
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026					
CONTRATADA:							
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda							
SERVIÇO: 1.7.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							
1.7 DISPOSITIVOS							
ESTACAS	DIMENSÕES				UNID.	QUANT.	
	Comp	X	Larg	x	Esp		
1.7.2 MEIO FIO	700,00	x	0,12	x	0,15	m3	12,600
1.7.3 DAR 40-20	0,00	x	0,40	x	0,20	m3	-
						m³	12,600
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						m³	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						m³	12,600
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA n.º 2702882056							
DATA: 13/7/2026							
PREFEITURA DE ITABAIANA		CÁLCULO EXPLICATIVO					
CONTRATO: 427 / 2025							
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO							


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Mafra

MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.10.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares			
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ESTACAS	DIMENSÕES		UNID. QUANT.
	h	mês	h/mês
Contrato	2 200,00	/	10,00 = 220,00
	h/mês	x	mês
Execução	220,00	x	5,00
			h 1 100,00
			h 1.100,00
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			h 660,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			h 440,00
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDICÃO	PERÍODO		
4ª MEDICÃO PARCIAL	01/04/2026 A 31/05/2026		
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO	1.10.2 Encarregado geral com encargos complementares		
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	h mês h/mês		
Contrato	2.200,00 / 10,00 = 220,00		
	h/mês x mês		
Execução	220,00 x 5,00	h	1.100,00
		h	1.100,00
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		h	660,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		h	440,00
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA:	13/7/2026		
PREFEITURA DE ITABAIANA	CÁLCULO EXPLICATIVO		
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Tabala

MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.10.3 Almojarife com encargos complementares			
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ESTACAS	DIMENSÕES		UNID. QUANT.
	h	mês	h/mês
Contrato	2.200,00	/	10,00 = 220,00
	h/mês	x	mês
Execução	220,00	x	5,00
			h 1.100,00
			h 1.100,00
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			h 660,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			h 440,00
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO		PERÍODO	
4ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/04/2026 A 31/05/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.10.4 Vigia diurno com encargos complementares			
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ESTACAS	DIMENSÕES		UNID. QUANT.
	h	mês	h/mês
Contrato	2 200,00	/	10,00 = 220,00
	h/mês	x	mês
Execução	220,00	x	5,00
			h 1.100,00
			h 1.100,00
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			h 660,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			h 440,00
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056			
DATA: 13/7/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722452487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Hon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RELATÓRIO

FOTOGRÁFICO

04ª MEDIÇÃO (MAIO / 2026)

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

RODOVIA: ACESSO

TRECHO: ACESSO AO PÉ DO VEADO

EXTENSÃO: APROXIMADAMENTE 5 KM

CONTRATO: 427 / 2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

04ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2026 A 31/05/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca Estaca

CONTÊINER / CANTEIRO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

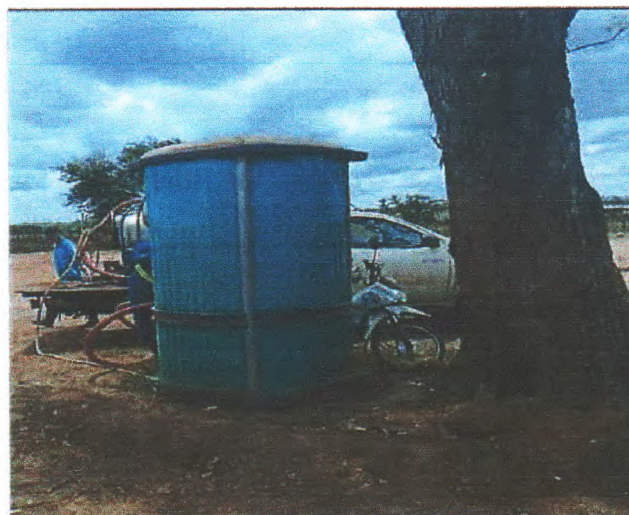
Estaca Estaca

CONTÊINER / CANTEIRO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca Estaca

BANHEIRO QUIMICO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca Estaca

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

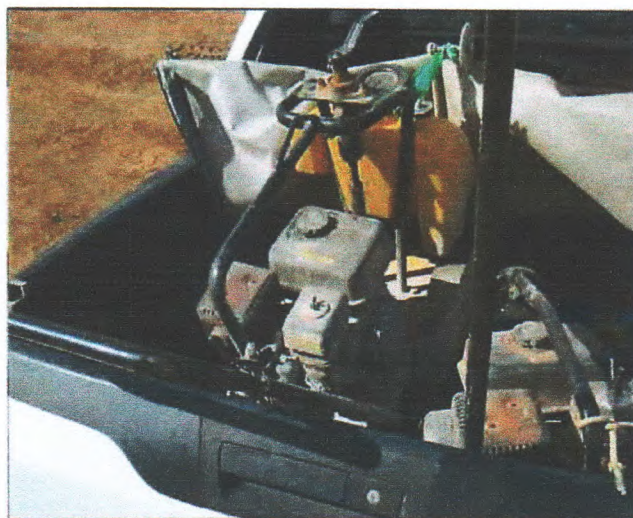
Paulo
Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

Ihon
Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025


04ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2026 A 31/05/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO
Estaca	Estaca	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Estaca	Estaca	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
COORDENADAS:			COORDENADAS:		
LATITUDE:			LATITUDE:		
LONGITUDE:			LONGITUDE:		



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:
Estaca	Estaca	ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA	Estaca	Estaca	ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA
COORDENADAS:			COORDENADAS:		
LATITUDE:			LATITUDE:		
LONGITUDE:			LONGITUDE:		


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056


Thon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	04ª MEDIÇÃO
CONTRATO: 427 / 2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2026 A 31/05/2026




LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	REFORÇO SUBLEITO	Estaca Estaca	REFORÇO SUBLEITO
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	COMPACTAÇÃO	Estaca Estaca	ARGILA PARA ATERRO
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056


Ithon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2741894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

04ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2026 A 31/05/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PE DO VEADO

Estaca Estaca

SERVIÇO:

SUB-BASE (SOLO / BRITA)



LOCALIZAÇÃO: POV. PE DO VEADO

Estaca Estaca

SERVIÇO:

BASE BRITA

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:



LOCALIZAÇÃO: POV. PE DO VEADO

Estaca Estaca

SERVIÇO:

IMPRIMAÇÃO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:



LOCALIZAÇÃO: POV. PE DO VEADO

Estaca Estaca

SERVIÇO:


IMPRIMAÇÃO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056


Ithon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	04ª MEDIÇÃO
CONTRATO: 427 / 2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2026 A 31/05/2026




LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	PINTURA DE LIGAÇÃO	Estaca Estaca	CAUQ
LATITUDE:		COORDENADAS:	
LONGITUDE:		LATITUDE:	
		LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	CAUQ	Estaca Estaca	CAUQ
COORDENADAS		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056


Ithon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

04ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2026 A 31/05/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PE DO VEADO

Estaca Estaca

SERVIÇO:

MFC-05

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

Estaca Estaca

SERVIÇO:

MFC-05

LATITUDE:
LONGITUDE:

COORDENADAS:
LATITUDE:
LONGITUDE:


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056


Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
