



| Obra:       |                                                                                                                                                                    | Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            | CONTRATO Nº: 391/2025       |               |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Contratada: |                                                                                                                                                                    | D&C CONSTRUTORA LTDA                                                                                           |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 04                       |               |                    |            | Data da medição: 12/05/2026 |               |          |
| CNPJ:       |                                                                                                                                                                    | 04.460.699/0001-23                                                                                             |             |                    |            |                         |               | Período: 25/04/2026 à 12/05/2026 |               |                    |            |                             |               |          |
| Item        | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                         | Und                                                                                                            | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                             |               | % Medido |
|             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 01          | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO                                                                                                                                      |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 9.080,34      | 9.080,34           | 0,00       | 9.080,34                    | 0,00          | 100,00%  |
| 01.001      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                              |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 9.080,34      | 9.080,34           | 0,00       | 9.080,34                    | 0,00          |          |
| 01.001.001  | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                 | m2                                                                                                             | 12,00       | 12,00              |            | 12,00                   | 0,00          | 366,63                           | 4.399,56      | 4.399,56           | 0,00       | 4.399,56                    | 0,00          | 100,00%  |
| 01.001.002  | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                                                   | mês                                                                                                            | 6,00        | 6,00               |            | 6,00                    | 0,00          | 780,13                           | 4.680,78      | 4.680,78           | 0,00       | 4.680,78                    | 0,00          | 100,00%  |
| 02          | TRECHO 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 986.940,05    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 986.940,05    | 0,00%    |
| 02.001      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                              |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 46.631,49     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 46.631,49     |          |
| 02.001.001  | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                | m2                                                                                                             | 6.246,67    |                    |            | 0,00                    | 6.246,67      | 1,64                             | 10.244,54     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 10.244,54     | 0,00%    |
| 02.001.002  | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024                                     | m2                                                                                                             | 6.246,67    |                    |            | 0,00                    | 6.246,67      | 2,41                             | 15.054,47     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 15.054,47     | 0,00%    |
| 02.001.003  | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                                                                         | m3                                                                                                             | 624,67      |                    |            | 0,00                    | 624,67        | 1,21                             | 755,85        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 755,85        |          |
| 02.001.004  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 16.866,09   |                    |            | 0,00                    | 16.866,09     | 1,22                             | 20.576,63     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 20.576,63     | 0,00%    |
| 02.002      | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 936.685,49    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 936.685,49    | 0,00%    |
| 02.002.001  | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2                                                                                                             | 6.246,67    |                    |            | 0,00                    | 6.246,67      | 106,01                           | 662.209,49    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 662.209,49    | 0,00%    |
| 02.002.002  | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 2.180,24    |                    |            | 0,00                    | 2.180,24      | 42,14                            | 91.875,31     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 91.875,31     | 0,00%    |
| 02.002.003  | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 59,39       |                    |            | 0,00                    | 59,39         | 42,14                            | 2.502,69      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.502,69      | 0,00%    |
| 02.002.004  | Pintura de meio fio (calação)                                                                                                                                      | m                                                                                                              | 2.239,63    |                    |            | 0,00                    | 2.239,63      | 4,81                             | 10.772,62     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 10.772,62     | 0,00%    |
| 02.002.005  | Colchão de areia                                                                                                                                                   | m3                                                                                                             | 1.061,93    |                    |            | 0,00                    | 1.061,93      | 126,51                           | 134.345,27    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 134.345,27    | 0,00%    |
| 02.002.006  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 28.672,22   |                    |            | 0,00                    | 28.672,22     | 1,22                             | 34.980,11     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 34.980,11     | 0,00%    |
| 02.003      | LIMPEZA                                                                                                                                                            |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 3.623,07      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 3.623,07      | 0,00%    |
| 02.003.001  | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                                                   | m²                                                                                                             | 6.246,67    |                    |            | 0,00                    | 6.246,67      | 0,58                             | 3.623,07      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 3.623,07      | 0,00%    |
| 03          | TRECHO 2                                                                                                                                                           |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 93.137,03     | 31.258,77          | 21.424,40  | 52.683,17                   | 40.453,86     | 56,57%   |
| 03.001      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                              |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  |               |                    |            |                             |               |          |
| 03.001.001  | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                | m2                                                                                                             | 12.476,49   | 4.209,00           | 2.786,50   | 6.995,50                | 5.480,99      | 1,64                             | 20.461,44     | 6.902,76           | 4.569,86   | 11.472,62                   | 8.988,82      | 56,07%   |
| 03.001.002  | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024                                     | m2                                                                                                             | 12.476,49   | 4.209,00           | 2.786,50   | 6.995,50                | 5.480,99      | 2,41                             | 30.068,34     | 10.143,69          | 6.715,46   | 16.859,15                   | 13.209,19     | 56,07%   |
| 03.001.003  | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                                                                         | m3                                                                                                             | 1.247,65    | 420,90             | 278,00     | 698,90                  | 548,75        | 1,21                             | 1.509,66      | 509,28             | 336,38     | 845,66                      | 664,00        | 56,02%   |
| 03.001.004  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 33.686,55   | 11.232,00          | 8.035,00   | 19.267,00               | 14.419,55     | 1,22                             | 41.097,59     | 13.703,04          | 9.802,70   | 23.505,74                   | 17.591,85     | 57,19%   |
| 03.002      | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 1.873.003,54  | 629.583,26         | 433.295,62 | 1.062.878,88                | 810.124,66    | 56,75%   |
| 03.002.001  | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2                                                                                                             | 12.476,49   | 4.209,00           | 2.786,50   | 6.995,50                | 5.480,99      | 106,01                           | 1.322.632,70  | 446.196,09         | 295.396,86 | 741.592,95                  | 581.039,75    | 56,07%   |
| 03.002.002  | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 4.444,26    | 1.481,83           | 958,00     | 2.439,83                | 2.004,43      | 42,14                            | 187.281,12    | 62.444,31          | 40.370,12  | 102.814,43                  | 84.466,69     | 54,90%   |
| 03.002.003  | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 74,95       | 24,97              | 29,98      | 54,95                   | 20,00         | 42,14                            | 3.158,39      | 1.052,23           | 1.263,35   | 2.315,58                    | 842,81        | 73,32%   |
| 03.002.004  | Pintura de meio fio (calação)                                                                                                                                      | m                                                                                                              | 4.519,21    | 1.481,83           | 958,00     | 2.439,83                | 2.079,38      | 4,81                             | 21.737,40     | 7.127,60           | 4.607,98   | 11.735,58                   | 10.001,82     | 53,99%   |
| 03.002.005  | Colchão de areia                                                                                                                                                   | m3                                                                                                             | 2.121,00    | 707,20             | 597,00     | 1.304,20                | 816,80        | 126,51                           | 268.328,09    | 89.467,87          | 75.526,47  | 164.994,34                  | 103.333,75    | 61,49%   |
| 03.002.006  | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 57.267,08   | 19.094,40          | 13.222,00  | 32.316,40               | 24.950,68     | 1,22                             | 69.865,84     | 23.295,16          | 16.130,84  | 39.426,00                   | 30.439,84     | 56,43%   |
| 03.003      | LIMPEZA                                                                                                                                                            |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 7.236,36      | 2.441,22           | 1.616,17   | 4.057,39                    | 3.178,97      | 56,07%   |
| 03.003.001  | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                                                   | m²                                                                                                             | 12.476,49   | 4.209,00           | 2.786,50   | 6.995,50                | 5.480,99      | 0,58                             | 7.236,36      | 2.441,22           | 1.616,17   | 4.057,39                    | 3.178,97      | 56,07%   |
| 04          | TRECHO 3                                                                                                                                                           |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 285.991,69    | 285.991,67         | 0,00       | 285.991,67                  | 0,02          | 100,00%  |
| 04.001      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                              |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 13.287,70     | 13.287,70          | 0,00       | 13.287,70                   | 0,00          | 100,00%  |

Non Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo


| Obra:                                                                             |                                                                                                                                                                    | Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                          |                    |            | CONTRATO Nº: 391/2025       |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Contratada:                                                                       |                                                                                                                                                                    | D&C CONSTRUTORA LTDA                                                                                           |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 04                       |                          |                    |            | Data da medição: 12/05/2026 |               |          |
| CNPJ:                                                                             |                                                                                                                                                                    | 04.460.699/0001-23                                                                                             |             |                    |            |                         |               | Período: 25/04/2026 à 12/05/2026 |                          |                    |            |                             |               |          |
| Item                                                                              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                         | Und                                                                                                            | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$)            |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado               | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 04.001.001                                                                        | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                | m2                                                                                                             | 1.780,00    | 1.780,00           |            | 1.780,00                | 0,00          | 1,64                             | 2.919,20                 | 2.919,20           | 0,00       | 2.919,20                    | 0,00          | 100,00%  |
| 04.001.002                                                                        | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024                                     | m2                                                                                                             | 1.780,00    | 1.780,00           |            | 1.780,00                | 0,00          | 2,41                             | 4.289,80                 | 4.289,80           | 0,00       | 4.289,80                    | 0,00          | 100,00%  |
| 04.001.003                                                                        | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                                                                         | m3                                                                                                             | 178,00      | 178,00             |            | 178,00                  | 0,00          | 1,21                             | 215,38                   | 215,38             | 0,00       | 215,38                      | 0,00          | 100,00%  |
| 04.001.004                                                                        | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 4.806,00    | 4.806,00           |            | 4.806,00                | 0,00          | 1,22                             | 5.863,32                 | 5.863,32           | 0,00       | 5.863,32                    | 0,00          | 100,00%  |
| 04.002                                                                            | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 271.671,59               | 271.671,57         | 0,00       | 271.671,57                  | 0,02          | 100,00%  |
| 04.002.001                                                                        | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 734,60      | 734,60             |            | 734,60                  | 0,00          | 42,14                            | 30.956,04                | 30.956,04          | 0,00       | 30.956,04                   | 0,00          | 100,00%  |
| 04.002.002                                                                        | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 5,00        | 5,00               |            | 5,00                    | 0,00          | 42,14                            | 210,70                   | 210,70             | 0,00       | 210,70                      | 0,00          | 100,00%  |
| 04.002.003                                                                        | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2                                                                                                             | 1.780,00    | 1.780,00           |            | 1.780,00                | 0,00          | 106,01                           | 188.697,80               | 188.697,80         | 0,00       | 188.697,80                  | 0,00          | 100,00%  |
| 04.002.004                                                                        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m                                                                                                              | 739,60      | 739,60             |            | 739,60                  | 0,00          | 4,81                             | 3.557,48                 | 3.557,47           | 0,00       | 3.557,47                    | 0,01          | 100,00%  |
| 04.002.005                                                                        | Colchão de areia                                                                                                                                                   | m3                                                                                                             | 302,60      | 302,60             |            | 302,60                  | 0,00          | 126,51                           | 38.281,93                | 38.281,92          | 0,00       | 38.281,92                   | 0,01          | 100,00%  |
| 04.002.006                                                                        | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 8.170,20    | 8.170,20           |            | 8.170,20                | 0,00          | 1,22                             | 9.967,64                 | 9.967,64           | 0,00       | 9.967,64                    | 0,00          | 100,00%  |
| 04.003                                                                            | LIMPEZA                                                                                                                                                            |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 1.032,40                 | 1.032,40           | 0,00       | 1.032,40                    | 0,00          | 100,00%  |
| 04.003.001                                                                        | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                                                   | m²                                                                                                             | 1.780,00    | 1.780,00           |            | 1.780,00                | 0,00          | 0,58                             | 1.032,40                 | 1.032,40           | 0,00       | 1.032,40                    | 0,00          | 100,00%  |
| 05                                                                                | TRECHO 4                                                                                                                                                           |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 1.058.059,05             | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.058.059,05  | 0,00%    |
| 05.001                                                                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                              |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 50.831,59                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 50.831,59     | 0,00%    |
| 05.001.001                                                                        | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                | m2                                                                                                             | 6.809,34    |                    |            | 0,00                    | 6.809,34      | 1,64                             | 11.167,32                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 11.167,32     | 0,00%    |
| 05.001.002                                                                        | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024                                     | m2                                                                                                             | 6.809,34    |                    |            | 0,00                    | 6.809,34      | 2,41                             | 16.410,51                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 16.410,51     | 0,00%    |
| 05.001.003                                                                        | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                                                                         | m3                                                                                                             | 680,93      |                    |            | 0,00                    | 680,93        | 1,21                             | 823,93                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 823,93        | 0,00%    |
| 05.001.004                                                                        | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 18.385,11   |                    |            | 0,00                    | 18.385,11     | 1,22                             | 22.429,83                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 22.429,83     | 0,00%    |
| 05.002                                                                            | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 1.003.278,04             | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.003.278,04  | 0,00%    |
| 05.002.001                                                                        | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2                                                                                                             | 6.809,34    |                    |            | 0,00                    | 6.809,34      | 106,01                           | 721.858,13               | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 721.858,13    | 0,00%    |
| 05.002.002                                                                        | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 2.050,70    |                    |            | 0,00                    | 2.050,70      | 42,14                            | 86.416,50                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 86.416,50     | 0,00%    |
| 05.002.003                                                                        | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m                                                                                                              | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00         | 42,14                            | 505,68                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 505,68        | 0,00%    |
| 05.002.004                                                                        | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m                                                                                                              | 2.062,70    |                    |            | 0,00                    | 2.062,70      | 4,81                             | 9.921,59                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 9.921,59      | 0,00%    |
| 05.002.005                                                                        | Colchão de areia                                                                                                                                                   | m3                                                                                                             | 1.157,58    |                    |            | 0,00                    | 1.157,58      | 126,51                           | 146.445,45               | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 146.445,45    | 0,00%    |
| 05.002.006                                                                        | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm                                                                                                            | 31.254,66   |                    |            | 0,00                    | 31.254,66     | 1,22                             | 38.130,69                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 38.130,69     | 0,00%    |
| 05.003                                                                            | LIMPEZA                                                                                                                                                            |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 3.949,42                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 3.949,42      | 0,00%    |
| 05.003.001                                                                        | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                                                   | m²                                                                                                             | 6.809,34    |                    |            | 0,00                    | 6.809,34      | 0,58                             | 3.949,42                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 3.949,42      | 0,00%    |
| 06                                                                                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 101.372,04               | 22.007,85          | 10.482,47  | 32.490,32                   | 68.881,72     | 32,05%   |
| 06.001                                                                            | EQUIPE DIRIGENTE                                                                                                                                                   |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 101.372,04               | 22.007,85          | 10.482,47  | 32.490,32                   | 68.881,72     | 32,05%   |
| 06.001.001                                                                        | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                        | h                                                                                                              | 378,00      | 82,07              | 39,09      | 121,16                  | 256,84        | 131,94                           | 49.873,32                | 10.827,49          | 5.157,53   | 15.985,02                   | 33.888,30     | 32,05%   |
| 06.001.002                                                                        | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                        | h                                                                                                              | 756,00      | 164,13             | 78,17      | 242,30                  | 513,70        | 68,12                            | 51.498,72                | 11.180,36          | 5.324,94   | 16.505,30                   | 34.993,42     | 32,05%   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 4.414.820,10             | 980.363,10         | 466.818,66 | 1.447.181,76                | 2.967.638,34  | 32,78%   |
| PERCENTUAL                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | 100,00%                  | 22,21%             | 10,57%     | 32,78%                      | 67,22%        |          |
| ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |             |                    |            |                         |               |                                  | /Hon Lennoh Gomes Santos |                    |            |                             |               |          |

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA

  
 Ihon Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |                                                                                   |                    |                                  |                         |                             |            |                    |            |                         |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| Obra:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE |     |  |                    | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                         | CONTRATO Nº: 391/2025       |            |                    |            |                         |               |          |
| Contratada:                                                                                                                                                                                                                                                               | D&C CONSTRUTORA LTDA                                                                                           |     |                                                                                   |                    | B.M. Nº: 04                      |                         | Data da medição: 12/05/2026 |            |                    |            |                         |               |          |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04.460.699/0001-23                                                                                             |     |                                                                                   |                    | Período: 25/04/2026 à 12/05/2026 |                         |                             |            |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                     | Und | Quantidades                                                                       |                    |                                  | Preço Unit. (R\$)       | Valores (R\$)               |            |                    | % Medido   |                         |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     | Contratada                                                                        | Acumulada Anterior | Do Período                       | Acumulada até o Período | Saldo a medir               | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
|  <b>LEANDRO DE ASSIS FERREIRA</b><br>Documento assinado digitalmente<br>Data: 22/05/2026 10:08:04-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a> |                                                                                                                |     | DATA: ____ / ____ / ____                                                          |                    |                                  |                         | VALOR DA MEDIÇÃO:           |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |                                                                                   |                    |                                  |                         | R\$ 466.818,66              |            |                    |            |                         |               |          |
| IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |     |                                                                                   |                    |                                  |                         |                             |            |                    |            |                         |               |          |

  
**John Lennon Gomes Santos**  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**João Vitor Reis dos Santos**  
 Eng. Civil CREA - 272335922-0  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



**D&C CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23

**Objeto:**

Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE

**Contratada:**

D&C CONSTRUTORA LTDA

**Contratante:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 391/2025**

**B.M.Nº: 04**

Período: 25/04/2026 a 12/05/2026

Data da medição: 12/05/2026

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

| ITEM          | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                               | UND | QTD      | MEMÓRIA DE CÁLCULO |        |         |           |      |          |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------|---------|-----------|------|----------|----------|
|               |                                                                                                                                                                    |     |          | COMP.              | ALTURA | LARGURA | PERÍMETRO | ÁREA | UNIDADE  | TOTAL    |
| <b>03</b>     | <b>TRECHO 2</b>                                                                                                                                                    |     |          |                    |        |         |           |      |          |          |
| <b>03.001</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                       |     |          |                    |        |         |           |      |          |          |
| 03.001.001    | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                | m2  | 2.786,50 | 575,75             |        | 4,84    |           |      |          | 2.786,50 |
| 03.001.002    | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024                                     | m2  | 2.786,50 | 575,75             |        | 4,84    |           |      |          | 2.786,50 |
| 03.001.003    | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                                                                         | m3  | 278,00   | 575,75             | 0,10   | 4,84    |           |      |          | 278,00   |
| 03.001.004    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                        | tkm | 8.035,00 |                    |        |         |           |      | 8.035,00 | 8.035,00 |
| <b>03.002</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                |     |          |                    |        |         |           |      |          |          |
| 03.002.001    | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2  | 2.786,50 | 575,75             |        | 4,84    |           |      |          | 2.786,50 |
| 03.002.002    | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m   | 958,00   | 958,00             |        |         |           |      |          | 958,00   |
| 03.002.003    | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3              | m   | 29,98    | 29,98              |        |         |           |      |          | 29,98    |
| 03.002.004    | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                      | m   | 958,00   | 958,00             |        |         |           |      |          | 958,00   |
| 03.002.005    | Colchão de areia                                                                                                                                                   | m3  | 597,00   | 725,57             | 0,17   | 4,84    |           |      |          | 597,00   |

João Vitor Reis dos Santos  
Eng. Civil CREA - 272335922-4  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                               |        |  |      |  |  |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|--|--|-----------|------------------|
| 03.002.006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup> | tkm            | 13.222,00                                                                                                                     |        |  |      |  |  | 13.222,00 | <b>13.222,00</b> |
| <b>03.003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>LIMPEZA</b>                                                                                                                       |                |                                                                                                                               |        |  |      |  |  |           |                  |
| 03.003.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.786,50                                                                                                                      | 575,75 |  | 4,84 |  |  |           | <b>2.786,50</b>  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                           |                |                                                                                                                               |        |  |      |  |  |           |                  |
| <b>06.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EQUIPE DIRIGENTE</b>                                                                                                              |                |                                                                                                                               |        |  |      |  |  |           |                  |
| 06.001.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                          | h              | 39,09                                                                                                                         |        |  |      |  |  | 39,09     | <b>39,09</b>     |
| 06.001.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                          | h              | 78,17                                                                                                                         |        |  |      |  |  | 78,17     | <b>78,17</b>     |
| <p>D&amp;C CONSTRUTORA LTDA</p> <p>Documento assinado digitalmente</p> <p> <b>LEANDRO DE ASSIS FERREIRA</b></p> <p>Data: 14/05/2026 10:31:30-0300</p> <p>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p> |                                                                                                                                      |                | <p>ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.</p> <p>DATA:</p> |        |  |      |  |  |           |                  |

João Vilger Reis dos Santos  
Eng. Civil CREA - 272335922-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabirânia

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabirânia



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 04

Ref.: Contrato 391/2025

**Objeto: Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.**

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecenas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Evaldir da Silva Ramos R.G. nº: 40.642.163-8 – SSP/SP e CPF nº: 324.302.278-94, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição nº 03 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 25/04/2026 até 12/05/2026, conforme Boletim de Medição nº 04.**



Travessa José Mecenas Filho  
Nº46A – Centro São Domingos – se  
CEP: 49.525-000  
D&C Construtora Ltda Me  
CNPJ: 04.460.699/0001-23



79 9 9154-1021  
@deconstrutora  
deconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso  
site através  
do QR CODE



João Vitor Reis dos Santos  
Eng. Civil CREA - 272335922-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

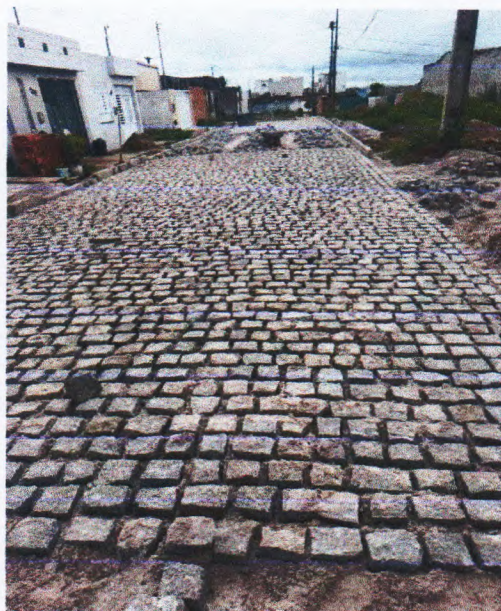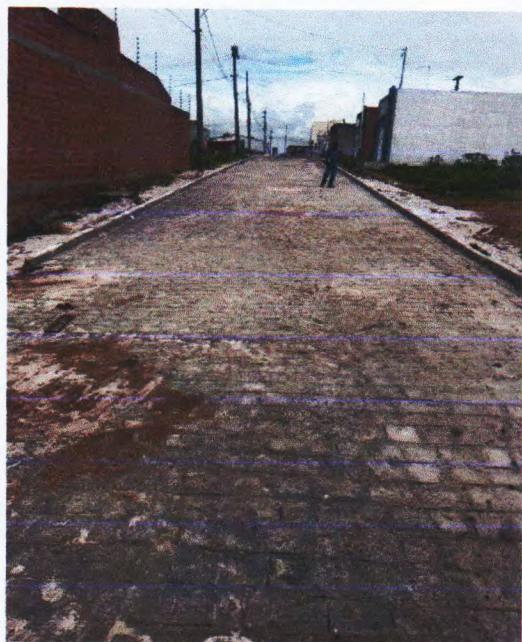

📍 Travessa José Mecnas Filho  
Nº46A - Centro São Domingos - se  
CEP: 49.525-000  
D&C Construtora Ltda Me  
CNPJ: 04.460.699/0001-23

**João Vitor Reis dos Santos**  
Eng. Civil CREA - 272335922-8  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

📞 79 9 9154-1021  
@deconstrutora  
deconstrucoesltida@gmail.com

**Jhon Lennon Gomes Santos**  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Acesse o nosso  
site através  
do QR CODE





Itabaiana/SE, em 27 de abril de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**LEANDRO DE ASSIS FERREIRA**  
Data: 14/05/2026 09:17:57-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Leandro de Assis Ferreira**  
**Engenheiro Civil CREA/SE nº 270963955-6**

*Jhon Lennon Gomes Santos*  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*João Vitor Reis dos Santos*  
Eng. Civil CREA - 272335922-8  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecnas Filho  
Nº46A - Centro São Domingos - se  
CEP: 49.525-000  
D&C Construtora Ltda Me  
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021  
@deconstrutora  
[deconstrucoesltida@gmail.com](mailto:deconstrucoesltida@gmail.com)

Acesse o nosso  
site através  
do QR CODE

