

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA ELIZETH SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA


Bancos
ORSE - 11/2025 - Sergipe
B.D.I.
23,54%

Encargos
Não
Desonerado:

PERÍODO: 19/05/2026 A 19/06/2026


BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Orçamento Sintético						QUANTIDADE			VALOR		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
01	REFORMA DA QUADRA NA ESCOLA MARIA ELIZETH SANTOS				542.852,16				R\$ 451.376,31	R\$ 64.209,91	R\$ 515.586,22
01.01	REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA				542.852,16				R\$ 451.376,31	R\$ 64.209,91	R\$ 515.586,22
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				43.008,00				35.755,96	5.086,68	40.842,64
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	161,26	19.351,20	99,76	14,19	113,95	16.087,30	2.288,28	18.375,58
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	98,57	23.656,80	199,54	28,39	227,93	19.668,66	2.798,40	22.467,06
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.464,64				R\$ 7.464,64	R\$ 0,00	R\$ 7.464,64
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10	468,64	4.686,40	10,00		10,00	4.686,40	-	4.686,40
01.01.002.002	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	24	115,76	2.778,24	24,00		24,00	2.778,24	-	2.778,24
01.01.003	QUADRA				161.147,48				R\$ 158.974,57	R\$ 0,00	R\$ 158.974,57
01.01.003.001	COBERTURA				160.596,39				R\$ 158.423,48	R\$ 0,00	R\$ 158.423,48
01.01.003.001.	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	649,45	5,68	3.688,88	649,45		649,45	3.688,88	-	3.688,88
01.01.003.001.	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	714,39	184,04	131.476,34	714,39		714,39	131.476,34	-	131.476,34
01.01.003.001.	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	62	171,25	10.617,50	62,00		62,00	10.617,50	-	10.617,50
01.01.003.001.	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	36	52,00	1.872,00	36,00		36,00	1.872,00	-	1.872,00
01.01.003.001.	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/escoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	137,6	62,47	8.595,87	137,60		137,60	8.595,87	-	8.595,87
01.01.003.001.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	12	362,15	4.345,80	6,00		6,00	2.172,90	-	2.172,90
01.01.003.002	PILARES				499,78				R\$ 499,78	R\$ 0,00	R\$ 499,78
01.01.003.002.	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	m	2,8	125,60	351,68	2,80		2,80	351,68	-	351,68
01.01.003.002.	Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1	m²	0,84	70,00	58,80	0,84		0,84	58,80	-	58,80


Andre Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SF

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal




GLOBAL
CONSTRUÇÕES


01.01.003.002.	Estucamento com argamassa polimérica	m²	0,84	106,31	89,30	0,84	0,84	89,30	-	89,30
01.01.003.003	SAPATAS				51,31			R\$ 51,31	R\$ 0,00	R\$ 51,31
01.01.003.003.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,12	45,81	51,31	1,12	1,12	51,31	-	51,31
01.01.004	MURETA / ALAMBRADO				135.707,60			R\$ 124.730,74	R\$ 10.792,26	R\$ 135.523,00
01.01.004.001	Demolição de reboco	m2	80	11,42	913,60	80,00	80,00	913,60	-	913,60
01.01.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	80	45,81	3.664,80	80,00	80,00	3.664,80	-	3.664,80
01.01.004.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	80	58,92	4.713,60	-	80,00	80,00	-	4.713,60
01.01.004.004	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	287	68,71	19.719,77	287,00	287,00	19.719,77	-	19.719,77
01.01.004.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,24	68,71	153,91	-	-	-	-	-
01.01.004.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	2,24	13,70	30,69	-	-	-	-	-
01.01.004.007	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	241,8	380,45	91.992,81	241,80	241,80	91.992,81	-	91.992,81
01.01.004.008	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	4,2	974,58	4.093,24	4,20	4,20	4.093,24	-	4.093,24
01.01.004.009	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	116,56	10,30	1.200,57	116,56	116,56	1.200,57	-	1.200,57
01.01.004.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	116,56	26,99	3.145,95	116,56	116,56	3.145,95	-	3.145,95
01.01.004.011	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	246	24,71	6.078,66	-	246,00	246,00	-	6.078,66
01.01.005	PISO QUADRA				4.722,81			R\$ 4.722,81	R\$ 0,00	R\$ 4.722,81
01.01.005.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	16	25,89	414,24	16,00	16,00	414,24	-	414,24
01.01.005.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	16	52,73	843,68	16,00	16,00	843,68	-	843,68
01.01.005.003	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	276,97	12,51	3.464,89	276,97	276,97	3.464,89	-	3.464,89
01.01.006	APARELHOS ESPORTIVOS				15.254,76			R\$ 14.548,09	R\$ 706,67	R\$ 15.254,76


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Jossivan Costa Leão
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-5

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal




GLOBAL
CONSTRUÇÕES

01.01.006.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4.603,10	4.603,10	1,00		1,00	4.603,10	-	4.603,10
01.01.006.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2	4.314,21	8.628,42	2,00		2,00	8.628,42	-	8.628,42
01.01.006.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1	1.316,57	1.316,57	1,00		1,00	1.316,57	-	1.316,57
01.01.006.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	323,45	323,45	-	1,00	1,00	-	323,45	323,45
01.01.006.005	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1	383,22	383,22	-	1,00	1,00	-	383,22	383,22
01.01.007	ÁREA EXTERNA				88.179,81				R\$ 62.437,00	R\$ 3.984,00	R\$ 66.421,00
01.01.007.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	919,21	33,68	30.958,99	650,86		650,86	21.920,96	-	21.920,96
01.01.007.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	919,21	62,25	57.220,82	650,86	64,00	714,86	40.516,04	3.984,00	44.500,04
01.01.008	CANTEIROS				9.875,52				R\$ 6.463,67	R\$ 2.427,50	R\$ 8.891,18
01.01.008.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,09	38,87	120,11	3,09		3,09	120,11	-	120,11
01.01.008.002	Demolição de reboco	m2	41,2	11,42	470,50	41,20		41,20	470,50	-	470,50
01.01.008.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	20,6	86,66	1.785,20	20,60		20,60	1.785,20	-	1.785,20
01.01.008.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	82,4	8,61	709,46	82,40		82,40	709,46	-	709,46
01.01.008.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	82,4	41,00	3.378,40	82,40		82,40	3.378,40	-	3.378,40
01.01.008.006	Paintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	41,2	58,92	2.427,50	-	41,20	41,20	-	2.427,50	2.427,50
01.01.008.007	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	4	90,09	360,36	-		-	-	-	-
01.01.008.008	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	8	47,62	380,96	-		-	-	-	-
01.01.008.009	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena	un	1	86,48	86,48	-		-	-	-	-
01.01.008.010	Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	5	31,31	156,55	-		-	-	-	-
01.01.009	BANCOS DE CONCRETO				2.517,06				R\$ 2.517,06	R\$ 0,00	R\$ 2.517,06


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana



Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-27229401-6

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal




**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

01.01.009.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	42,72	58,92	2.517,06	42,72	42,72	2.517,06	-	2.517,06
01.01.010	MURO				45.361,44			R\$ 7.378,66	R\$ 37.982,78	R\$ 45.361,44
01.01.010.001	Demolição de reboco	m2	128,93	11,42	1.472,38	128,93	128,93	1.472,38	-	1.472,38
01.01.010.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	128,93	45,81	5.906,28	128,93	128,93	5.906,28	-	5.906,28
01.01.010.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	644,65	58,92	37.982,78	-	644,65	644,65	-	37.982,78
01.01.011	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				26.383,03			R\$ 26.383,03	R\$ 0,00	R\$ 26.383,03
01.01.011.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	181,38	181,38	1,00	1,00	181,38	-	181,38
01.01.011.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1	74,47	74,47	1,00	1,00	74,47	-	74,47
01.01.011.003	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1	71,05	71,05	1,00	1,00	71,05	-	71,05
01.01.011.004	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1	23,57	23,57	1,00	1,00	23,57	-	23,57
01.01.011.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1	168,24	168,24	1,00	1,00	168,24	-	168,24
01.01.011.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	36	22,34	804,24	36,00	36,00	804,24	-	804,24
01.01.011.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4	11,42	45,68	4,00	4,00	45,68	-	45,68
01.01.011.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	16	4,45	71,20	16,00	16,00	71,20	-	71,20
01.01.011.009	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	120	14,95	1.794,00	120,00	120,00	1.794,00	-	1.794,00
01.01.011.010	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	180	12,08	2.174,40	180,00	180,00	2.174,40	-	2.174,40
01.01.011.011	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLD-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	un	20	743,36	14.867,20	20,00	20,00	14.867,20	-	14.867,20
01.01.011.012	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20	305,38	6.107,60	20,00	20,00	6.107,60	-	6.107,60
01.01.012	SERVIÇOS FINAIS				3.230,01			R\$ 0,00	R\$ 3.230,01	R\$ 3.230,01


André Aguiar Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana



Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal



GLOBAL
CONSTRUÇÕES

01.01.012.001	Limpeza geral	m2	993,85	3,25	3.230,01	-	993,85	993,85	-	3.230,01	3.230,01
VALOR TOTAL					542.852,16	Total Geral		R\$ 451.376,31	R\$ 64.209,91	R\$ 515.586,22	


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:045
31407504

Assinado de
forma digital por
CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504


André Agosti Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal



Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Empreendimento: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZETH SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA


CONTRATO Nº 048/2026

PERÍODO: 19/05/2026 À 19/06/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 04				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA			
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE			
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	14,19	14,19 h
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	28,39	28,39 h
01.01.004	MURETA / ALAMBRADO			
01.01.004.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	80,00	lado norte (11,57+13,57=25,00m) + lado leste (14,00m) +lado oeste (14,00m) + lado sul (27,00m)=80,00m x h(0,50m)= 40,00m2 x 2 lados= 80,00m2
01.01.004.011	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m2	246,00	60,45 x 4,00 + 2,80 x 1,55 = 246,00 m2
01.01.006	APARELHOS ESPORTIVOS			
01.01.006.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	1,00
01.01.006.005	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	1,00
01.01.007	ÁREA EXTERNA			
01.01.007.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	64,00	16,00 x 4,00 = 64,00m2
01.01.008	CANTEIROS			
01.01.008.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	41,20	41,2 x 1,00 = 41,20 m2
01.01.010	MURO			
01.01.010.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	644,65	2,50 x 257,86 = 644,65 m2
01.01.012	SERVIÇOS FINAIS			
01.01.012.001	Limpeza geral	m2	993,85	20,00 x 49,6925 = 993,85m2


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

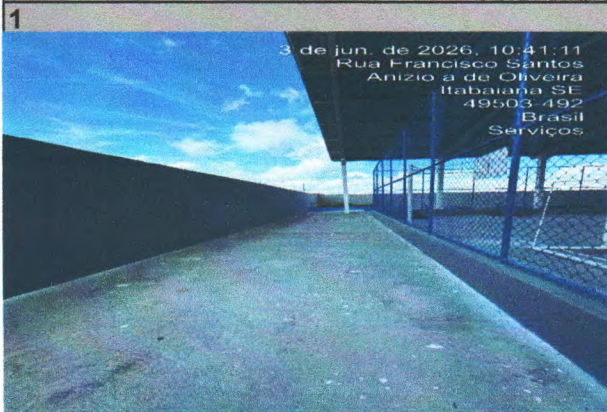

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:045
31407504
Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

 GLOBAL CONSTRUÇÕES		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana - SE	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZETH SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA
CONTRATO: 048/2026	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/05/2026 A 19/06/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 19/06/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



DESCRIÇÃO

01.01.004.003 PINTURA PARA EXTERIORES MURETA



DESCRIÇÃO

01.01.006.004 REDE PARA VOLEI

ANDAMENTO GERAL DA OBRA



DESCRIÇÃO

01.01.008.006 PINTURA PARA EXTERIORES CANTEIROS



DESCRIÇÃO

01.01.010.003 PINTURA PARA EXTERIORES MURO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA




DESCRIÇÃO


01.01.006.005 REDE PARA TRAVE FUTSAL



DESCRIÇÃO

01.01.010.003 PINTURA PARA EXTERIORES MURO /
01.01.007.002 PISO EM CONCRETO SIMPLES


Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Andre Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

