






OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 060/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022					DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>1</b>	<b>CIVIL</b>													
<b>01.01</b>	<b>REFORMA</b>													
<b>01.02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	4,00	4,00		4,00	344,29	1.377,16	1.377,16	0,00	1.377,16	0,00	100,00	
01.02.002	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	80,00	80,00		80,00	206,00	16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	100,00	
01.02.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	10,00		10,00	239,23	2.392,30	2.392,30	0,00	2.392,30	0,00	100,00	
01.02.004	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	210,08	210,08		210,08	6,14	1.289,89	1.289,89	0,00	1.289,89	0,00	100,00	
01.02.005	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação).	m2	210,08	210,08		210,08	11,00	2.310,88	2.310,88	0,00	2.310,88	0,00	100,00	
01.02.006	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.012,32	210,08		210,08	3,32	3.360,90	697,47	0,00	697,47	2.663,43	20,75	
<b>01.03</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>													
01.03.001	Demolição de reboco	m2	123,08	0,00		0,00	6,62	814,79	0,00	0,00	0,00	814,79	0,00	
01.03.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	5,88	5,88		5,88	30,71	180,57	180,57	0,00	180,57	0,00	100,00	
01.03.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	2,94	2,94		2,94	16,37	48,13	48,13	0,00	48,13	0,00	100,00	
01.03.004	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	26,70	26,70		26,70	20,47	546,55	546,55	0,00	546,55	0,00	100,00	
01.03.005	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	15,16	15,16		15,16	1,38	20,92	20,92	0,00	20,92	0,00	100,00	
01.03.006	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	2,40	2,40		2,40	26,64	63,94	63,94	0,00	63,94	0,00	100,00	
01.03.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	8,70	8,70		8,70	4,47	38,89	38,89	0,00	38,89	0,00	100,00	
01.03.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,92	20,92		20,92	18,38	384,51	384,51	0,00	384,51	0,00	100,00	
01.03.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	156,90	156,90		156,90	1,60	251,04	251,04	0,00	251,04	0,00	100,00	
<b>01.04</b>	<b>COBERTURA</b>													
01.04.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum. Itabaiana ou similar, com reposição de 10%	m2	436,82	436,82		436,82	45,71	19.967,04	19.967,04	0,00	19.967,04	0,00	100,00	
<b>01.05</b>	<b>FORRO</b>													
01.05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca	m2	8,70	-		0,00	63,51	552,54	0,00	0,00	0,00	552,54	0,00	
<b>01.06</b>	<b>REVESTIMENTO</b>													
01.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	123,08	-		0,00	7,59	934,18	0,00	0,00	0,00	934,18	0,00	
01.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	28,17	-		0,00	21,87	616,08	0,00	0,00	0,00	616,08	0,00	


  
 Andrade e Oliveira Construções Eireli  
 Jqsc Almeida Andrade  
 Sócio Administrador  
 RT Engº Civil CREA/SE  
 RN 2714133398


  
 Thaisa Lima Santos  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 060/2022					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022					DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	94,92	-		0,00	25,38	2.409,07	0,00	0,00	0,00	2.409,07	0,00
<b>01.07</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.497,36</b>	<b>1.497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
01.07.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	55,64	55,64		55,64	25,38	1.412,14	1.412,14	0,00	1.412,14	0,00	100,00
01.07.002	Passo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	2,40	2,40		2,40	35,51	85,22	85,22	0,00	85,22	0,00	100,00
<b>01.08</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>3.931,92</b>	-	-	-	<b>3.931,92</b>	<b>0,00</b>
01.08.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	39,37	-		0,00	14,08	554,33	0,00	0,00	0,00	554,33	0,00
01.08.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	69,52	-		0,00	8,96	622,90	0,00	0,00	0,00	622,90	0,00
01.08.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	69,52	-		0,00	17,27	1.200,61	0,00	0,00	0,00	1.200,61	0,00
01.09.004	Revisão de esquadria de madeira	m2	15,72	-		0,00	98,86	1.554,08	0,00	0,00	0,00	1.554,08	0,00
<b>01.09</b>	<b>PINTURA</b>							<b>22.267,57</b>	-	-	-	<b>22.267,57</b>	<b>0,00</b>
01.09.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador,	m2	273,26	-		0,00	26,02	7.110,23	0,00	0,00	0,00	7.110,23	0,00
01.09.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02	m2	513,46	-		0,00	29,52	15.157,34	0,00	0,00	0,00	15.157,34	0,00
<b>01.10</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>							<b>803,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,11</b>	<b>0,00</b>
01.10.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	-		0,00	27,64	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48	0,00
01.10.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	7,00	-		0,00	87,09	609,63	0,00	0,00	0,00	609,63	0,00
<b>01.11</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>							<b>166.992,51</b>	<b>125.161,93</b>	<b>22.521,03</b>	<b>147.682,96</b>	<b>19.309,55</b>	<b>88,44</b>
<b>01.11.001</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO</b>							<b>49.971,28</b>	<b>49.971,28</b>	-	<b>49.971,28</b>	-	<b>100,00</b>
<b>01.11.001.001</b>	<b>EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAMES E "PESCOÇO DOS PILARES"</b>							<b>49.971,28</b>	<b>49.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
01.11.001.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,40	20,40		20,40	55,18	1.125,67	1.125,67	0,00	1.125,67	0,00	100,00
01.11.001.001.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	33,66	33,66		33,66	357,74	12.041,53	12.041,53	0,00	12.041,53	0,00	100,00
01.11.001.001.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 05/2021	m3	0,45	0,45		0,45	368,16	165,67	165,67	0,00	165,67	0,00	100,00
01.11.001.001.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - SAPATAS	m3	6,13	6,13		6,13	2.195,04	13.455,60	13.455,60	0,00	13.455,60	0,00	100,00


  
 José Almeida Andrade  
 Sócio Administrador  
 RT Eng.º Civil CREA/SE  
 RN 2714133398

  
 Thaise Lima Santos  
 Eng.º Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 060/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M. Nº. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022					DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.11.001.001.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO INFERIOR	m3	3,24	3,24		3,24	2.195,04	7.111,93	7.111,93	0,00	7.111,93	0,00	100,00	
01.11.001.001.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	141,27	141,27		141,27	113,76	16.070,88	16.070,88	0,00	16.070,88	0,00	100,00	
<b>01.11.002</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>							<b>9.160,64</b>	<b>9.160,64</b>	<b>-</b>	<b>9.160,64</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
01.11.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	241,26	241,26		241,26	37,97	9.160,64	9.160,64	0,00	9.160,64	0,00	100,00	
<b>01.11.003</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>12.599,53</b>	<b>9.943,54</b>	<b>2.655,99</b>	<b>12.599,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
01.11.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	3,13	3,13		3,13	2.195,04	6.870,48	6.870,48	0,00	6.870,48	0,00	100,00	
01.11.003.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - PILARES	m3	2,61	1,40	1,21	2,61	2.195,04	5.729,05	3.073,06	2.655,99	5.729,05	0,00	100,00	
<b>01.11.004</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>							<b>3.887,27</b>	<b>3.887,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
01.11.004.001	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	5,80	5,80		5,80	33,95	196,91	196,91	0,00	196,91	0,00	100,00	
01.11.004.002	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	32,40	32,40		32,40	59,37	1.923,59	1.923,59	0,00	1.923,59	0,00	100,00	
01.11.004.002.001	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	32,40	32,40		32,40	54,53	1.766,77	1.766,77	0,00	1.766,77	0,00	100,00	
<b>01.11.005</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>33.605,68</b>	<b>22.518,21</b>	<b>11.087,47</b>	<b>33.605,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
01.11.005.001	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af 07/2019	un	2,00	2,00		2,00	2.083,42	4.166,84	4.166,84	0,00	4.166,84	0,00	100,00	
01.11.005.002	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	178,80	178,80		178,80	56,01	10.014,59	10.014,59	0,00	10.014,59	0,00	100,00	
01.11.005.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	178,80	178,80		178,80	39,22	7.012,54	7.012,54	0,00	7.012,54	0,00	100,00	
01.11.005.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	54,89	-	54,89	54,89	7,21	395,76	0,00	395,76	395,76	0,00	100,00	
01.11.005.005	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	17,00	-	17,00	17,00	21,90	372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	100,00	
01.11.005.006	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	17,00	-	17,00	17,00	27,58	468,86	0,00	468,86	468,86	0,00	100,00	


  
 Andrade e Oliveira Construções Eireli  
 José Almeida Andrade  
 Sócio Administrador  
 RT Engº Civil CREA/SE  
 RN 2714133396


  
 Thaisa Lima Santos  
 Engº Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 060/2022					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022					DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.11.005.007	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	8,57	8,57		8,57	154,52	1.324,24	1.324,24	0,00	1.324,24	0,00	100,00
01.11.005.008	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af. 05/2017 p	m2	104,94	-	104,94	104,94	79,63	8.356,37	0,00	8.356,37	8.356,37	0,00	100,00
01.11.005.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	9,00	-	9,00	9,00	166,02	1.494,18	0,00	1.494,18	1.494,18	0,00	100,00
<b>01.11.006</b>	<b>ESQUADRIA</b>							<b>4.971,86</b>	<b>1.426,56</b>	<b>1.418,12</b>	<b>2.844,68</b>	<b>2.127,18</b>	<b>57,22</b>
01.11.006.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00	-	1,00	1,00	709,06	2.127,18	0,00	709,06	709,06	1.418,12	33,33
01.11.006.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	-	1,00	1,00	709,06	1.418,12	0,00	709,06	709,06	709,06	50,00
01.11.006.003	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	13,75	13,75		13,75	103,75	1.426,56	1.426,56	0,00	1.426,56	0,00	100,00
<b>01.11.007</b>	<b>REVESTIMENTO</b>							<b>22.772,39</b>	<b>21.444,49</b>	<b>1.327,90</b>	<b>22.772,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
01.11.007.001	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	512,33	512,33		512,33	7,59	3.888,58	3.888,58	0,00	3.888,58	0,00	100,00
01.11.007.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	271,07	271,07		271,07	22,58	6.120,76	6.120,76	0,00	6.120,76	0,00	100,00
01.11.007.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	241,26	241,26		241,26	25,38	6.123,18	6.123,18	0,00	6.123,18	0,00	100,00
01.11.007.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	192,46	153,97	38,49	192,46	34,50	6.639,87	5.311,97	1.327,90	6.639,87	0,00	100,00
<b>01.11.008</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>10.920,62</b>	<b>5.172,34</b>	<b>5.748,28</b>	<b>10.920,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
01.11.008.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,20	-	2,20	2,20	68,48	150,66	0,00	150,66	150,66	0,00	100,00
01.11.008.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	117,42	117,42		117,42	18,31	2.149,96	2.149,96	0,00	2.149,96	0,00	100,00
01.11.008.003	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	117,42	-	117,42	117,42	36,16	4.245,91	0,00	4.245,91	4.245,91	0,00	100,00
01.11.008.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	156,60	156,60		156,60	19,30	3.022,38	3.022,38	0,00	3.022,38	0,00	100,00
01.11.008.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	39,18	-	39,18	39,18	34,50	1.351,71	0,00	1.351,71	1.351,71	0,00	100,00
<b>01.11.009</b>	<b>PASSEIO</b>							<b>1.637,60</b>	<b>1.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
01.11.009.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	1,82	1,82		1,82	357,74	651,09	651,09	0,00	651,09	0,00	100,00

Andrade e Oliveira Construções Eireli  
 José Almeida Andrade  
 Sócio Administrador  
 RT Eng.º CIVIL CREA/SE  
 RN 2714131295



Thaís Lígia Santos  
 Eng.º Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 060/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022					DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.11.009.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	32,50	32,50		32,50	25,38	824,85	824,85	0,00	824,85	0,00	100,00	
01.11.009.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	3,65	3,65		3,65	44,29	161,66	161,66	0,00	161,66	0,00	100,00	
<b>01.11.010</b>	<b>PINTURAS</b>							<b>9.675,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,74</b>	<b>0,00</b>	
01.11.010.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	70,68	-		0,00	26,02	1.839,09	0,00	0,00	0,00	1.839,09	0,00	
01.11.010.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	256,24	-		0,00	29,52	7.564,20	0,00	0,00	0,00	7.564,20	0,00	
01.11.010.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	19,35	-		0,00	14,08	272,45	0,00	0,00	0,00	272,45	0,00	
<b>01.11.011</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							<b>895,55</b>	<b>0,00</b>	<b>283,27</b>	<b>283,27</b>	<b>612,28</b>	<b>31,63</b>	
01.11.011.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00	-	1,00	1,00	120,47	120,47	0,00	120,47	120,47	0,00	100,00	
01.11.011.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	-	2,00	2,00	81,40	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00	100,00	
01.11.011.003	Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01	un	1,00	-		0,00	598,60	598,60	0,00	0,00	0,00	598,60	0,00	
01.11.011.004	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	1,00	-		0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	
<b>01.11.012</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>6.894,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,35</b>	<b>0,00</b>	
01.11.012.001	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m2	11,27	-		0,00	281,07	3.167,66	0,00	0,00	0,00	3.167,66	0,00	
01.11.012.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-		0,00	1.592,02	1.592,02	0,00	0,00	0,00	1.592,02	0,00	
01.11.012.003	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02	m	10,54	-		0,00	202,53	2.134,67	0,00	0,00	0,00	2.134,67	0,00	
<b>2</b>	<b>ELÉTRICO</b>							<b>40.078,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.564,83</b>	<b>18.564,83</b>	<b>21.514,03</b>	<b>46,32</b>	
<b>02.01</b>	<b>PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>							<b>4.429,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>2.434,35</b>	<b>45,04</b>	
02.01.001	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	-		0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	
02.01.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	-		0,00	89,77	89,77	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00	
02.01.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-		0,00	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 060/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022					DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
02.01.004	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	-		0,00	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	
02.01.005	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		0,00	81,57	81,57	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	
02.01.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00	-		0,00	25,93	51,86	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	
02.01.007	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	-		0,00	91,56	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	0,00	
02.01.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	9,00	-		0,00	11,16	100,44	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	
02.01.009	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	-		0,00	54,10	216,40	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	
02.01.010	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	250,00	-	190,00	190,00	10,50	2.625,00	0,00	1.995,00	1.995,00	630,00	76,00	
02.01.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	10,00	-		0,00	7,22	72,20	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	
02.01.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	30,00	-		0,00	20,85	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50	0,00	
02.02	<b>LUMINÁRIAS, TOMADAS DE USO E ESPECÍFICO, INTERRUPTORES, ELETRODUTOS, LUVAS E CABOS</b>							<b>35.649,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.569,83</b>	<b>16.569,83</b>	<b>19.079,68</b>	<b>46,48</b>	
02.02.001	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	28,00	-		0,00	124,12	3.475,36	0,00	0,00	0,00	3.475,36	0,00	
02.02.002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	15,00	-		0,00	109,55	1.643,25	0,00	0,00	0,00	1.643,25	0,00	
02.02.003	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	5,00	-		0,00	107,66	538,30	0,00	0,00	0,00	538,30	0,00	
02.02.004	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	22,00	-		0,00	18,87	415,14	0,00	0,00	0,00	415,14	0,00	
02.02.005	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	44,00	-		0,00	20,42	898,48	0,00	0,00	0,00	898,48	0,00	
02.02.006	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	4,00	-		0,00	24,09	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	
02.02.007	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref.N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	1,00	-		0,00	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00	
02.02.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	70,00	-		0,00	27,56	1.929,20	0,00	0,00	0,00	1.929,20	0,00	
02.02.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	24,00	-		0,00	27,56	661,44	0,00	0,00	0,00	661,44	0,00	
02.02.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	150,00	-		0,00	20,85	3.127,50	0,00	0,00	0,00	3.127,50	0,00	
02.02.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	50,00	-		0,00	7,22	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	
02.02.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	300,00	-	70,00	70,00	15,06	4.518,00	0,00	1.054,20	1.054,20	3.463,80	23,33	
02.02.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	100,00	-	40,00	40,00	5,45	545,00	0,00	218,00	218,00	327,00	40,00	
02.02.014	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	300,00	-	180,00	180,00	12,62	3.786,00	0,00	2.271,60	2.271,60	1.514,40	60,00	

Andrade e Oliveira Construções Eireli  
 José Almeida Andrade  
 Sócio Administrador  
 RT Eng.º CIVIL CREA/SE

Thaísia Lima Santos  
 Eng.º Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 060/2022						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.º. 04/2023					ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022					DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
02.02.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	100,00	-	60,00	60,00	3,41	341,00	0,00	204,60	204,60	136,40	60,00	
02.02.016	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	300,00	-	260,00	260,00	9,92	2.976,00	0,00	2.579,20	2.579,20	396,80	86,67	
02.02.017	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	100,00	-	73,00	73,00	1,51	151,00	0,00	110,23	110,23	40,77	73,00	
02.02.018	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	600,00	-	600,00	600,00	7,62	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00	100,00	
02.02.019	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	800,00	-	800,00	800,00	4,26	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	100,00	
02.02.020	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	800,00	-	800,00	800,00	2,69	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	100,00	
<b>3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>19.967,46</b>	<b>11.906,42</b>	<b>2.833,27</b>	<b>14.739,69</b>	<b>5.227,77</b>	<b>73,82</b>	
<b>03.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>19.967,43</b>	<b>11.906,42</b>	<b>2.833,27</b>	<b>14.739,69</b>	<b>5.227,77</b>	<b>73,82</b>	
03.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	105,00	62,61	14,90	77,51	112,75	11.838,75	7.059,28	1.679,98	8.739,26	3.099,49	73,82	
03.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	181,00	107,93	25,68	133,61	44,91	8.128,71	4.847,14	1.153,29	6.000,43	2.128,28	73,82	
<b>Total geral</b>								<b>309.578,17</b>	<b>184.615,00</b>	<b>43.919,13</b>	<b>228.534,13</b>	<b>81.044,04</b>	<b>73,82</b>	
ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							
 José Almeida Andrade Sócio Administrador RT Eng.º Civil CREA/SE RN 2714133346														

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Eng.º Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 060/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 04/2023	ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022
CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA				PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022	DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO 04	
<b>1</b>	<b>CIVIL</b>				
<b>01.01</b>	<b>REFORMA</b>				
<b>01.11</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>				
<b>01.11.003</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
01.11.003.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - PILARES	m3	1,21	> (2,90m x 0,12m x 0,30m) x 25 und.= 2,61m³ - 1,40m³ (Medição Anterior) = 1,21m³	
<b>01.11.005</b>	<b>COBERTURA</b>				
01.11.005.004	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	54,89	> 54,89 m	
01.11.005.005	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	17,00	> 17,00 m	
01.11.005.006	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	17,00	> 17,00 m	
01.11.005.008	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m2	104,94	> Salas (37,52m² + 36,58m²) + Cozinha 15,19m² + Dispensa 15,66m²= 104,94m²	
01.11.005.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	9,00	> 9,00 m	
<b>01.11.006</b>	<b>ESQUADRIA</b>				
01.11.006.001	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	> 1,00 un	
01.11.006.002	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	> 1,00 un	
<b>01.11.007</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				
01.11.007.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	38,49	Salas {(24,50m + 24,20m) x 1,50m} - (0,80m x 1,50m x 2 und.)} + Coz. [(17,30m x 2,80m) - ((0,80m x 2,10m) + (0,70m x 2,10m))] + Disp. [(16,60m x 2,80m) - (0,70m x 2,10m)] + A.S. [(11,85m x 2,80m) - (0,80m x 2,10m)]= 192,46m² - 153,97 m² (Medição Anterior) = 38,49m²	
<b>01.11.008</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01.11.008.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,20	> (0,80 + 0,70 x 2) = 2,20m	
01.11.008.003	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	117,42	> Piso da salas ampliadas: 117,42m²	
01.11.008.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	39,18	> Coz. 15,19m² + Dis. 15,66m² + A.S. 8,33m²= 39,18m²	
<b>01.11.011</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				
01.11.011.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø	un	1,00	> 1,00 un	
01.11.011.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm	un	2,00	> 2,00 un	
<b>2</b>	<b>ELÉTRICO</b>				
<b>02.01</b>	<b>PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>				
02.01.010	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	190,00	> 190,00 m	
<b>02.02</b>	<b>LUMINÁRIAS, TOMADAS DE USO E ESPECÍFICO</b>				
02.02.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	70,00	> 70,00 m	
02.02.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1")	un	40,00	> 40,00 un	
02.02.014	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	180,00	> 180,00 m	
02.02.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	60,00	> 60,00 un	
02.02.016	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	260,00	> 260,00 m	
02.02.017	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	73,00	> 73,00 un	



Andrade & Oliveira Construções Eireli  
 Jose Almeida Andrade  
 Sócio Administrador  
 RT Eng.º CIVIL CREA/SE  
 RN 2714133398

Thaísia Lima Santos  
 Eng.ª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 060/2022	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 04/2023	ORDEM DE SERVIÇOS = 28/04/2022	
CONTRATADA: ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA				PERÍODO: 01/11/2022 A 31/12/2022	DATA MEDIÇÃO: 11/01/2023	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO 04		
02.02.018	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	600,00	> 600,00 m		
02.02.019	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	800,00	> 800,00 m		
02.02.020	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	800,00	> 800,00 m		
<b>3</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
<b>03.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
03.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	14,90	> (225.700,87 - 11.906,42) / (309.578,17 - 19.967,46) = 0,7382 x 105h = 77,51h - 62,61h (Medição Anterior) = 14,90h		
03.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	25,68	> (225.700,87 - 11.906,42) / (309.578,17 - 19.967,46) = 0,7382 x 181h = 133,61h - 107,93h (Medição Anterior) = 25,68h		
ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___		
 José Almeida Andrade Sócio Administrador RT Eng.º Civil CREA/SE RN 2714133398						

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Eng.º Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO: 060/2022

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI

ORDEM DE SERVIÇOS  
INICIO - 28/04/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA




PLACA DA OBRA



REVISÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA;  
EMASSAMENTO DE BEIRAL E CUMEEIRA



REVISÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA;  
EMASSAMENTO DE BEIRAL

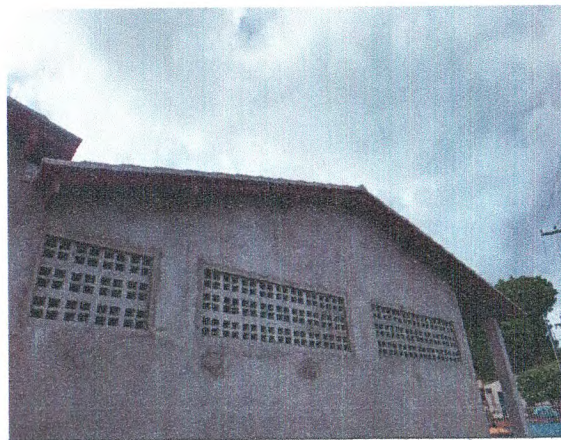

REVISÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA;  
EMASSAMENTO DE BEIRAL





REVISÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA;  
EMASSAMENTO DE BEIRAL E CUMEEIRA



REVISÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA;  
EMASSAMENTO DE BEIRAL E CUMEEIRA

ELABORADO POR:

  
Andrade e Oliveira Construções Eireli  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador  
RT Eng.º CIVIL CREA/SE

  
Thaisa Lima Santos  
Eng.º CIVIL - CREA 271739199-1  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1 de 3

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO: 060/2022

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI

ORDEM DE SERVIÇOS  
INICIO - 28/04/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

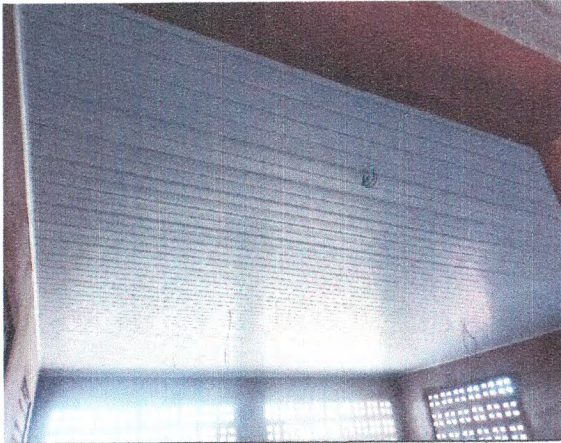

AMPLIAÇÃO - FORRO DE PVC; INSTALAÇÃO ELÉTRICA;  
COMBOGÓ DE CIMENTO



REFORMA - FORRO DE PVC; INSTALAÇÃO ELÉTRICA



AMPLIAÇÃO - FORRO DE PVC; REVESTIMENTO  
CERÂMICO PAREDE; INSTALAÇÃO ELÉTRICA;



AMPLIAÇÃO - FORRO DE PVC; REVESTIMENTO  
CERÂMICO PAREDE; INSTALAÇÃO ELÉTRICA;  
COMBOGÓ DE CIMENTO





AMPLIAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE;  
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA



AMPLIAÇÃO - PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

ELABORADO POR:

  
Andrade e Oliveira Construções Eireli  
José Almeida Andrade  
Socio Administrador  
RT Eng.º CIVIL CREA/SE  
RN 273.112.325

  
Thaisa Lima Santos  
Eng.º Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2 de 3

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

CONTRATO: 060/2022

ORDEM DE SERVIÇOS  
INICIO - 28/04/2022



AMPLIAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE;  
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA; COMBOGÓ DE CIMENTO



CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO



CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO



COZINHA - REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE E  
PISO; PONTOS DE ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO





DISPENSA - REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE E  
PISO; CAIXÃO EM MADEIRA PARA PORTA; PONTO DE  
ENERGIA; COMBOGÓ DE CIMENTO



AMPLIAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE;  
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA; COMBOGÓ DE CIMENTO

ELABORADO POR:

  
Andrade e Oliveira Construções Eireli  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador

  
Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 3 de 3
